


04065 4/7

Feierabendheim mit Pflegestation  
Bettenhaus 176 Plätze

Standort: Halle, Silberhöhe 3.

Projekt-Nr.: 521- 2247-03



Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                                    | Seite  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ✓ 1) Zeichnungsverzeichnis                                                                                                                         | 1 - 6  |
| ✓ 2) Erläuterungsbericht                                                                                                                           | 1 - 3  |
| ✓ 3) Baubeschreibung Entwurf                                                                                                                       | 1 - 8  |
| ✓ 4) Anlage 1 zur Baubeschreibung Ausbau:<br>Fußbodenaufbau                                                                                        | 1 - 4  |
| ✓ 5) Anlage 2 zur Baubeschreibung Ausbau:<br>Dachaufbau                                                                                            | 1 - 2  |
| ✓ 6) Außenhautgestaltung                                                                                                                           | 1      |
| ✓ 7) Schutzgüternachweis                                                                                                                           | 1      |
| ✓ 8) Erläuterungsbericht GABS                                                                                                                      | 1 - 8  |
| ✓ 9) Kapazitätsnachweis                                                                                                                            | 1 - 4  |
| ✓ 10) Schilder- und Informationsprojekt                                                                                                            | 1 - 6  |
| ✓ 11) Sicherheitsschlösser                                                                                                                         | 1 - 3  |
| 12) Ausbauelementeliste Bl. 22.501 bis 22.517                                                                                                      |        |
| ✓ 13) Zeichnungen Ausbau (Grundrisse, Möblierungspläne,<br>Schnitte, Details, Fluchtpläne, Schilderprojekt)<br>lt. Zeichnungsverzeichnis Seite 1-4 |        |
| 14) Baubeschreibung Rohbau                                                                                                                         | 1 - 14 |
| ✓ 15) Zeichnungen Montage, Stahlbau<br>lt. Zeichnungsverzeichnis Seite 5 + 6                                                                       |        |
| 16) Rohbauelementeliste Blatt 23.301 bis 23.318 - 23.320                                                                                           |        |
| ✓ 17) Kleineisenliste Blatt 23.350                                                                                                                 |        |
| ✓ 18) Statische Berechnung (wird <u>pro Standort 2-fach</u> geliefert)                                                                             |        |
| × 19) Projekt Heizungsanlage 110/70°C                                                                                                              |        |
| × 20) " Lüftungsanlage                                                                                                                             |        |
| × 21) Sanitäre Installation                                                                                                                        |        |
| × 22) Elektrotechnische Anlage                                                                                                                     |        |
| × 23) Blitzschutzanlage                                                                                                                            |        |
| × 24) Gemeinschaftsantennenanlage                                                                                                                  |        |
| × 25) Leistungsverzeichnis                                                                                                                         |        |
| 26) Mengenermittlungen (werden <u>je Standort 1x</u> geliefert)                                                                                    |        |

Halle, März 1981

04065 4/7

1 Zeichnungsverzeichnis

Feierabendheim mit Pflegestation  
Bettenhaus 176 Plätze

Zeichnungsverzeichnis

Ausbau

Bl. Nr.:

- ✓ 22.001 Maßplan - Plan der Ein- und Austritte
- ✓ 22.002 Untergeschoßgrundriß
- ✓ 22.004 1.Obergeschoß - Pflegestation
- 22.005 2.Obergeschoß - Pflegestation
- 22.006 3.Obergeschoß - Pflegestation
- ✓ 22.007 4.Obergeschoß - Feierabendstation
- 22.008 5.Obergeschoß - Feierabendstation
- ✓ 22.009 6.Obergeschoß - Maschinenraum
- 22.010 Medienanschlüsse Variante 1
- 22.011 Medienanschlüsse Variante 2
  
- 22.101 Dachdraufsicht
- ✓ 22.102 Dachgefälleplan
- 22.103 Schnitt A-A
- 22.104 Schnitt B-B
- ✓ 22.105 Schnitt C-C
- ✓ 22.106 Ansichten
- ? 22.107 Ansichten
- 22.108 Ansichten

Möblierungspläne

- ✓ 22.201 1-Bett-Zimmer Pflegestation
- 22.202 2-Bett-Zimmer "
- 22.203 3-Bett-Zimmer "
- 22.204 1-Bett-Zimmer Feierabendstation
- ✓ 22.205 2-Bett-Zimmer "
- 22.206 Gemeinschaftsraum
- ✓ 22.207 Stationszimmer Pflegestation
- ✓ 22.208 Teeküche Pflegestation



Bl.Nr.:

- 22.209 Teeküche Feierabendstation
- 22.210 Personalraum Feierabendstation
- 22.211 entfällt
- ✓ 22.212 Spülraum
- ✓ 22.213 Großes Bad
- ✓ 22.214 Kleines Bad
- 22.215 Reinigungsgeräte - Personal-WC
- 22.216 Med.-Betreuung
- 22.217 Behandlungsraum
- 22.218 entfällt
- 22.219 entfällt
- 22.220 Beschäftigungsraum 1
- 22.221 entfällt
- 22.222 Beschäftigungsraum 2
- 22.223 Beschäftigungsraum 3
- 22.224 Waschraum
- 22.225 Näh- und Bügelraum
- 22.226 Aufbewahrungsraum Leichen
- 22.227 Sauber-Wäsche Lager
- 22.228 entfällt
- 22.229 Personalwaschraum - Heimbewohner-WC
- 22.230 Möblierungsplan

Ausbau-Details

- 22.401 Aufzug P 053 - Schnitt und Detail
- 22.402 Aufzug P 161 - Schnitt und Detail
- 22.403 Aufzüge Grundriß - Schacht
- 22.404 Aufzüge Schachtgrube
- 22.405 Aufzüge Antriebsfundament
- 22.405a Aufzüge Antriebsfundament
- 22.406 Montageklappe Maschinenraum
- 22.407 Montageklappe Zwischengeschosß
- 22.408 Schallschutz - Maschinenraum
- 22.409 Stahltreppe - Maschinenraum
- 22.410 Gittertür - Gitterverkleidung Maschinenraum

Bl.Nr.:

- 22.447 Sohlbänke
- 22.448 Haltegriff Bad-Dusche-WC
- 22.449 Schrank für Reinigungsgeräte
- 22.450 Schutzgeländer Techn. Räume
- ✓ 22.451 Loggienentwässerung
- ✓ 22.452 Fußbodengefälle Normalgeschoß
- 22.453 Fußbodengefälle Untergeschoß
  
- 22.501 Fluchtplan Untergeschoß
- 22.502 Fluchtplan 1. bis 3.Obergeschoß
- 22.503 Fluchtplan 4. und 5.Obergeschoß
- ✓ 22.504 Schilderprojekt UG und 1.Obergeschoß
- ✓ 22.505 Schilderprojekt 2. und 3.Obergeschoß
- ✓ 22.506 Schilderprojekt 4. und 5.Obergeschoß


Bl.Nr.:

- 22.411 Dachanschlüsse Regeneinlauf
- 22.412 Installationskanal Heizung
- 22.413 Steigleiter aus Stahl
- 22.414 Dachausstieg
- 22.415 entfällt
- 22.416 Einbau Lüftungsrohr
- 22.417 Einbau Lüftungsrohr Spülraum
- 22.418 Treppengeländer Haupttreppe
- 22.419 Treppengeländer Merseburger Treppe
- 22.420 Treppengeländer letztes Obergeschoß
- 22.421 Treppenhausfenster Merseburger Treppe
- ✓ 22.422 Loggienbrüstung
- 22.423 entfällt
- 22.424 entfällt
- 22.425 Regenfallrohrverkleidung
- 22.426 Verkleidung Elektroverteilung
- 22.427 Verkleidung Luftschacht kleines u. großes Bad
- 22.428 Verkleidung Schacht Spülraum
- 22.429 Verkleidung Schacht Bettenräume
- 22.430 Sanitärschachtverkleidung Stationszimmer
- 22.431 Brausezelle
- 22.432 Paneel in GSB-Ersatzlösung
- 22.433 entfällt
- 22.434 Paneelwand Loggien
- 22.435 entfällt
- 22.436 Fenster im Flur
- ✓ 22.437 Fenster im Untergeschoß
- 22.438 Glasbausteine Maschinenraum
- 22.439 Verteilerhalle Fenster - Grundriß und Schnitt
- 22.440 Verteilerhalle Fenster - Details
- 22.441 entfällt
- 22.442 Eingangstür Eingang 1 und 2
- 22.443 Eingangstür Leichen
- 22.444 - 22.446 entfallen

Montagepläne

Bl.Nr.:

- 23.201 Untergeschoß  
23.202 1. und 3. Obergeschoß  
23.203 2. Obergeschoß  
23.204 4. Obergeschoß  
23.205 5. Obergeschoß  
23.206 Drempel  
✓ 23.207 Decke über 1. und 3. Obergeschoß  
✓ 23.208 Decke über 2. und 4. Obergeschoß  
23.209 Decke über 5. Obergeschoß  
✓ 23.210 Decke über Drempel  
  
23.211 Bewehrung Decke über 1. bis 5. Obergeschoß  
✓ 23.212 Maschinenhaus unter Decke +15,25 m  
✓ 23.213 " über Decke +15,25 m  
✓ 23.214 " Wandabwicklung  
✓ 23.215 " Decke und Bewehrung  
✓ 23.216 " Fries  
✓ 23.217/18 Deckenscheibenbewehrung: Stahlliste  
✓ 23.219 Ringbalkenbewehrung Maschinenhaus: Stahlliste  
✓ 23.220 Bewehrung für Montageöffnung in Decke über 5. OG  
und in Schachtdeckenebene  
  
23.301 bis  
✓ 23.318 Rohbauelementeliste  
  
✓ 23.350 Kleiseisenliste



Stahlbauzeichnungen:

Bl.Nr.:

- ✓ 23.401 Stahlkonstruktion für Außenwandverankerung  
Untergeschoß bis 5. Obergeschoß
- ✓ 23.402 wie vor, für Maschinenhaus, Ringbalken
- ✓ 23.403 wie vor, Eingangsbereich
- ✓ 23.404 Stahlkonstruktion für Montageträger  
Maschinenhaus
- ✓ 23.405 bis 23.407 e n t f ä l l t
- ✓ 23.408 Stahlträger in HL-Station
- ✓ 23.409 Kleiseisenstückliste für Blatt 3.401 bis 3.404
  
- ✓ 23.411 Aufzug Maschinenhaus Schachtdecke Bewehrungsplan
  
- ✓ 23.420 Elementezeichnung - Antriebsfundament P 053
- ✓ 23.420.1 Obere Bewehrung - " P 053
- ✓ 23.420.2 Materialliste P 053
- ✓ 23.421 Elementezeichnung - Antriebsfundament P 161
- ✓ 23.421.1 Materialliste - " P 161

2 Erläuterungsbericht

Bauvorhaben: WV-Projekt  
Feierabendheim mit Pflegestation  
176 Plätze

Projekt-Nr.: 521-2205-07/17

## E R L Ä U T E R U N G S B E R I C H T

Bei der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus gewinnt die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen immer zunehmender an Bedeutung.

Hierbei spielen die Wohn- und sozialen Bedingungen eine große Rolle, wobei es auch darum geht, die Lebensbedingungen so zu gestalten, daß sie den Bedürfnissen und Gewohnheiten entsprechen. Dies entspricht der Politik der sozialistischen Gesellschaft, in deren Mittelpunkt die Sorge um den Menschen steht.

Das Hauptanliegen ist, die Übereinstimmung zwischen den Gesamtbedürfnissen der Gesellschaft und den individuellen Bedürfnissen sowie den Wünschen ihrer einzelnen Mitglieder herbeizuführen.

Diesen Grundsätzen folgend auf der Basis der Beschlüsse des VIII. Parteitages der SED ist im Rahmen eines Themas des Planes Wissenschaft und Technik das Ausführungsprojekt für ein Feierabendheim mit Pflegestation als bezirkliches Angebotsprojekt erarbeitet worden.

Auf der Grundlage einer bestätigten Studie, der Verfügungen und Mitteilungen des Min. für Gesundheitswesen Nr. 13, der funktionellen Aufgabenstellung des Institutes für Technologie der Gesundheitsbauten sowie der Dokumentation "Funktionseinheiten für Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens" ist eine Konzeption entwickelt worden, die eine Verbesserung der medizinischen, sozialen und kulturellen Betreuung der Bürger im höheren Lebensalter darstellt.

Bettenhaus

Das Bettenhaus, mit einer Kapazitätsgröße von 176 Plätzen untergliedert sich in insgesamt 5 Stationen, wobei 3 Stationen als Pflege- und 2 Stationen als Feierabendplätze ausgewiesen sind. Die einzelnen Stationen sind in ihrem Aufbau so gestaltet, daß sie untereinander ausgetauscht werden können.

Jede Feierabendstation umfaßt 34 Betten und verfügt über einen Gemeinschaftsraum und eine Kochstelle für die Heimbewohner. Die Wohn- und Schlafräume sind grundsätzlich als 1- und 2-Bettzimmer vorgesehen. Jeder dieser Räume erhält eine Sanitärzelle mit einem WC und einer Waschgelegenheit, darüberhinaus ist jedem Raum eine Loggia vorgelagert.

Als weitere Stationsräume sind vorhanden:

Ein Personalraum, ein Spülraum, ein großer Baderaum, ein kleiner Baderaum sowie entspr. WC und Abstellräume für Reinigungsgeräte.

In den Pflegestationen ist der Anteil an Einbettzimmern zu Gunsten von 3-Bettzimmern reduziert, wobei der funktionelle Aufbau der Bettenzimmer identisch mit denen der Feierabendstation ist. Neben einem Gemeinschaftsraum ist an weiteren Stationsräumen vorgesehen:

eine Teeküche, ein Stationszimmer, ein kleiner Baderaum mit WC-Anlagen und ein großer Baderaum. Außerdem ist ein Reinigungsgeräte- und ein Personal-WC-vorgesehen.

In einer der 3 konzipierten Pflegestationen sind 2 Einbettzimmer als Isolierzimmer angeordnet, die von dem übrigen Stationsbereich über eine Schleuse zu erreichen sind.

Jede Station ist über einen Verkehrskern gesondert erschlossen, so daß eine absolute Trennung ermöglicht ist. Innerhalb des Verkehrsraumes ist ein Betten-Personenaufzug P 161 und ein geräumiges Treppenhaus vorgesehen. Ein weiterer Personenaufzug ist vom Wirtschaftsraum erschlossen und dient in der Hauptsache dazu, den internen Wirtschaftsverkehr abzufangen.



Das Untergeschoß ist in der normalen Geschosshöhe geplant und ermöglicht eine Erschließung des Verkehrskernes von zwei verschiedenen Seiten.

Im Untergeschoß sind unmittelbar neben dem Verkehrskern die Räume für die medizinische Betreuung vorgesehen. Vom normalen Verkehrsablauf getrennt sind im Untergeschoß techn. Räume (HAST-Anschlußraum, Elt-Anschlußraum, Wasser) ein Müllsammelraum, die Beschäftigungsräume, ein Waschraum, ein Trockenraum, ein Bügel- und Nähraum, sowie entspr. Lagerräume angeordnet.

Durch eine Schleuse getrennt sind ein Nachlaßraum und ein Aufbewahrungsraum für Leichen zu erreichen. Ein unmittelbar gesonderter Ausgang für diesen Bereich ist am Giebel vorgesehen.

Desweiteren sind im Untergeschoß noch eine Werkstatt sowie Lageräume für den Hausmeister konzipiert.

Das Bettenhaus ist in der 2. Mp-Laststufe in Vollmontagebauweise aufgebaut und ist nicht unterkellert. Die Außenwandelemente sind der SKH-Bauweise angepaßt, alle Fensterflächen sind Paneel-elemente.


Durch die Anordnung verschieden tiefer Wohn-Schlafräume ist ermöglicht worden, daß eine lebendige Fassadengestaltung gegeben ist und zum anderen der Mittelflur in seiner Verkehrsführung nicht als geradliniger Schlauch in Erscheinung tritt.


Bei Anordnung des Bettenhauses an einen Standort für 352 Plätze ist zu beachten, daß im Untergeschoß im Bereich der medizinischen Betreuung eine andere Raumfunktion vorgesehen ist.

So sind zwei Räume für individuelle Feiern für die Heimbewohner einzurichten, sowie zwei zusätzliche Verwaltungsräume.

Halle/S., den 15.08.1980

VEB Projektierung und Technologie Halle  
Kombinatsbetrieb des VEB WBK Halle  
Produktionsbereich 2

  
Naue  
Brigadeführer

  
Paatz  
Leitarchitekt

3 Bandschreibung Entwurf

Projekt!           Feierabendheim mit Pflegestation  
                    Bettenhaus 176 Plätze  
Projekt-Nr.:   521-2205-07

## Baubeschreibung Entwurf

### 4.0 Ausbau

#### 4.1 Putzarbeiten

##### a) Außenputz

- Die z.T. gemauerten Außenwände im Untergeschoß sowie die gemauerte Außenwand - Dachausstieg im 6. Obergeschoß - sind mit einem 20 mm dicken Außenputz, zweilagig in MG II zu versehen.

##### b) Innenputz

Alle gemauerten Wände, Außenwände im Untergeschoß - Außenwand im 6. Obergeschoß - sowie alle 70 mm dicken gemauerten Innenwände sind mit einem 15 mm dicken Innenputz - MG II - zu versehen.

Alle anderen Innenwände sind Fertigteile aus der 2 Mp-Streifenbauweise als Gleitfertigerproduktion. Die Fugen sind sorgfältig zu verspachteln, die Wandflächen als solche sind zu filzen.

#### 4.2 Türen

Alle Eingangstüren im Bereich des Untergeschosses sind Typenholz- oder -stahltüren. Die entsprechenden Detailzeichnungen sind zu beachten.

Alle Innentüren (Systembreite 1200 mm) in den 190 mm dicken Fertigteillementen sind Blendrahmentüren nach TGL bzw. Anzeigekatalog der Erzeugnisgruppe Türen. Ebenfalls als Blendrahmentüren sind die Türen zu den Sanitärzellen in den 60 mm Betonfertigteillementen auszubilden. Die Türen in den gemauerten 70 mm dicken Wänden sind als Futtertüren auszuweisen. Alle Türen sind ohne Schwellen auszubilden. Im Bereich der Türleibung zwischen Flur und Naßräumen in den Geschossen (kl. u. gr. Bad sowie Spülraum) ist der Fußboden des Flures um einen Zentimeter anzuhöhen, um einen in der Höhe gleichmäßigen Übergang zu erreichen.

Die Türen zu den Sanitärzellen der Bettenräume, die Futtertüren im kleinen Bad sowie die Tür zum Spülraum erhalten unten einen Belüftungsschlitz.

Die Zugangstür zum 6. Obergeschoß (techn. Bereich) und die Ausgangstür zum Dach sind Stahldrehtüren nach Katalog M 7409 PET mit einem Fw von 0,75.

Die Tür zum Maschinenraum ist eine Stahlrahmentür mit Maschen- drahtfüllung nach Detail.

#### 4.3 Fenster

Fenster nach Katalog 22 881 und Katalog H 7415 PEF der EG Bauelemente als Holzfenster mit 2 Glasebenen als Thermo- scheibe.

Im Trockenraum und im Waschraum im Untergeschoß kommen Ein- fachfenster zum Einsatz, da in einen Flügel ein elektr. Fensterlüfter installiert wird.

In den Normalgeschossen sind die Fenstertür und die Fenster bereits in den Paneelen für die Loggienrückwand bzw. in den Paneelen für die Schachbrettfassade eingebaut. Außerdem sind in dem Loggienpaneel Flächen mit feststehender Verglasung vorgesehen; die dafür gewählte Thermoscheibengröße entspricht auch hier dem Fensterkatalog.

Vor dem Anschlagen der Paneelwände ist ein Kalfaterstrick am Holz zu befestigen und gegen den Anschlag zu pressen. Anschließend sind die Fugen mit Plastosit oder Thioplast auszupressen und die Stopfdichtung auszupressen und die Stopfdichtung aus Mineralwolle einzubringen.

Nach dem Eindichten sind die lose mitgelieferten Decklei- sten bzw. Blenden mit Leim zu bestreichen und aufzuschrau- ben. Auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen zwischen Paneel und Fertigteillement sowie der Fugen innerhalb des Paneels ist zu achten.

Die Flurfenster sind ebenfalls Fenster mit Thermo verglasung nach TGL.

Fenster nach TGL 22 881 und Katalog H 7415 PEF der EG Bau- elemente - Holzfenster mit einer Glasebene - sind für die Treppenhausefenster der Herseburger Treppe vorgesehen. Die unteren Fenster erhalten ein herausnehmbares Schutzgitter aus Stahl nach Detail.



In den Einfachfenstern im Trockenraum und im Waschraum sind Fensterlüfter einzubauen und einzukleben.

Die Fenster der Verteilerhalle sind nach Detail als Holzkonstruktion zu fertigen. Unter Verwendung von TGL-gerechten, thermoverglasten Fenstern, sowie mit feststehenden, mit Drahtglas verglasten Fenstern im Brüstungsbereich, ist die Fläche zu schließen. Zu beachten ist die auf der Geschoßdecke aufzumauernde 140 mm hohe Brüstung, die in der Ansichtsfläche einschl. der Decke mit trapezförmig gefalteten Alublech verkleidet wird.

Im 6. Obergeschoß ist die Öffnung mittels Glasbausteinen nach Detail zu schließen.

#### 4.4 Einbauschränke - Verkleidungen - sonstige Tischlerarbeiten

Der Raum für Reinigungsgeräte in den Normalgeschossen erhält einen Einbauschränk nach Detail.

Die Teeküchen in den Stationen erhalten Unter- und Oberschränke aus dem Typenangebot vom Küchenmöbelkombinat Worbis. Die in den Fluren vorgesehenen Elektroverkleidungen - je Geschoß einmal - sind mit einem zweitürigen Schrank mit oberer Klappe zu verschließen. Die Klappe wird mit zwei Fitschenbändern angeschlagen und mit zwei Vorreibern verschlossen.

Die Türen sind jeweils mit drei Fitschenbändern angeschlagen. Die linke Tür wird mit zwei Schrenkriegeln festgestellt, die rechte ist mit einem Einsteckschloß versehen. Siehe Detail. Die Verkleidung der Regenrohre vom UG bis 5. OG erfolgt mittels Holzspanplatten und Latten, die mit PVC-Spreindübeln an der Wand befestigt werden. Die Hohlräume sind mit Schlackenwolle auszufüllen. Nach Detail.

Die Verkleidung der Entlüftungsschächte sowie der Rohrinstitution erfolgt durch eine Holzkonstruktion, die mittels Winkelisen an der Wand als auch an den Decken und Fußböden befestigt wird. Die Verkleidung selbst besteht aus einer Holzspanplatte in der sämtliche Öffnungen, wie Luftdurchlaßelement, Revisionsöffnung, Leitungsdurchgänge sowie Be- und Entlüftungsöffnungen nach Detail vorzusehen sind. Die Verkleidung wird mit einer Leukorthenfolie bespannt bzw. beklebt. Die entsprechenden Detailblätter sind zu beachten.

#### 4.5 Treppen, Treppengeländer

Für die Geländer der Merseburger Treppe kommen Stahlgeländer zur Anwendung. Sie werden sofort nach Montage der Treppenhäufe befestigt und dienen zugleich während der Ausbauarbeiten als Schutzbrüstung.

Die erforderlichen PVC-Handläufe werden erst im Zuge des späteren Ausbaues angebracht. Siehe Detail.

Das Haupttreppenhaus erhält ein Treppengeländer mit einem Handlauf aus Eichenholz sowie drei Stück Knieleisten, ebenfalls aus Eiche. Das Holz ist Natur zu belassen und lediglich zu lasieren. Die Haupttreppe erhält zusätzlich an den Wandflächen noch Handläufe aus Eichenholz, wie vor behandelt.

Die gleiche Konstruktions- und Materialart kommt auch in den Mittelfluren zur Anwendung. Hier sind einseitig auf der Wandfläche Handläufe vorgesehen. Siehe Detail.

Der Zugang zum Maschinenraum erfolgt im 6. OG über eine Stahlbrücke nach Detail. Der Zugang zum Dach über dem Haupttreppenhaus erfolgt über eine außen angebrachte Steigleiter aus Stahl mit Rückenschutz. Von dieser Dachfläche aus führt nochmals eine Steigleiter ohne Rückenschutz zur Dachfläche über dem Maschinengeschob, nach Detail.

#### 4.6 Loggienbrüstung

Alle Loggien erhalten eine Brüstung aus einer Stahlkonstruktion mit Feldverkleidungen aus gelbem und weißen Drahterzementglas nach Detail. Die Stahlkonstruktion wird mittels Schraubverbindungen an den Wand- bzw. Deckenelementen befestigt.

#### 4.7 Außenputz

Siehe hierzu Anlage 1 der Baubeschreibung Ausbau.

#### 4.8 Außenputz

Siehe hierzu Anlage 2 der Baubeschreibung Ausbau.

#### 4.9 Steinmetzarbeiten

Vor Einbau der Paneele in der GSB-Ersatzwand ist eine durchgehende Sohlbank aus geschliffenem Kunststein, mit einer Wasserrinne versehen, zu verlegen.

Die Flur- und Treppenhausfenster erhalten innere Sohlbänke aus geschliffenem Kunststein. Desweiteren erhalten alle Fenster im Untergeschoß sowohl auf den gemauerten Brüstungen als auf den Fertigteilelementen, sowie die Fenster in der Verteilerhalle eine innere und äußere Sohlbank aus Kunststein. Die Ansichtsflächen sind zu schleifen.

Eine Aufkröpfung an den Enden der äußeren Sohlbank ist vorzusehen. Alle Sohlbänke nach Detail.

An sämtlichen Eingängen im Untergeschoß sind Stufen bzw. Rampen, monolithisch eingebracht, vorgelagert.

#### 4.10 Schlosserarbeiten

Neben den bereits erwähnten Schlosserarbeiten - Steigleitern über Dach, Stahltreppe mit Geländer zum Maschinenraum, Tür- und Öffnungsverkleidung aus Stahlrahmen mit Maschendrahtfüllung im Maschinenraum, Treppengeländer, Schutzgitter Treppenhausfenster und Loggienbrüstungen - sind folgende weitere Schlosserarbeiten notwendig:

Zur Montage der Antriebsmaschinen für den P 053 und P 161 sind Öffnungen in der Schachtdecke und der Zwischendecke im Maschinenraum vorgesehen. Diese sind mit Montageklappen aus Stahlprofilen und Stahlblech nach Detail zu schließen. Die für die Heimbewohner vorgesehenen Badewannen, Duschen und WC erhalten alle Handgriffe - siehe Detail.

#### 4.11 Fliesenarbeiten

Im Untergeschoß sind folgende Räume allseitig 1,50 m hoch mit keramischen Platten zu versehen:

Raum für Leichen, Waschraum, Müllarmelraum, Lager Schmutzwäsche und Wirtschaftsgang 2. Im Personalwaschraum sind die Wände hinter den Waschbecken 1,50 m hoch mit Fliesen zu versehen, die Wand am Fußende der Wanne über die ganze Länge und die Seitenwand hinter der Wand bis zum Türfutter sind ebenfalls 1,50 m hoch zu fliesen.



In der medizinischen Betreuung - Behandlungsraum 2 - ist hinter dem Becken ein Fliesenspiegel 1,50 m hoch und 1,60 m breit anzubringen.

In den Bettengeschoßen erhält der Wirtschaftsraum allseitig 1,50 m hoch keramische Platten.

Im kleinen und großen Bad sowie im Spülraum werden die Wände, wie in den Möblierungsplänen angegeben, gefliest. Das gleiche trifft zu für den Reinigungsgeräte- und Personal-WC. In der Teeküche ist auf der Seite der Naßstrecke oberhalb der Unterschränke 3 Schichten hoch zu fliesen. Hinter dem Elektroherd ist ein Fliesenspiegel 1,50 m hoch und 1,00 m breit vorzusehen.

#### 4.12 Behandlung der Außenwandflächen

Siehe hierzu gesonderte Anlage.

#### 4.13 Behandlung der Innenwandflächen

Im Untergeschoß sind in folgenden Räumen die Wand- und Deckenflächen zu kalkan: Hausanschlußstation - Anschlußraum Wasser - Hausanschlußraum Elt - Waschraum - Trockenraum und Personalwaschraum. Mit Kalklatex werden die Wände in nachfolgend aufgeführten Räumen gestrichen: alle Flure und Eingänge - Raum für Leichen - Raum für Abfälle - Schmutzwäsche - Sauberwäsche - Lager - Wirtschaftsgang und Treppen. Die Decken dieser Räume werden grundsätzlich in Leimfarbe gestrichen.

In folgenden Räumen werden die Wände als auch die Decken mit einem zweimaligen Leimfarbenanstrich versehen: Hausmeisterwerkstatt - Beschäftigungsräume - Nachlaßraum - Näh- und Bügelraum - Personalraum - Raum für Rollstühle und die Med. Betreuung 3.

In den anderen Räumen der Med. Betreuung werden die Wände und Decken tapeziert. In den Normalgeschoßen sind die Wand- und Deckenflächen der Bettenräume einschl. der Vorräume sowie die Gemeinschaftsräume tapeziert.

Die Flure werden ebenfalls voll tapeziert, d.h. Decken und Wände, wobei die Wände anschließend mit Latex überstrichen werden.



Die Treppenhäuser - Verteilerhalle sowie der Wirtschaftsraum werden mit Kalklatex gestrichen. Mit einem zweimaligen Leimfarbenanstrich für Wände und Decken werden folgende Räume versehen: Teeküche - Stationszimmer - WC-Personal - sowie die Sanitärzellen der Bettenräume. Letztere erhalten an der Sanitärschachtverkleidung eine Leukorthenfolie.

Im kleinen und großen Bad sowie im Spülraum sind Wände und Decken mit Kalkfarbe zu streichen.

Im 6. Obergeschoß sind sämtliche Wand- und Deckenflächen zu kalkan.

Die Gipskartonplatten der Paneelwandelemente sind im Fugenbereich zu spachteln und zu tapezieren. Lediglich hinter den Heizkörpern sind die Platten mit Latex zu streichen.

#### 4.14 Dachklempnerarbeiten

Die äußeren Sohlbänke der Flur- und Treppenhausfenster erhalten eine Abdeckung aus Alublech nach Detail. Die Dachan- und -abschlüsse erhalten Abdeckungen aus Alublech bzw. verzinktem Stahlblech. Siehe hierzu die entsprechenden Detailblätter.

#### 4.15 Schallschutzmaßnahmen

Für den Aufzugsmaschinenraum sind gesonderte Maßnahmen notwendig. Die Antriebsmaschinen sind schwingisoliert gelagert, der übrige Fußboden ist mit einem schwimmenden Estrich ausgebildet. Siehe Detail.

Die Decken und Wände des Maschinenraumes sind mit Kamilit und Nessel in einer Holzrahmenkonstruktion verkleidet, siehe Detail. Die gleiche Verkleidung der Decken und Wände in der Hausanschlußstation ist vorzusehen.

#### 4.16 Sonstige Malerarbeiten

Alle nicht oberflächenfertig gelieferten Einbauten aus Holz sowie die Fußleisten, Treppengeländer, Treppenhausfenster-

**Alle zum Einbau kommenden Stahlteile erhalten Korrosionsschutz.**

VEB Projektierung und Technologie Halle  
Kombinatbetrieb des VEB WBK Halle  
Produktionsbereich 2

Naue  
Brigadeleiter

Faatz  
Leitarchitekt

4 Anlage 1 Feysbockmampfben

Projekt:           Feierabendheim mit Pflegestation  
                  Bettenhaus 176 Plätze  
Projekt-Nr.:   521-2205-07

Anlage 1  
zur Baubeschreibung Ausbau - Fußbodenaufbau -

Übersicht der einzelnen Fußböden

|                               |                                            |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Nr. 1</u> Spannteppich     | Untergeschoß                               | Med. Betreuung<br>Aufnahme-Sprechzimmer<br>Behandlung 1 und 2                                                                                                                            |
| <u>Nr. 2</u> Debolon          | 1.-5.Obergeschoß                           | Bettenräume<br>Isolierzimmer<br>Flure 1-2-3-4<br>Gemeinschaftsraum<br>Stationszimmer<br>Teeküche                                                                                         |
| <u>Nr. 3</u> Amolit S         | 1.-5.Obergeschoß                           | Verteilerhalle<br>Wirtschaftsraum                                                                                                                                                        |
| <u>Nr. 5</u> Industriebelag   | Untergeschoß                               | Flure 1-8<br>Schleuse<br>Eingang 1-3<br>Hausmeisterwerkstatt<br>Beschäftigungsräume 1-3<br>Personalraum<br>Lager Sauberwäsche<br>Lager<br>Rollstühle<br>Nachlaßraum<br>Näh- u. Büßelraum |
| <u>Nr. 6</u> Steinzeugplatten | Untergeschoß<br>m.Sickerwasserdichtung     | Med.Betreuung Behandl. 3<br>Raum für Leichen<br>Trockenraum<br>Waschraum<br>Personalwaschraum<br>Lager Schmutzwäsche                                                                     |
| <u>Nr. 7</u> Steinzeugplatten | 1.-5.Obergeschoß<br>m.Sickerwasserdichtung | Kleines Bad<br>Großes Bad<br>Spülraum                                                                                                                                                    |
| <u>Nr. 8</u> Steinzeugplatten | 1.-5.Obergeschoß                           | WC-Personal<br>Reinigungsgeräte                                                                                                                                                          |



|               |                                                      |                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <u>Nr. 8a</u> | Kunststeinplatten Untergeschoß<br>1.-5.Obergesch.    | Wirtschaftsgang<br>Treppenpodeste                                        |
| <u>Nr. 9</u>  | Zementestrich Untergeschoß<br>m.Sickerwasserdichtung | Müll-Abfallraum<br>HA-Station<br>Hausanschluß-Wasser<br>Hausanschluß-Elk |
| <u>Nr. 10</u> | PVA-Spachtelbelag 6.Obergesch.                       | Aufzugsmaschinenraum                                                     |
| <u>Nr. 11</u> | Zementestrich 6. Obergesch.                          | Vorraum<br>Techn. Raum                                                   |

Für die Nebentreppe wird original die Merseburger Treppe aus Wohnungsbauserie IW 64 P-Reihe Halle verwendet.  
Treppenläufe und Podeste - beides oberflächenfertig.  
Für die Haupttreppe werden die Treppenläufe H-NL 5.1 verwendet - oberflächenfertige Kunststeinstufen.  
Das Zwischenpodest muß monolithisch belegt werden. Belag - Kunststeinplatten Nr. 8a

#### Fußbodenaufbau

##### Nr. 1 Spannteppich

Ebene: Untergeschoß  
Konstruktionshöhe 100 mm

5 mm Spannteppich mit Filzunterlage  
69 mm Anhydritestrich ABS 400 mit granulierter  
Hochofenschlacke  
1 mm 1 Lage Dichtungsbitumenpappe 500  
20 mm Schaumpolystyrolflocken  
5 mm 2 Lagen Dichtungsbitumenpappe 500  
vollflächig geklebt  
Unterbeton

##### Nr. 2 Debolon

Ebene: Normalgeschoß  
Konstruktionshöhe 45 mm

4 mm Debolonbelag auf Petralonfilz  
41 mm Anhydritestrich ABS 400 mit  
granulierter Hochofenschlacke

##### Nr. 3 Amolit S

Ebene: Normalgeschoß  
Konstruktionshöhe 45 mm

1,5 mm Amolit S  
43,5 mm Anhydritestrich ABS 400 mit  
granulierter Hochofenschlacke



Nr. 5 Industriebeleg

Ebene: Untergeschoß  
Konstruktionshöhe 100 mm

- 4 mm Industriebelag, Nahte verschweißt  
70 mm Anhydritestrich ABS 400 mit  
granulierter Hochofenschlacke  
1 mm 1 Lage Dichtungsbitumenpappe 500  
20 mm Schaumpolystyrolflocken  
5 mm 2 Lagen Dichtungsbitumenpappe 500  
vollflächig geklebt  
Unterbeton

Nr. 6 Steinzeugplatten mit Sickerwasserdichtung

Ebene: Untergeschoß  
Konstruktionshöhe siehe Detailblatt Nr. 22.453

- 25 mm Steinzeugplatten 150 x 150 x 11,5 einschl.  
Mörtelbett MG III  
30 mm Schutzbeton B 160 (Fugen aller 3000 mm)  
5 mm 3 Lagen Dichtungsbitumenpappe 500  
vollflächig geklebt  
10-70 mm Gefällebeton B 160 (Fugen aller 3000 mm)  
5 mm 2 Lagen Dichtungsbitumenpappe 500  
vollflächig geklebt  
Unterbeton  
Sickerwasserdichtung nach TGL 10 689 Bl. 3  
und TGL 35 761  
(Sperrung an den Seiten hochziehen)

Nr. 7 Steinzeugplatten mit Sickerwasserdichtung

Ebene: Normalgeschoß  
Konstruktionshöhe 75-105 mm

- 25 mm Steinzeugplatten 150 x 150 x 11,5 einschl.  
Mörtelbett MG III  
30 mm Schutzbeton B 160 (Fugen aller 3000 mm)  
10 mm 3 Lagen Dichtungsbitumenpappe 500  
vollflächig geklebt  
10-40 mm Gefällebeton B 160 (Fugen aller 3000 mm)  
Sickerwasserdichtung nach TGL 10 689 Bl. 3  
und TGL 35 761  
(Sperrung an den Seiten hochziehen)

## Nr. 8 Steinzeugplatten

Ebene: Normalgeschoß  
Konstruktionshöhe 95 mm

- 25 mm Steinzeugplatten 150 x 150 x 11,5 einschl.  
Mörtelbett MG III  
35 mm Zementestrich B 225  
1 Lage Dichtungsbitumenpappe 500  
35 mm zementgebundene HWL-Platten

Im Bereich der NaGräume einschl. WC-Personal und Reinigungsgefe-  
raum in den Normalgeschossen werden Decken mit d = 140 mm ver-  
legt. (Sonst d = 190 mm)



Nr. 8a Kunststeinplatten

Ebene: Untergeschoß  
 Konstruktionshöhe 100 mm

30 mm Kunststeinplatten 300 x 300 x 30  
 20 mm Mortelbett MG III  
 45 mm Zementestrich  
 5 mm 2 Lagen Dichtungsbitumenpappe 500  
 vollflächig geklebt  
 Unterbeton

Nr. 9 Zementestrich mit Sickerwasserdichtung

Ebene: Untergeschoß  
 Konstruktionshöhe siehe Detail Bl. Nr. 22.453

25 mm Zementestrich mit Hartemittelzusatz  
 30 mm Schutzbeton B 160 (Fugen aller 3000 mm)  
 5 mm 3 Lagen Dichtungsbitumenpappe 500  
 vollflächig geklebt  
 10- 70 mm Gefällebeton B 160 (Fugen aller 3000 mm)  
 5 mm 2 Lagen Dichtungsbitumenpappe 500  
 vollflächig geklebt  
 Unterbeton  
 Sickerwasserdichtung nach TGL 10 689  
 und TGL 35 761

Nr. 10 Spachtelbelag

Ebene: 6. Obergeschoß  
 Konstruktionshöhe 100 mm

5 mm PVA-Spachtelbelag, Feinspachtel-Nockenspachtel, Grob-  
 55 mm Zementestrich B 225 spachtel  
 5 mm 2 Lagen Dichtungsbitumenpappe 500  
 Stöße geklebt  
 30 mm Zementestrich B 225  
 5 mm 2 Lagen Dichtungsbitumenpappe 500  
 Stöße geklebt

Nr. 11 Zementestrich

Ebene: 6. Obergeschoß  
 Konstruktionshöhe 45 mm

28 mm Zementestrich B 225 Oberfläche glatt abgerieben,  
 geglättet und flutiert  
 1 mm 1 Lage Verpackungsteerpappe 350  
 15 mm Kamilit  
 1 mm 1 Lage Dichtungsbitumenpappe 500, Stöße geklebt

Die Fußbodenunterkanten liegen mit Ausnahme der Naßräume innerhalb  
 eines Geschosses auf einem Niveau. Beim Zusammenstoßen verschiede-  
 ner Fußbodenbeläge sind jeweils Trennschienen einzubringen.

Halle/8., den 20.02.1981

VEB Projektierung u. Technologie Halle  
 Kombinatbetrieb des VEB WBK Halle  
 Produktionsbereich 2

*Naue*  
 Naue  
 Brigadeleiter

*Featz*  
 Featz  
 Leiterarchitekt

5 Anlage 2 Dachaufbau

Projekt                   Feierabendheim mit Pflegestation  
                          Bettenhaus 176 Plätze  
Projekt-Nr.           521-2205-07

Anlage 2

zur Baubeschreibung Ausbau - Dachaufbau -

A - Warmdach

Ausführung auf gesamter Fläche des Daches über dem 5. OG  
auch innerhalb des Dremfels und über dem Maschinenraum bzw.  
Treppenhaus. Nicht auszuführen über dem umlaufenden Dremfel-  
Heizkanal.

- 2 Lg. Bekiesung aus hellgrauem Schiefersplitt
- 2     Bekiesungsanstriche kalt
- 1     heißflüssiger Deckanstrich
- 1 Lg. Glasvliesdachbelag geklebt
- 2 Lg. Bitumendachpappe 500 geklebt  
      mit 10 cm überdeckenden Stößen
- 25 mm Schaumpolystyrolplatten unten und oben eingestrichen
- 1     Klebeanstrich heiß
- 25 mm Schaumpolystyrolplatten wie vor, jedoch mit Diffusionskanal
- 1     Klebeanstrich heiß
- 1 Lg. Bitumendachpappe 500 geklebt  
      mit 10 cm überdeckenden Stößen
- 1     kaltflüssiger Voranstrich

siehe hierzu Dachdraufsicht/Gefälleplan!

280 mm Gefällebeton sind der auftretende Maximalwert.

30/mm Schlackenbeton ( $\rho = 1200 \text{ kg/m}^3$ )

280     als Gefällebeton - Gefälle rd. 2,5 %  
          (im Dremfel rd. 5 %)

190 mm Fertigteildecke

Es ist darauf zu achten, daß nur phenolfreie Dachpappen im  
Einsatz kommen.

Infolge der Verwendung von Schaumpolystyrolplatten ist beim  
Kleben der Pappen nach dem Klappverfahren zu arbeiten.

Im Bereich der Dacheinläufe sind zusätzlich 2 Lagen 500-er  
Pappe zu kleben. Die Dachentwässerung erfolgt nach innen, ein  
Laubfang ist vorzusehen.

Alle Dacheinläufe erhalten eine Wärmedämmung.

Diffusionseinsätze sind anzuordnen nach Detail-Bl.-Nr. 22 411.

#### Ergänzung.

Als Ausgleich für die zwei Lagen Schaumpolystyrol (50 mm) können auch 60 mm Altmarkplatten (Tangermünder Platten) mit Diffusionskanalen zum Einsatz kommen.

(Vierschichtige, streifenweise verleimte Platten mit Diffusionsrandkanalen, je Plattendicke 15 mm.)

Damit wurde der gleiche Wärmedämmwert erreicht werden, wie oben angegeben.

#### B - Kaltdach

Ausführung über den auf den Längsseiten verlaufenden Dampeln.  
Die Deckenplatten werden im Gefälle von 2,5 % verlegt.

2 Lg. Bekiesung aus hellgrauem Schiefersplitt

2 Bekiesungsanstriche kalt

1 heißflüssiger Deckanstrich

1 Lg. Glasvliesdachbelag geklebt

2 Lg. Bitumendachpappe 500 geklebt  
mit 10 cm überdeckenden Stößen

1 kaltflüssiger Voranstrich.

190 mm Fertigteildecke

Halle, den 20.02.1981

VEB Projektierung und Technologie Halle  
Kombinatsbetrieb des VEB WBK Halle  
Produktionsbereich 2

*Naue*  
Naue  
Brigadeleiter

*Leiter*  
Leiter  
Leiterarchitekt

6 Außenbau + Gestaltung

521-2205-07

# Außenhautgestaltung

Alle Farbangaben erfolgen im Rahmen der örtlichen Anpassung in einem gesonderten Farbprojekt

1. Alle Außenwandflächen der GSB-Ersatzlosung, also SKB-Betonelemente

Splitt - Farbe nach Aussage des Farbprojektes  
Bedarf pro Bettenhaus 1 060,00 m<sup>2</sup>

- ## 2. Außenwandelemente der Treppenhäuser und Flurfenster

Spaltkeramik - Farbe nach Aussage des Farbprojektes  
Bedarf pro Bettenhaus 180,00 m<sup>2</sup>

- ### 3. Außenwandelemente des Drempels und verschiedener Schaftelemente

Splitt - Farbe nach Aussage des Farbprojektes 2  
Bedarf pro Bettenhaus 300,00 m

- #### 4. Loggiens chäfte

VR-Plastputz, weiß  
Bedarf pro Bettenhaus 840,00 m<sup>2</sup>

- ### 5. Außenwandflächen im Untergeschoß

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| VR-Plastputz          | 152,00 m <sup>2</sup>           |
| Bedarf pro Bettenhaus | <del>152,00 m<sup>2</sup></del> |



7 Schutzgütemachweis

VEB Projektierung und Technologie

Betrieb des VEB WBK Halle

Halle, den 20.02.1981


S C H U T Z G Ü T E N A C H W E I S

Projekt: Feierabendheim mit Pflegestation  
Bettenhaus 176 Plätze

Projekt-Nr.: 521-2205-07

Im bautechnischen Teil des Ausführungsprojektes mit Erläuterungen zum Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz wird der Nachweis erbracht, daß die neuesten arbeitsschutz- und brandschutztechnischen sowie arbeitshygienischen Erkenntnisse berücksichtigt wurden.

Inbezug auf die weitere Verwendung der Projektunterlagen bestehen bei der Schutzgütekommision keine Bedenken.

  
S c h k o p i:  
Vors. der betrieblichen  
Schutzgütekommision

Anlagen:

1. Schutzgütenachweis Entwurf
2. " Heizung, Lüftung, Sanitär
3. " Elektro
4. " Gemeinschaftsanlagen

8 Einkommensgeld + GA BS

Projekt: Feierabendheim mit Pflegestation  
Teilobjekt: Bettenhaus 176 Plätze/6-gesch.  
Projekt-Nr.: 521-2205-07

Erläuterungsbericht zum Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz

Teilgebiet Entwurf

Aufgestellt gemäß Anlage 2 der Richtlinie für Schutzgütearbeit vom 1. Juni 1972.

0. Vorbemerkung

Der Erläuterungsbericht zum Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz bezieht sich auf das standortlose Wiederverwendungsprojekt, Teilgebiet Entwurf.

Im Rahmen der örtlichen Anpassung sind alle Territorialfragen des Standortes, wie Klima, Umwelteinflüsse, Städtebau, Verkehr, Anschließung, Außenanlagen und Freiflächen gesondert zu untersuchen und der Nachweis der Schutzgüte zu führen.

Ferner sind alle Veränderungen und Erweiterungen am Projekt, die sich im Rahmen der örtlichen Anpassung ergeben, schutzgütemäßig nachzuweisen.

1. Kurzcharakteristik des Investitionsvorhabens

Projektant: VEB Projektierung und Technologie Halle  
 Kombinatbetrieb des VEB WBK Halle  
 Produktionsbereich 2, Brigade 75-32.31

Umfang der Projektierung

- Entwurf, Statik, Konstruktion
- Heizung, Lüftung, Sanitär
- Elektro- u. Schwachstromanlage
- Bauwirtschaft

Bearbeitungsstufen

- Ausführungsprojekt

Funktion:

Das Bettenhaus dient zum Wohnen und zur Betreuung älterer Bürger, für Pflegefälle sind gesonderte Pflegestationen vorgesehen.

Neben den notwendigen Räumen der hygienischen Versorgung sind eine medizinische Betreuung und verschiedene Beschäftigungsräume vorgesehen.

Zur Speisenversorgung für die Heimbewohner ist ein gesondeter Sozialtrakt mit einer Teilvollküche vorgesehen.

Gebäudekonzeption:

Der Gebäude hat ein ebenerdiges Untergeschoß, 5 Normalgeschosse und ein 6. Teilgeschoß für technische Räume.

Die Raumeinheiten sind in ca. 3,60 m Achsen mit unterschiedlicher Tiefe untergebracht.

Kapazität:

Die Betteneinheiten sind in den 5 Normalgeschossen untergebracht.

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Obergeschoß: | 2 Dreibettzimmer Pflegestation      |
|                 | 13 Zweibettzimmer "                 |
|                 | 4 Einbettzimmer "                   |
|                 | 36 Plätze Pflegestation             |
| 2. Obergeschoß: | 2 Dreibettzimmer Pflege station     |
|                 | 13 Zweibettzimmer "                 |
|                 | 4 Einbettzimmer "                   |
|                 | 36 Plätze Pflegestation             |
| 3. Obergeschoß: | 2 Dreibettzimmer Pflegestation      |
|                 | 13 Zweibettzimmer "                 |
|                 | 4 Einbettzimmer "                   |
|                 | 36 Plätze Pflegestation             |
| 4. Obergeschoß: | 13 Zweibettzimmer Feierabendstation |
|                 | 8 Einbettzimmer "                   |
|                 | 34 Plätze Feierabendstation         |

5. Obergeschoß: 13 Zweibettzimmer Feierabendstation  
 8 Einbettzimmer "  
 34 Plätze Feierabendstation

Gesamtkapazität: 176 Plätze  
 =====

Funktionelle Lösung:

Jeder Betteneinheit ist ein interner Vorraum mit Zugang zu einer Sanitärzelle mit WC und Waschtisch zugeordnet. Außerdem befinden sich auf jedem Stationsgeschoß die nach der Richtlinie des Instituts für Gesundheitswesen geforderten Stationsräume.

Im Untergeschoß sind die nach der o.g. Richtlinie geforderten gemeinschaftlich zu nutzenden Räume, u.a. auch Beschäftigungsräume untergebracht sowie erforderliche technische Räume zur Versorgung des Bettenhauses als auch des Sozialtraktes.

Himmelsrichtung:

Im Rahmen der städtebaulichen Einordnung ist zu berücksichtigen, daß die Bettentimmer eine Ost-West-Orientierung bekommen.

Hauptabmessungen:

Länge: 60,265 m  
 Tiefe: 17,780 m  
 Höhe 4. OG 18,420 m über Terrain  
 Höhe 5. OG 22,140 m über Terrain  
 Geschoßhöhe: 2,800 m  
 lichte Raumhöhe: 2,565 m

Bauweise:

Längs-, Querwände, Decken:

Außenhaut:

Montagebauweise

2-Mp-Lagerstufe - Stabifenbauweise  
 SKM-Betonelemente d = 250 mm  
 Leichtbetonelemente d = 290 mm  
 Paneelelemente



## 2. Bautechnischer Schutz vor mechanischen Gefährdungen

- der gesamte Fußboden innerhalb eines Geschosses liegt auf einem Niveau, um Stolpergefahr für den Heimbewohner zu vermeiden.
- Das Fenster in der Verteilerhalle erhält im unteren Bereich fest mit Drahtglas verglaste Flächen.
- Alle verglasten Türen erhalten im unteren Bereich Schutzleisten.
- Alle verglasten Türen in den Evakuierungswegen erhalten Sicherheitsglas.
- Hauptverkehrsweg Mittelflur: Mindestbreite 1,80 m. In diesem Flur sind in den Normalgeschossen einseitig Handläufe für die Heimbewohner vorgesehen.
- Sämtliche Badewannen, Duschen, WC, die von den Heimbewohnern genutzt werden, erhalten Haltegriffe.
- Treppengeländer 1,00 m hoch mit Stababständen von 0,12 m.
- Loggienbrüstung 1,00 m hoch.
- Für das über Podest liegende Treppenhausfenster ist ein Schutzgitter vorgesehen.
- Die technischen Räume im 6. Obergeschoß, insbesondere der Maschinenraum, sind durch Türen, die verschlossen sind, von den übrigen Räumen getrennt.
- Die im Aufzugsmaschinenraum vorgesehenen Montageluken sind mit Montageklappen abgedeckt.
- Die Steigleiter auf dem Dach ist mit Rückenschutz nach TGL 7973 vorgesehen.

## 3. Bautechnischer Brandschutz

### Angaben zum Bauwerk

|                          |                                                |                       |
|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| <u>Hauptabmessungen:</u> | Länge                                          | 60,267 m              |
|                          | Tiefe                                          | 17,780 m              |
|                          | Höhe 4. OH                                     | 18,420 m über Terrain |
|                          | Höhe 5. OG                                     | 22,140 m über Terrain |
| <u>Bauweise:</u>         | Montagebau - 2. Bp Laststufe, Streifenbauweise |                       |
|                          | Querwandbauweise, 3,60 m Systemmaß             |                       |



- 5 -

Deckenbelastbarkeit: Geschoßdecken 150 und 200  $\text{kp/m}^2$   
Flurdecken 300 "

Brandschutztechnische Einordnung des Bauwerkes:

Feierwiderstandsklasse: II

Feuerwiderstand der Bauteile:

|                                  | fw erf.   | fw vorh.  |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Geschoßdecken                    | oBA/1,0   | oBA/1,0   |
| Außenwände                       | oBA/1,0   | oBA/3,0   |
| Außenwände v. Skeletten getragen | oBA/0,5   | oBA/0,5   |
| Trennwände                       | o.f./o.f. | o.f./o.f. |
| Dachtragwerke                    | oBA/0,5   | oBA/1,0   |
| Trennenwände                     | oBA/1,5   | oBA/4,0   |

Brandgefahrenklasse: D

Brandlast: 125  $\text{Mcal/m}^2$

Brandabschnittsgrößen: zulässig 8000  $\text{m}^2$   
vorh. 4302  $\text{m}^2$

Schutz- und Feuerlöscheinrichtungen:

Evakuierungswege: Ein- u. zweiseitige Evakuierung nach  
TGL 10 685/04  
2 Treppenhäuser  
3 Ausgänge ständig direkt in's Freie

Evakuierungsentfernung: a) einseitige Evakuierung  
E zulässig: 20,00 m  
E vorh.: 11,00 m  
b) zweiseitige Evakuierung  
E zulässig: 50,00 m  
E vorh.: 35,60 m

Brandschutztüren:

Das 6. Obergeschoß, in dem technische Räume vorgesehen sind, ist gegenüber den anderen Bauteilen mit Brandschutztüren fw 0,75 abgeschlossen.

**Naß-Steigeleitungen:** In unmittelbarer Nachbarschaft an jedem Treppenhaus ist je eine Naß-Steigeleitung vorgesehen.

**Rauchabzüge:** Außenliegendes Treppenhaus der Kategorie I mit Fensteranordnung in jedem Geschöß, vorhandene Fensterflügel pro Geschöß  $1,80 \text{ m}^2$ .

Außenliegendes Treppenhaus der Kategorie I mit Fensteranordnung in jedem Geschöß, Größe aller Fenster je Geschöß  $5,63 \text{ m}^2$ .

**Feuerlöscheinrichtung** In den Fluren sind jeweils in der Nähe innerhalb des Gebäudes des Treppenhauses Handfeuerlöscher als

Wasserlöscher W 10 h zu installieren.

Bedarf: 12 Stück

Im Aufzugsmaschinenraum ist ein Halon-Löscher CB 2 L oder TFB 2 L anzuordnen.

#### 4. Bautechnischer Schutz vor klimatischen Gefährdungen

##### Mesoklima

Die Bettenräume sind sämtlich durch die vorgelagerte Loggia vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, außerdem ist die Anbringung von Vorhängen innerhalb des Gardinenkoffers vorgesehen.

Die Stationsräume erhalten Sonnenschutzvorhänge.

Fenster und Loggientüren aller Räume haben eine Thermoverglasung.

##### Raumklima

Orientierung der Bettenräume hat nach Ost-West zu erfolgen. Außenhautgestaltung durch 230 mm dicke GFK-Isolierschicht oder Paneelelemente. Die Paneelelemente werden nachmittags gedreht und nachgewiesen mit einem  $t_{\text{in}} = + 22^\circ\text{C}$ ,  $t_{\text{e}} = - 15^\circ\text{C}$  und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55 - 60 %.

Schutz vor Korrosion:

Sämtliche zum Einbau gelangenden Stahlteile sind vor dem Einbau zu entrosten und mit Rostschutzfarbe zu behandeln.

Anstrichsystem 204 lt. TGL 18 738 Bl. 2 - Säuberungsgrad 2 nach TGL 18 730 Bl. 2.

Alle einzubauenden Holzteile sind mit zugelassenen Holzschutzmitteln zu imprägnieren.

5. Bautechnischer Schutz vor Lärm und Vibration

Entstehungsquellen sind die Einzellüfter und die Antriebsmaschinen der Aufzüge im 6. Obergeschoß. Für die Lüfter sind Schallschutzstrecken vorgesehen. Die Antriebsmaschinen der Aufzüge sind schwingungsisoliert gelagert, ebenso die notwendigen Schaltschränke. Außerdem wurde im Maschinenraum ein schwimmender Estrich vorgesehen; Wände und Decken sind mit Kamilit und Nessel schallschluckend bekleidet.

Ausbildung der Fußböden und Wände in den Normalgeschossen nach TGL 10 687.

9. Grund- und Oberflächenwasserverhältnisse

Feuchtigkeitsschutz erfolgt nach TGL 10 689, Sperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit durch Sperrmörtel, gegen zeitliche Feuchtigkeit durch bituminöse Anstriche an den vom Boden berührten Wandflächen.

Niederschlagswasser wird auf den Dachflächen nach innen über wärmegeämmte Einläufe abgeleitet.

10. Soziale und medizinische EinrichtungenSoziale Einrichtungen

Je Stationsgeschoß ist ein Personalaufenthaltsraum mit Umkleidemöglichkeit vorgesehen gemäß TGL 10 699.

Dieser kann zur Pausenversorgung genutzt werden (Kochendwasserbereiter ist vorgesehen), und dient auch als Frauenruheraum.

- 8 -

Die Versorgung mit warmem Essen erfolgt im Sozialtrakt. Im Untergeschoß ist ein Personalwaschraum mit Wanne und Dusche vorgesehen.

Für die Heimbewohner besteht je Geschoß ebenfalls in den Teeküchen bzw. Kochstellen die Möglichkeit der individuellen Versorgung. Im Sozialtrakt kann an einer Gemeinschaftspflege teilgenommen werden.

Im Untergeschoß sind verschiedene Beschäftigungsräume zur Betätigung der Heimbewohner vorgesehen.


#### Medizinische Einrichtungen


Für die 176 Heimbewohner ist im Untergeschoß eine medizinische Betreuung, bestehend aus Aufnahme, Sprechzimmer und 3 Behandlungsräumen einzurichten.

Im übrigen wird auf den bautechnischen Erläuterungsbericht verwiesen.

Halle/S., den 18.08.1980

VEB Projektierung und Technologie Halle  
Kombinatsbetrieb des VEB WBK Halle  
Produktionsbereich 2

  
Hermann  
i. A. der Schutz-  
gutekommission

  
Paatz  
Leitarchitekt

g Kapazitätssachver

Projekt: Feierabendheim mit Pflegestation  
 Bettenhaus 176 Plätze  
Projekt-Nr. 521-2205-07

## K A P A Z I T Ä T S N A C H W E I S

### Zusammenstellung der Einzelflächen

#### 1. Pflegestation

|                   |             |                            |
|-------------------|-------------|----------------------------|
| 1.1 Einbettzimmer | Wohnraum    | 11,05 m <sup>2</sup>       |
|                   | Sanitärraum | 2,04 "                     |
|                   | Flur        | 2,40 "                     |
|                   | Loggia 1/4  | 0,95 "                     |
|                   |             | <u>16,44 m<sup>2</sup></u> |
|                   |             | =====                      |

|                    |             |                            |
|--------------------|-------------|----------------------------|
| 1.2 Zweibettzimmer | Wohnraum    | 15,14 m <sup>2</sup>       |
|                    | Sanitärraum | 2,04 "                     |
|                    | Flur        | 2,40 "                     |
|                    | Loggia 1/4  | 0,95 "                     |
|                    |             | <u>20,53 m<sup>2</sup></u> |
|                    |             | =====                      |

|                    |            |                            |
|--------------------|------------|----------------------------|
| 1.3 Zweibettzimmer | Wohnraum   | 15,76 m <sup>2</sup>       |
|                    | Loggia 1/4 | 0,95 "                     |
|                    |            | <u>16,71 m<sup>2</sup></u> |
|                    |            | =====                      |

|                    |             |                            |
|--------------------|-------------|----------------------------|
| 1.4 Isolierstation | Wohnraum    | 11,05 m <sup>2</sup>       |
|                    | Sanitärraum | 2,04 "                     |
|                    | Flur        | 2,40 "                     |
|                    | Loggia 1/4  | 0,95 "                     |
|                    |             | <u>16,44 m<sup>2</sup></u> |
|                    |             | =====                      |

#### 1.5 Gemeinschafts- u Stationsräume

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Gemeinschaftsraum   | 26,65 m <sup>2</sup> |
| Teeküche            | 19,85 "              |
| Stationszimmer      | 19,85 "              |
| Spülraum            | 18,88 "              |
| Kleines Bad         | 19,64 "              |
| Großes Bad          | 19,95 "              |
| WC-Personal u. Müll | 19,82 "              |
| Wirtschaftsraum     | 11,75 "              |

#### 1.6 Verkehrsflächen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Flure                    |                             |
| Treppen                  |                             |
| Verteilerhalle insgesamt | <u>150,52 m<sup>2</sup></u> |
|                          | =====                       |

- 2 -

2 Feierabendstation

|     |                |             |                            |
|-----|----------------|-------------|----------------------------|
| 2 1 | Einbettzimmer  | Wohnraum    | 11,05 m <sup>2</sup>       |
|     |                | Sanitärraum | 2,04 "                     |
|     |                | Flur        | 2,40 "                     |
|     |                | Loggia 1/4  | 0,95 "                     |
|     |                |             | <u>16,44 m<sup>2</sup></u> |
|     |                | =====       |                            |
| 2 2 | Zweibettzimmer | Wohnraum    | 15,14 m <sup>2</sup>       |
|     |                | Sanitärraum | 2,04 "                     |
|     |                | Flur        | 2,40 "                     |
|     |                | Loggia 1/4  | 0,95 "                     |
|     |                |             | <u>20,53 m<sup>2</sup></u> |
|     |                | =====       |                            |

## 2 3 Gemeinschafts- und Stationsräume

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Gemeinschaftsraum  | 20,65 m <sup>2</sup> |
| Teeküche           | 19,85 "              |
| Personalraum       | 10,85 "              |
| Spülraum           | 18,88 "              |
| Kleines Bad        | 19,64 "              |
| Großes Bad         | 19,95 "              |
| WC Personal u Mull | 19,82 "              |
| Wirtschaftsraum    | 11,75 "              |

## 2.4 Verkehrsflächen

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Flure          |                             |
| Treppen        |                             |
| Verteilerhalle | insgesamt                   |
|                | <u>150,52 m<sup>2</sup></u> |
|                | =====                       |

3. Untergeschoß

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Med. Betreuung Aufnahme                              | 15,76 m <sup>2</sup> |
| " " Behandlung 1                                     | 15,76 "              |
| " " Behandlung 2                                     | 16,37 "              |
| " " Behandlung 3                                     | 15,76 "              |
| Abstellraum Rollstühle                               | 20,46 "              |
| Lager                                                | 20,46 "              |
| Anschlußraum Elt                                     | 20,46 "              |
| " Wasser                                             | 20,46 "              |
| Hausanschlusstation Heizung                          | 41,24 "              |
| Lager Schmutzwasser                                  | 20,46 "              |
| Lager Sauberwasser                                   | 20,46 "              |
| Müll-Abfälle                                         | 20,46 "              |
| Personalraum                                         | 20,46 "              |
| Personal-Waschraum                                   | 19,31 "              |
| Beschäftigungsraum 1-2 und 3 je 20,46 m <sup>2</sup> | 61,38 "              |



- 3 -

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Waschraum                       | 20,46 m <sup>2</sup>        |
| Trockenraum                     | 20,46 "                     |
| Wah- und Bügelraum              | 20,46 "                     |
| Raum für Leichen                | 20,46 "                     |
| Nachlaßraum                     | 20,46 "                     |
| Hausmeisterwerkstatt und Lager  | 49,11 "                     |
| 3 Räume je 16,37 m <sup>2</sup> | <u>500,67 m<sup>2</sup></u> |
|                                 | =====                       |

## 3 1 Verkehrsflächen

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Flure    | 114,75 m <sup>2</sup>       |
| Treppen  | 22,83 "                     |
| Eingänge | 66,58 "                     |
|          | <u>204,16 m<sup>2</sup></u> |
|          | =====                       |

## 4 6 Obergeschoß

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Vorraum              | 17,70 m <sup>2</sup>       |
| Aufzugsmaschinenraum | 31,92 "                    |
| Techn. Raum          | 24,82 "                    |
|                      | <u>74,44 m<sup>2</sup></u> |
|                      | =====                      |

Zusammenstellung der Geschoßflächen

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Untergeschoß                     | 705,34 m <sup>2</sup>         |
| 1. Obergeschoß Pflegestation     | 705,86 "                      |
| 2. Obergeschoß "                 | 705,86 "                      |
| 3. Obergeschoß "                 | 705,86 "                      |
| 4. Obergeschoß Feierabendstation | 699,32 "                      |
| 5. Obergeschoß "                 | 699,32 "                      |
| 6. Obergeschoß                   | 74,44 "                       |
|                                  | <u>4.296,00 m<sup>2</sup></u> |
|                                  | =====                         |

Plätze Pflegestation

|                |                                        |   |                      |
|----------------|----------------------------------------|---|----------------------|
| 1. Obergeschoß | 6 Einbettzimmer à 16,44 m <sup>2</sup> | = | 96,64 m <sup>2</sup> |
|                | 2 Zweibettzimmer à 16,71 "             | = | 33,42 "              |
|                | 13 " à 20,53 "                         | = | 266,89 "             |
|                | = 36 Plätze                            |   |                      |
| 2. Obergeschoß | 6 Einbettzimmer à 16,44 m <sup>2</sup> | = | 98,64 m <sup>2</sup> |
|                | 2 Zweibettzimmer à 16,71 "             | = | 33,42 "              |
|                | 13 Zweibettzimmer à 20,53 "            | = | 266,89 "             |
|                | = 36 Plätze                            |   |                      |

- 4 -

|                |                   |                        |   |                      |
|----------------|-------------------|------------------------|---|----------------------|
| 3. Obergeschoß | 6 Einbettzimmer   | à 16,44 m <sup>2</sup> | = | 98,64 m <sup>2</sup> |
|                | 2 Zweibettzimmer  | à 16,71 "              | = | 33,42 "              |
|                | 13 Zweibettzimmer | a 20,53 "              | = | 266,89 "             |
| = 36 Plätze    |                   |                        |   |                      |

Drei Pflegestationen mit insgesamt

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 18 Einbettzimmer  | = 18 Plätze       |
| 45 Zweibettzimmer | = 90 Plätze       |
|                   | <u>108 Plätze</u> |
|                   | =====             |

Plätze Feierabendstation

|                |                   |                        |   |                       |
|----------------|-------------------|------------------------|---|-----------------------|
| 4. Obergeschoß | 8 Einbettzimmer   | a 16,44 m <sup>2</sup> | = | 131,52 m <sup>2</sup> |
|                | 13 Zweibettzimmer | à 20,53 "              | = | 266,89 "              |
| = 34 Plätze    |                   |                        |   |                       |

|                |                   |                        |   |                       |
|----------------|-------------------|------------------------|---|-----------------------|
| 5. Obergeschoß | 8 Einbettzimmer   | à 16,44 m <sup>2</sup> | = | 131,52 m <sup>2</sup> |
|                | 13 Zweibettzimmer | a 20,53 "              | = | 266,89 "              |
| = 34 Plätze    |                   |                        |   |                       |

Zwei Feierabendstationen mit insgesamt

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 16 Einbettzimmer  | = 16 Plätze      |
| 26 Zweibettzimmer | = 52 Plätze      |
|                   | <u>68 Plätze</u> |
|                   | =====            |

Gesamtkapazität

|                   |                        |                                 |
|-------------------|------------------------|---------------------------------|
| 34 Einbettzimmer  | à 16,44 m <sup>2</sup> | = 558,96 m <sup>2</sup>         |
| 6 Zweibettzimmer  | à 16,71 "              | = 100,26 "                      |
| 65 Zweibettzimmer | à 20,53 "              | = 1.334,45 m <sup>2</sup>       |
| <u>105 Zimmer</u> |                        | <u>= 1.993,67 m<sup>2</sup></u> |
|                   |                        | =====                           |

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| = 108 plus 68 | = 176 Plätze                  |
|               | =====                         |
|               | = 11,33 m <sup>2</sup> /Platz |

10 Scheides bei Informationspreiselt

Bauvorhaben    Feierabendheim mit Pflegestation  
                         176 Plätze  
                         Bettenhaus und Sozialtrakt

Projekt-Vr.    521-2205-07/17

Schilder- und Informationsprojekt

Bettenhaus Untergeschoß

| Türnummer | Aufschrift        |
|-----------|-------------------|
| 001       | Sprechzimmer      |
| 002       | Behandlung        |
| 003       | -                 |
| 004       | Betreten verboten |
| 005       | Betreten verboten |
| 006       | -                 |
| 007       | -                 |
| 008       | Personal          |
| 009       | Beschäftigung 1   |
| 010       | Beschäftigung 2   |
| 011       | Hausmeister       |
| 012       | -                 |
| 013       | -                 |
| 014       | Beschäftigung 4   |
| 015       | Nähen u. Bügeln   |
| 016       | Trockenraum       |
| 017       | Waschraum         |
| 018       | WC                |
| 019       | Abfälle           |
| 020       | Betreten verboten |
| 021       | -                 |

2 Schilder "Medizinische Betreuung"

1 Schild "Durchgang verboten"

4 Schilder "Fluchtweg"

1 Schild "Nur für Heimbewohner"

# Bettenhaus 1 Obergeschoß

| Türnummer  | Aufschrift             |
|------------|------------------------|
| 101        | mit einer Namensleiste |
| 102        | -                      |
| 103        | -                      |
| 104        | mit einer Namensleiste |
| 105        | mit zwei Namensleisten |
| 106        | " "                    |
| 107        | " " "                  |
| 108        | Téeküche               |
| 109        | Schwesternzimmer       |
| 110        | Abfälle                |
| 111        | Spülraum               |
| 112        | Bad                    |
| 113        | Bad                    |
| 114        | mit zwei Namensleisten |
| 115        | mit einer Namensleiste |
| 116        | " "                    |
| 117        | mit zwei Namensleisten |
| 118        | " " "                  |
| 119        | " "                    |
| 120        | " " "                  |
| 121        | " "                    |
| 122        | " " "                  |
| 123        | " " "                  |
| 124        | " " "                  |
| 125        | " " "                  |
| 126        | " " "                  |
| 127        | " " "                  |
| 128        | Wirtschaftsraum        |
| 1 Schild   | "Isolierzimmer"        |
| 1 Schild   | "Wohnbereich 1"        |
| 4 Schilder | "Fluchtweg"            |

## Bettenhaus 2. Obergeschoß

| Türnummer  | Aufschrift             |
|------------|------------------------|
| 201        | mit einer Namensleiste |
| 202        | " " "                  |
| 203        | " " "                  |
| 204        | " " "                  |
| 205        | mit zwei Namensleisten |
| 206        | " " "                  |
| 207        | " " "                  |
| 208        | Teeküche               |
| 209        | Schwesternzimmer       |
| 210        | Abfälle                |
| 211        | Spülraum               |
| 212        | Bad                    |
| 213        | Bad                    |
| 214        | mit zwei Namensleisten |
| 215        | " " "                  |
| 216        | " " "                  |
| 217        | " " "                  |
| 218        | " " "                  |
| 219        | " " "                  |
| 220        | " " "                  |
| 221        | " " "                  |
| 222        | " " "                  |
| 223        | " " "                  |
| 224        | " " "                  |
| 225        | " " "                  |
| 226        | " " "                  |
| 227        | " " "                  |
| 228        | Virtuosa-Raum          |
| 1 Schild   | "Wohnbereich 2"        |
| 4 Schilder | "Fluchtweg"            |

## Bettenhaus 3. Obergeschoß

Türnummer und Aufschrift analog wie 2. Obergeschoß jedoch mit 300-erNr.

- 1 Schild "Wohnbereich 3"
- 4 Schilder "Fluchtweg"

#### Bettenhaus 4 Obergeschoß

| Türnummer              | Aufschrift             |
|------------------------|------------------------|
| 401 - 404              | mit einer Namensleiste |
| 405 - 407              | mit zwei Namensleisten |
| 408                    | Teeküche               |
| 409                    | Schwesternzimmer       |
| 410                    | Abfalle                |
| 411                    | Spulraum               |
| 412                    | Bad                    |
| 413                    | Bad                    |
| 414 - 417              | mit einer Namensleiste |
| 418 - 427              | mit zwei Namensleisten |
| 428                    | Wirtschaftsraum        |
| 1 Schild Wohnbereich 4 |                        |
| 4 Schilder 'Fluchtweg  |                        |

#### Bettenhaus 5 Obergeschoß

Türnummer und Aufschrift analog wie 4 Obergeschoß,  
jedoch mit 500-er Nummern

- 1 Schild "Wohnbereich 5"
- 4 Schilder "Fluchtweg"



### Sozialtrakt Erdgeschoß

| <u>Türnummer</u> | <u>Aufschrift</u>   |
|------------------|---------------------|
| 1                | Verwaltung          |
| 2                | Sekretariat         |
| 3                | Heimleiter          |
| 4                | Verwaltung          |
| 5                | Personal            |
| 6                | WC-Männer           |
| 7                | Personal-Männer     |
| 8                | Personal-Frauen     |
| 9                | WC-Frauen           |
| 10               | Gymnastikraum       |
| 11               | Clubraum            |
| 12               | Speisesaal          |
| 13               | WC-Männer           |
| 14               | WC-Frauen           |
| 15 - 28          | (Nur als Türnummer) |

### Sozialtrakt Kellergeschoß

| <u>Türnummer</u> | <u>Aufschrift</u> |
|------------------|-------------------|
| 50               | Technik           |
| 51               | Technik           |
| 52               | Technik           |
| 53               | Lager             |
| 54               | Lager             |
| 55               | Technik           |
| 56               | Lager             |
| 57               | Lager             |

### **Sozialtrakt insgesamt:**

1 Informationsschild

"Zu den Wohnbereichen"

4 Schilder "Fluchtweg"

1 Schild "Symbol Telefonzelle"

## Zusammenstellung der erforderlichen Schilder

### - Bettenhaus -

#### 1 Türschilder

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| 1.1 Nur mit Zimmernummer               | = 8 Stck |
| 1.2 Zimmernummer und Aufschrift        | = 50 "   |
| 1.3 Zimmernummer und eine Namensleiste | = 32 "   |
| 1.4 " und zwei "                       | = 71 "   |

#### 2 Hinweisschilder

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| 2.1 Medizinische Betreuung | = 2 Stck |
| 2.2 Durchgang verboten     | = 1 "    |
| 2.3 Nur für Heimbewohner   | = 1 "    |
| 2.4 Isolierzimmer          | = 1 "    |
| 2.5 Wohnbereich 1,2,3,4,5  | = 5 "    |
| 2.6 Fluchtweg              | = 24 "   |

### - Sozialtrakt -

#### 3 Türschilder

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 3.1 Nur mit Zimmernummer        | = 14 Stck. |
| 3.2 Zimmernummer mit Aufschrift | = 22 "     |

#### 4 Hinweisschilder

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 4.1 Zu den Wohnbereichen | = 1 Stck. |
| 4.2 Symbol Telefonzelle  | = 1 "     |
| 4.3 Fluchtweg            | = 4 "     |

## Hersteller

Die Lieferung und Montage erfolgt durch Knut Müller,  
4020 Halle/S.  
Bernburger Str. 30

VEB Projektierung und Technologie Halle  
Kombinatsbetrieb des VEB WBK Halle  
Produktionsbereich 2

*Naue*  
Naue  
Brigadeleiter

*Paatz*  
Paatz  
Leitarchitekt

11 In den Leuchtschlössen

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Bauvorhaben</u> | Ferienabendheim mit Pflegestation<br>176 Plätze<br>Bettenhaus und Sozialtrakt |
| <u>Projekt-Nr</u>  | 521-2205-07/17                                                                |

- Sicherheitsschlosser -

1 Bettenhaus

1 1 Untergeschoß

Sprechzimmer

## Behandlung

## Sauberwäsche

## Schmutzwäsche

## Schleuseneingang

kaum für Leichen

HA-Station

# Elektro-Anschlußraum

# Wasser-Anschlußraum

## 4 Eingänge

# Wirtschaftsraum

= 14 Sicherheitsschlösser

1 2 1 Obergeschoß

21 Bettenzimmer

Stationszimmer

## Wirtschaftsraum

= 23 Sicherheitsschlossser

### 1.3 2. Obergeschoß

## 21 Bettenzimmer

## Stationszimmer

## Wirtschaftsraum

= 23 Sicherheitsschlösser

### 1.4 3. Obergeschoß

## 21 Bettenzimmer

# Stationszimmer

## Wirtschaftsraum

## = 23 Sicherheitsschlösser

2 2 Keller- und Geschos

Gemüse-Obstlager

Nahrungsmittellager

Konservenlager

Fügenbedarf Wasche

= 4 Sicherheitsschlosser

3 Zusammenfassung

Bettenhaus

= 130 Sicherheitsschlösser

Sozialtrakt

= 24 Sicherheitsschlösser

Halle/S , den 19 o2 1981

VEB Projektierung und Technologie Halle  
Kombinatsbetrieb des VEB WBK Halle  
Produktionsbereich 2

*Gaue*  
Gaue  
Brigadeleiter


*Faatz*  
Faatz  
Leitarchitekt

12 fehlt

13 Zeichnungen ausser






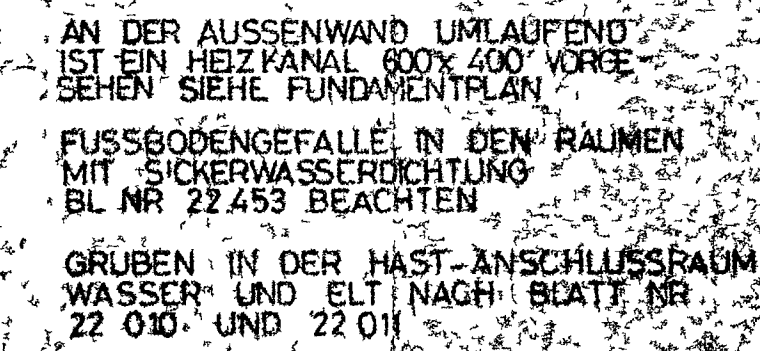

|                                                                                    |            |                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>CELESTRAK (KUNST) FÜR TECHNOLOGIE</b><br>GUTENDECK 747/748 WASSERFURCHENSTRASSE |            | STR. SURENHEIT<br>CLASS        | PECT. TOTAL<br>521 - 2205 07 |
| <b>FEIERABENDHEIM/ PFLEGESTATION<br/>         BETTENHAUS 176 PL</b>                |            | COPIES COPY<br>V. 555 AB 1-100 | PROKTRPH                     |
| <b>GRUNDRISS - UNTERGESCHOSS</b>                                                   |            | NY FORM                        | GEND                         |
| DATE: 2017.07                                                                      |            | VON: 176 PL                    |                              |
| CHAIRS                                                                             | ARIC MPTHE | BEADPH                         | 22002                        |



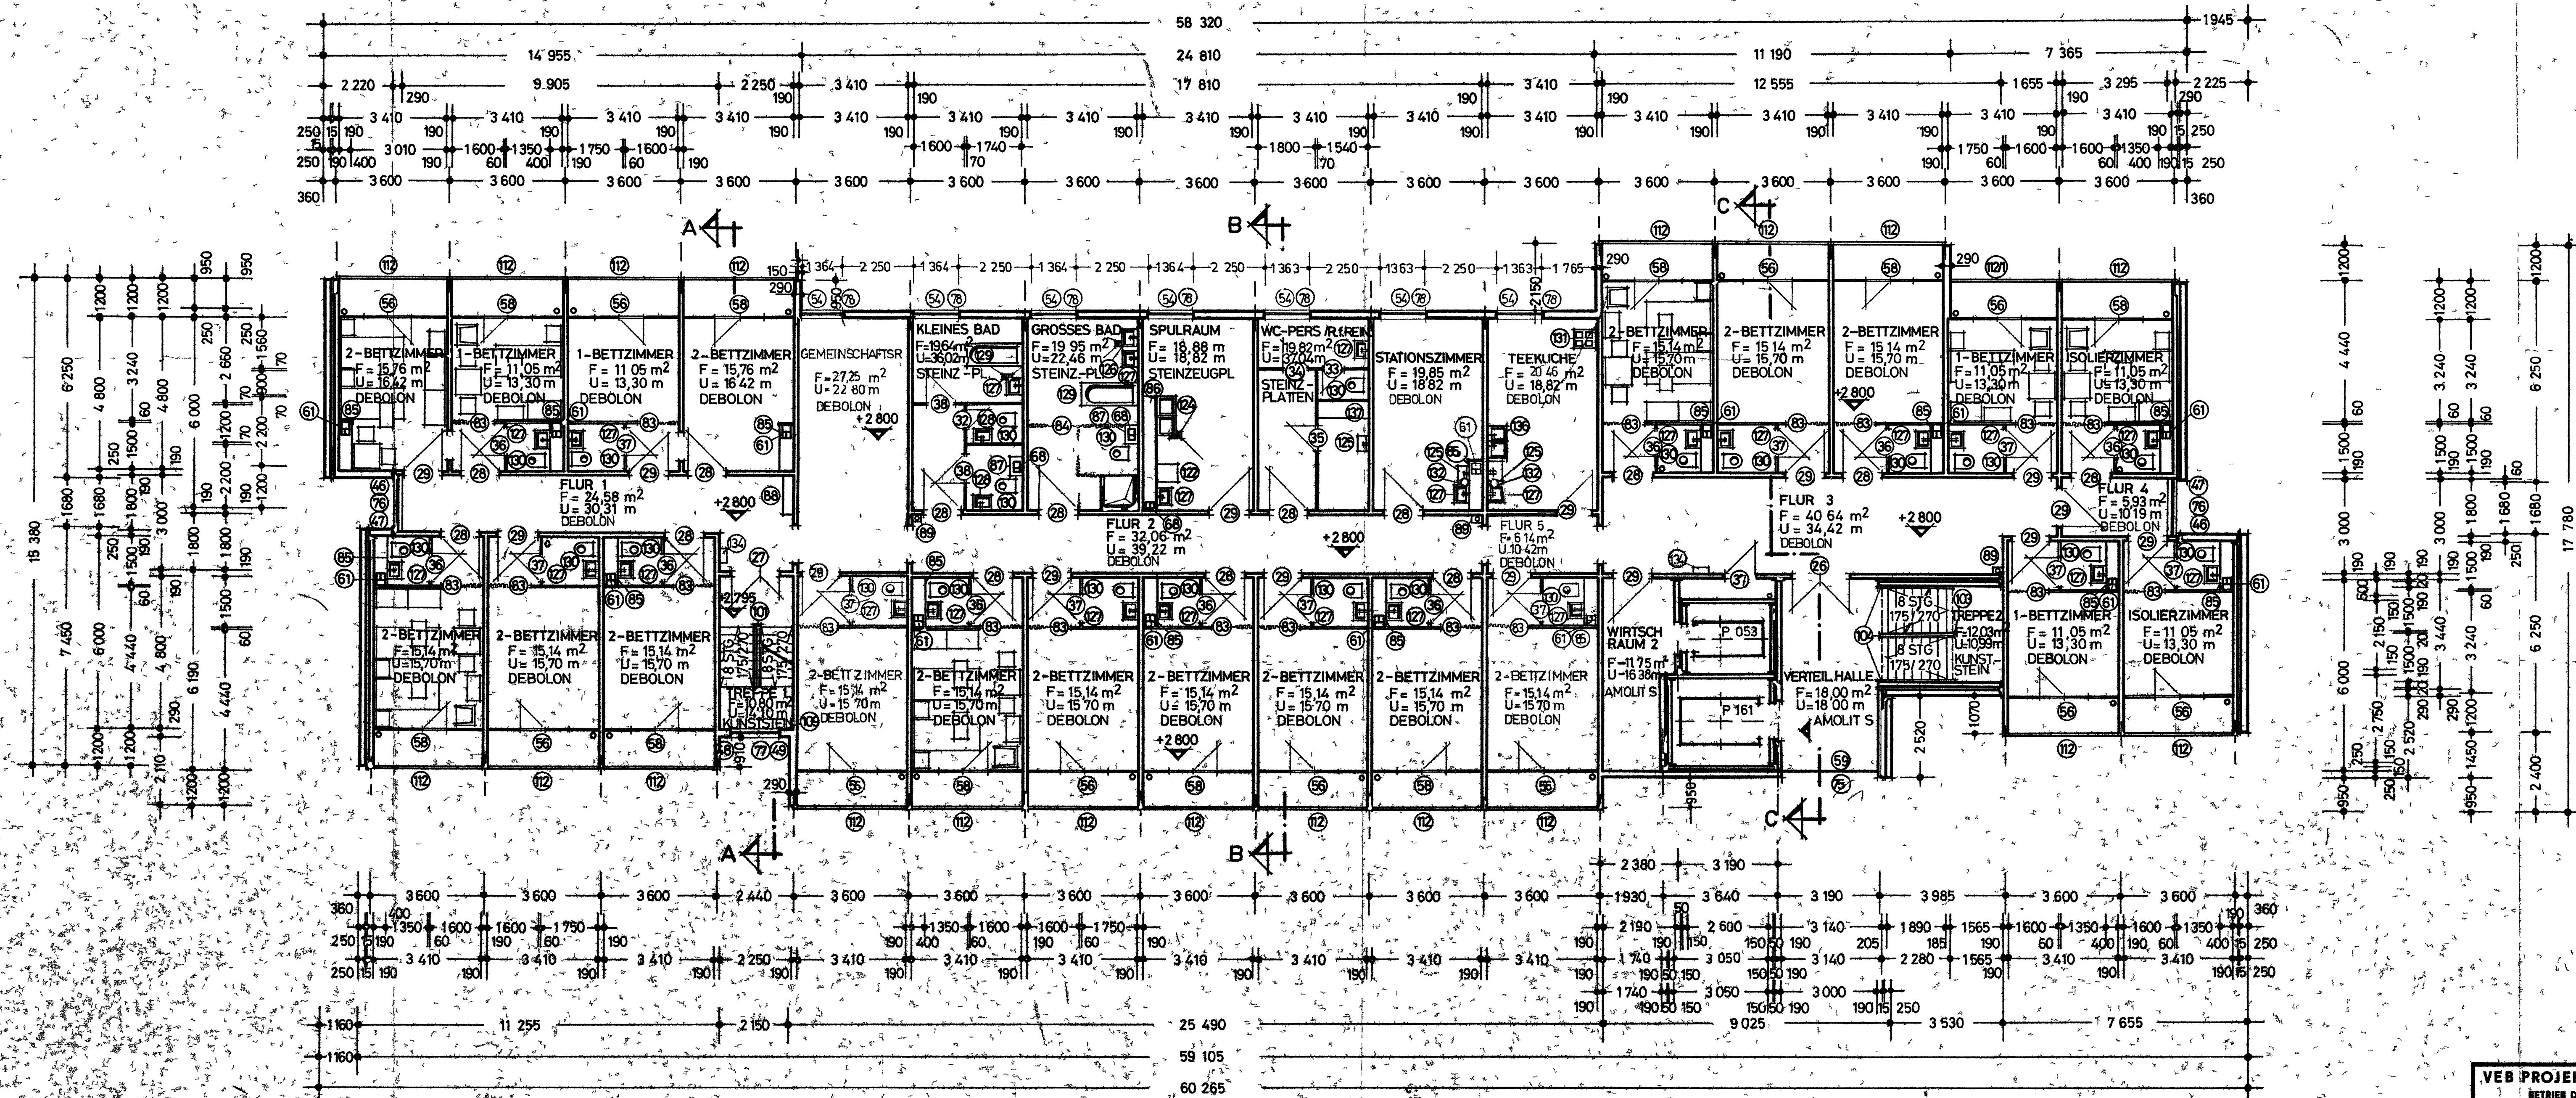

BEIM ZUSAMMENSTOSS VERSCHIEDENER  
FUSSBODENNUTZBELAGE IST JEWELNS  
EINE TRENNSCIENE EINZUBRINGEN


ALLE TREPPENHAUSTÜREN SIND MIT  
GUMMSCHLEIFER VORZUSEHEN

MAUERWERK UND  
AUSBAU-NR. 99 99 99  
HALTEGRIFFE  
SIEHE-MÖBLIERUNGSPLANE M 1' 25

AUSBAU-NR. 99 99 99  
HANDLAUFE IN DEN FLUREN  
SIEHE DETAIL BLATT-NR. 22.418

|                                                                                |  |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| VEB PROJEKTIERUNG UND TECHNOLOGIE<br>BETRIEB DES VEB WOHNUNGSBAUKOMBINAT HALLE |  | STRUKTUREINHEIT | PROJEKTR         |
| FEIERABENDHEIM/PFLEGESTATION<br>BETTENHAUS 176PL                               |  | ORG FORM        | PROJEKTEIL       |
| GRUNDRISS 1.OBERGESCHOSS PFLEGESTATION                                         |  | MASSTAB 1:100   | GERND            |
| DATUM 20.6.80                                                                  |  | BY FORM         | ERS BL NR        |
| CHEFINGENIEUR BRIGADELEITER GRUPPENLEITER BEARBEITER                           |  | 0 KONTROLLE     | BLATT NR. 22.004 |



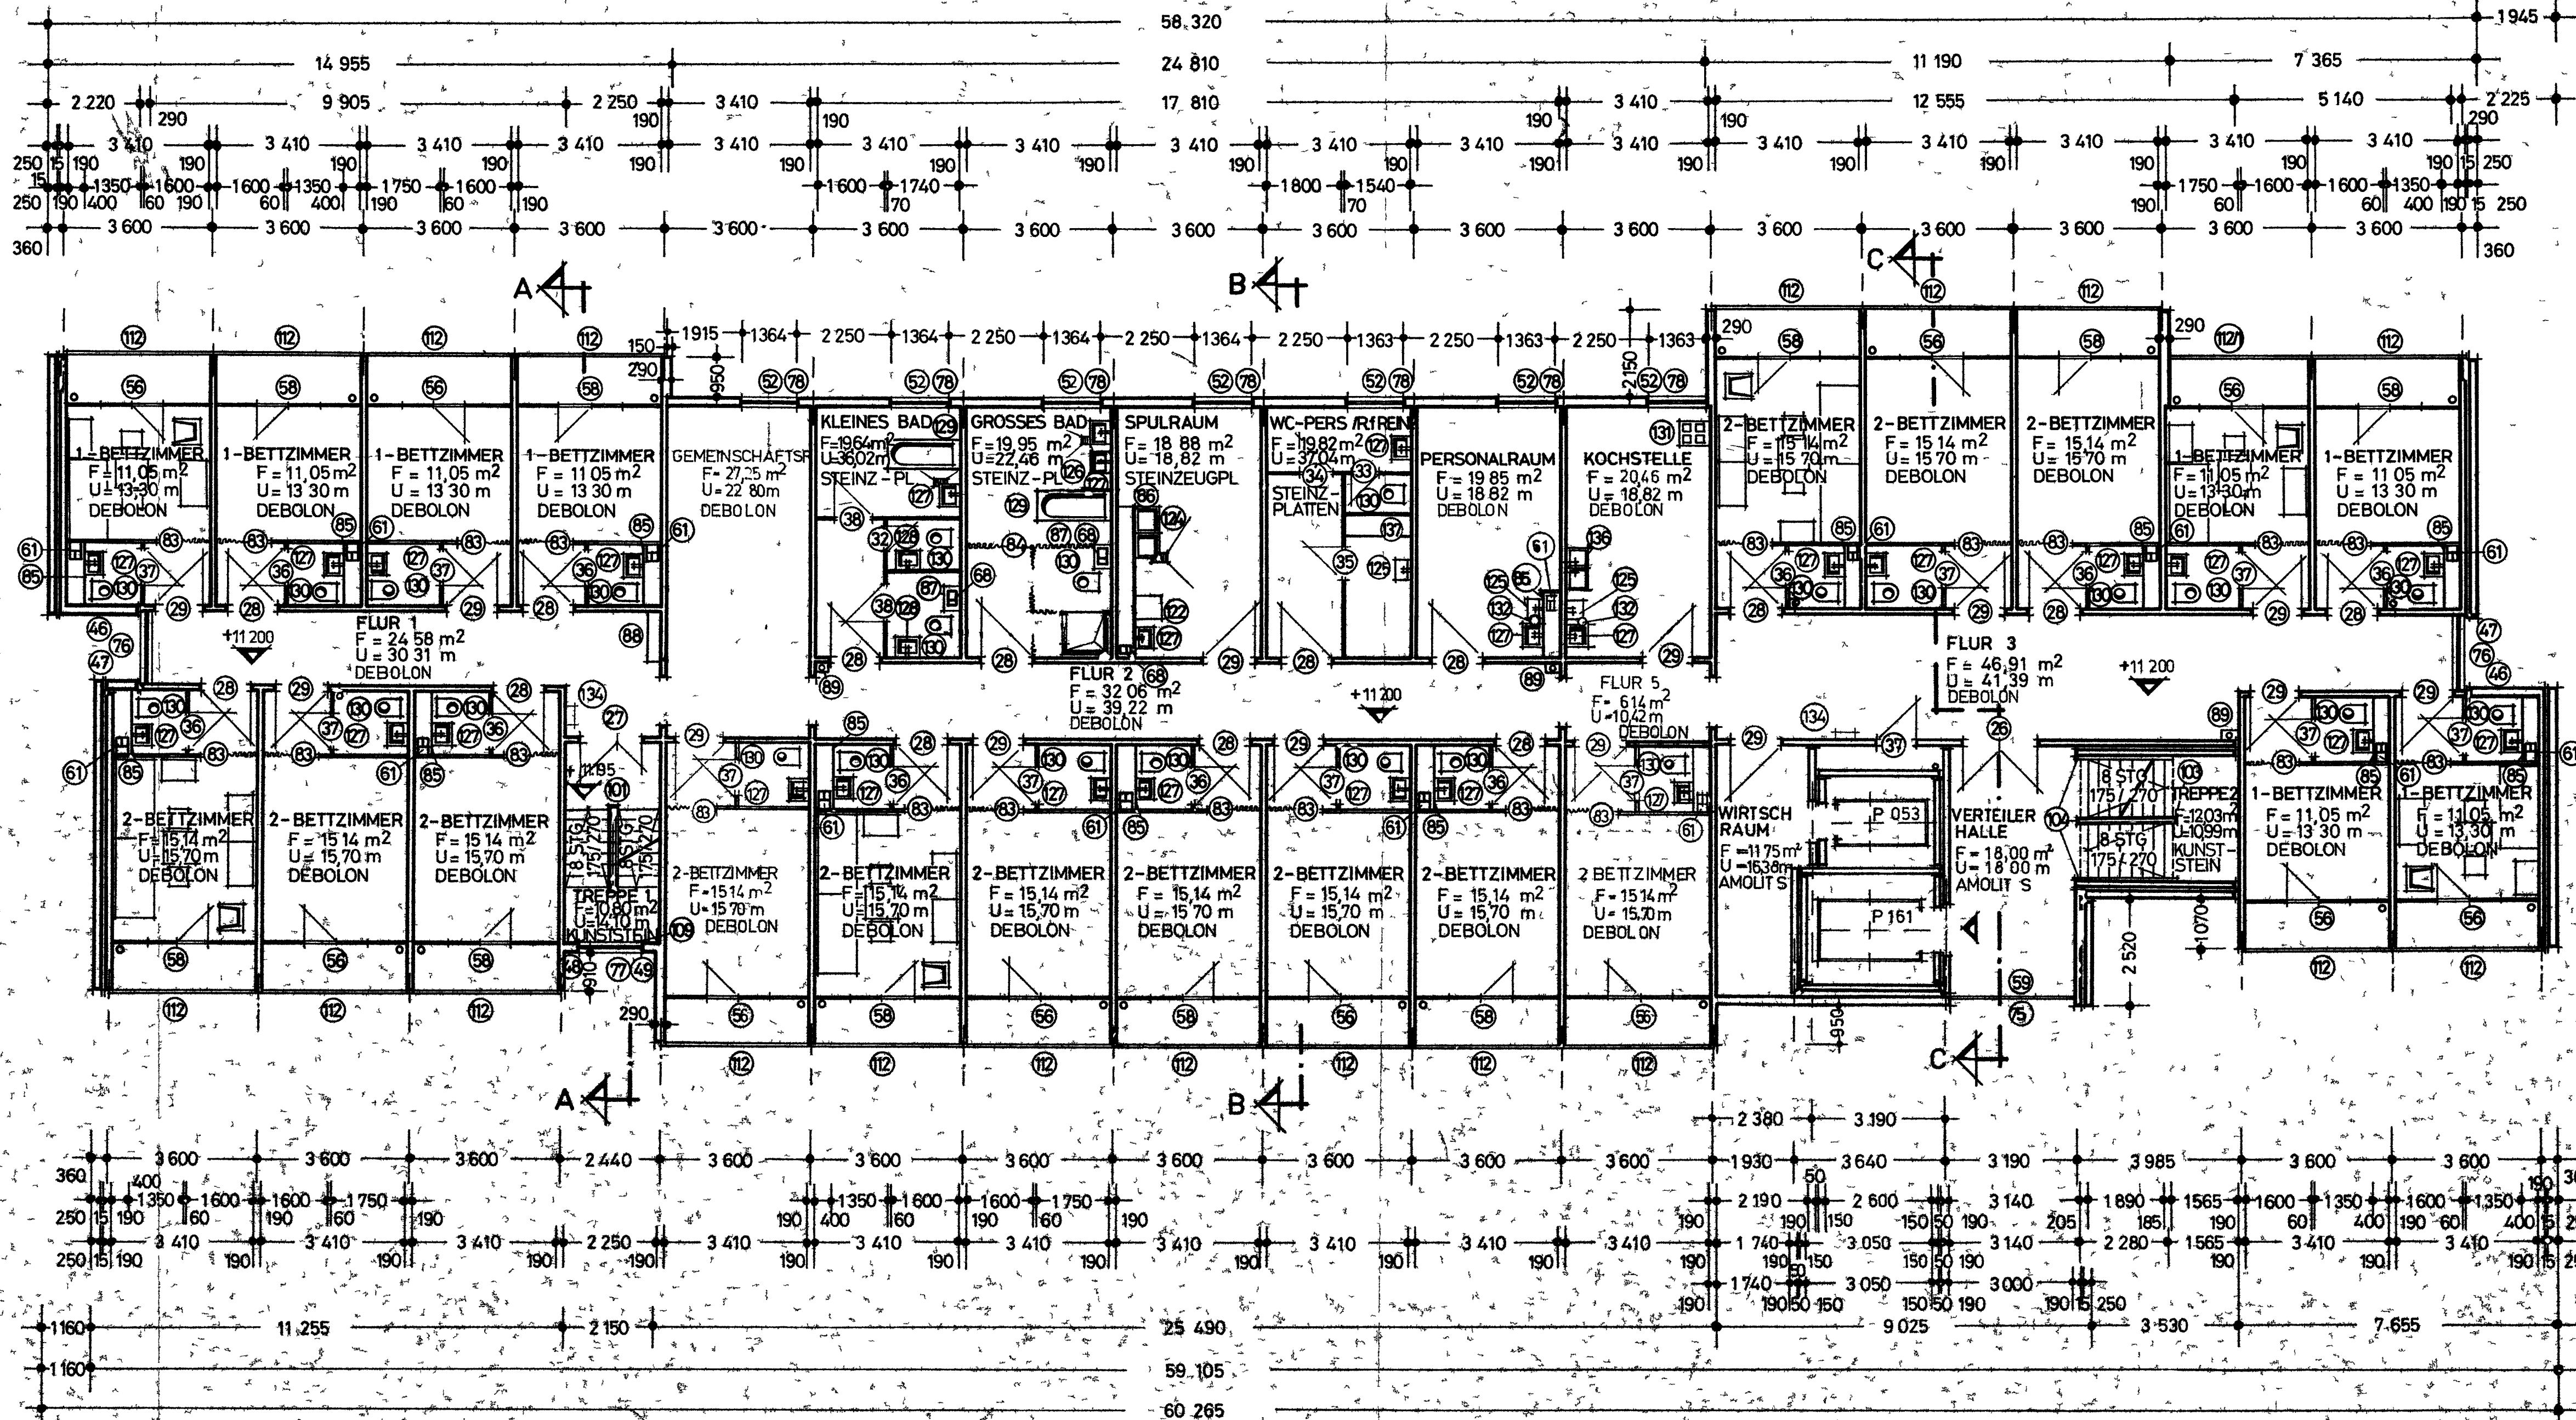

BEIM ZUSAMMENSTOSS VERSCHIEDENER  
FUSSBODENNUTZBELAGE IST JEWELS  
EINE TRENNSCHEIBE EINZUBRINGEN


MAUERWERK UND  
AUSBAU-NR. 99 99 99  
HALTEGRIFFE  
SIEHE MOBILIERUNGSPLANE M 1 25

AUSBAU-NR. 99 99 99  
HANDLAUFE IN DEN FLUREN  
SIEHE DETAIL BLATT-NR 22 418


ALLE TREPPENHAUSTUREN SIND MIT  
GUMMISCHLEIFER VORZUSEHEN

|                                           |              |                 |                |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| VEB PROJEKTIERUNG UND TECHNOLOGIE         |              | STRUKTUREINHEIT | PROJEKTNR.     |
| BETRIEB DES VEB WOHNUNGSBAUKONSUMAT HALL  |              | 521 2205-07     |                |
| FEIERABENDHEIM/PFLEGESTATION              |              | OBJ.-FORM.      | PROJEKTTEL.    |
| BETTENHAUS 176 PL.                        |              | MASSTAB 1:100   |                |
| GRUNDRISS 1. OBERGESCH. FEIERABENDSTATION |              | RV-FORM         | GEAND          |
| DATUM 30.6.90                             |              | ERS. BL. NR.    |                |
| CHEFINGENIEUR                             | BRUNDELEITER | GRUPPENLEITER   | BEARBEITER     |
|                                           |              | Q. KONTROLLE    | BLATT-NR 22007 |



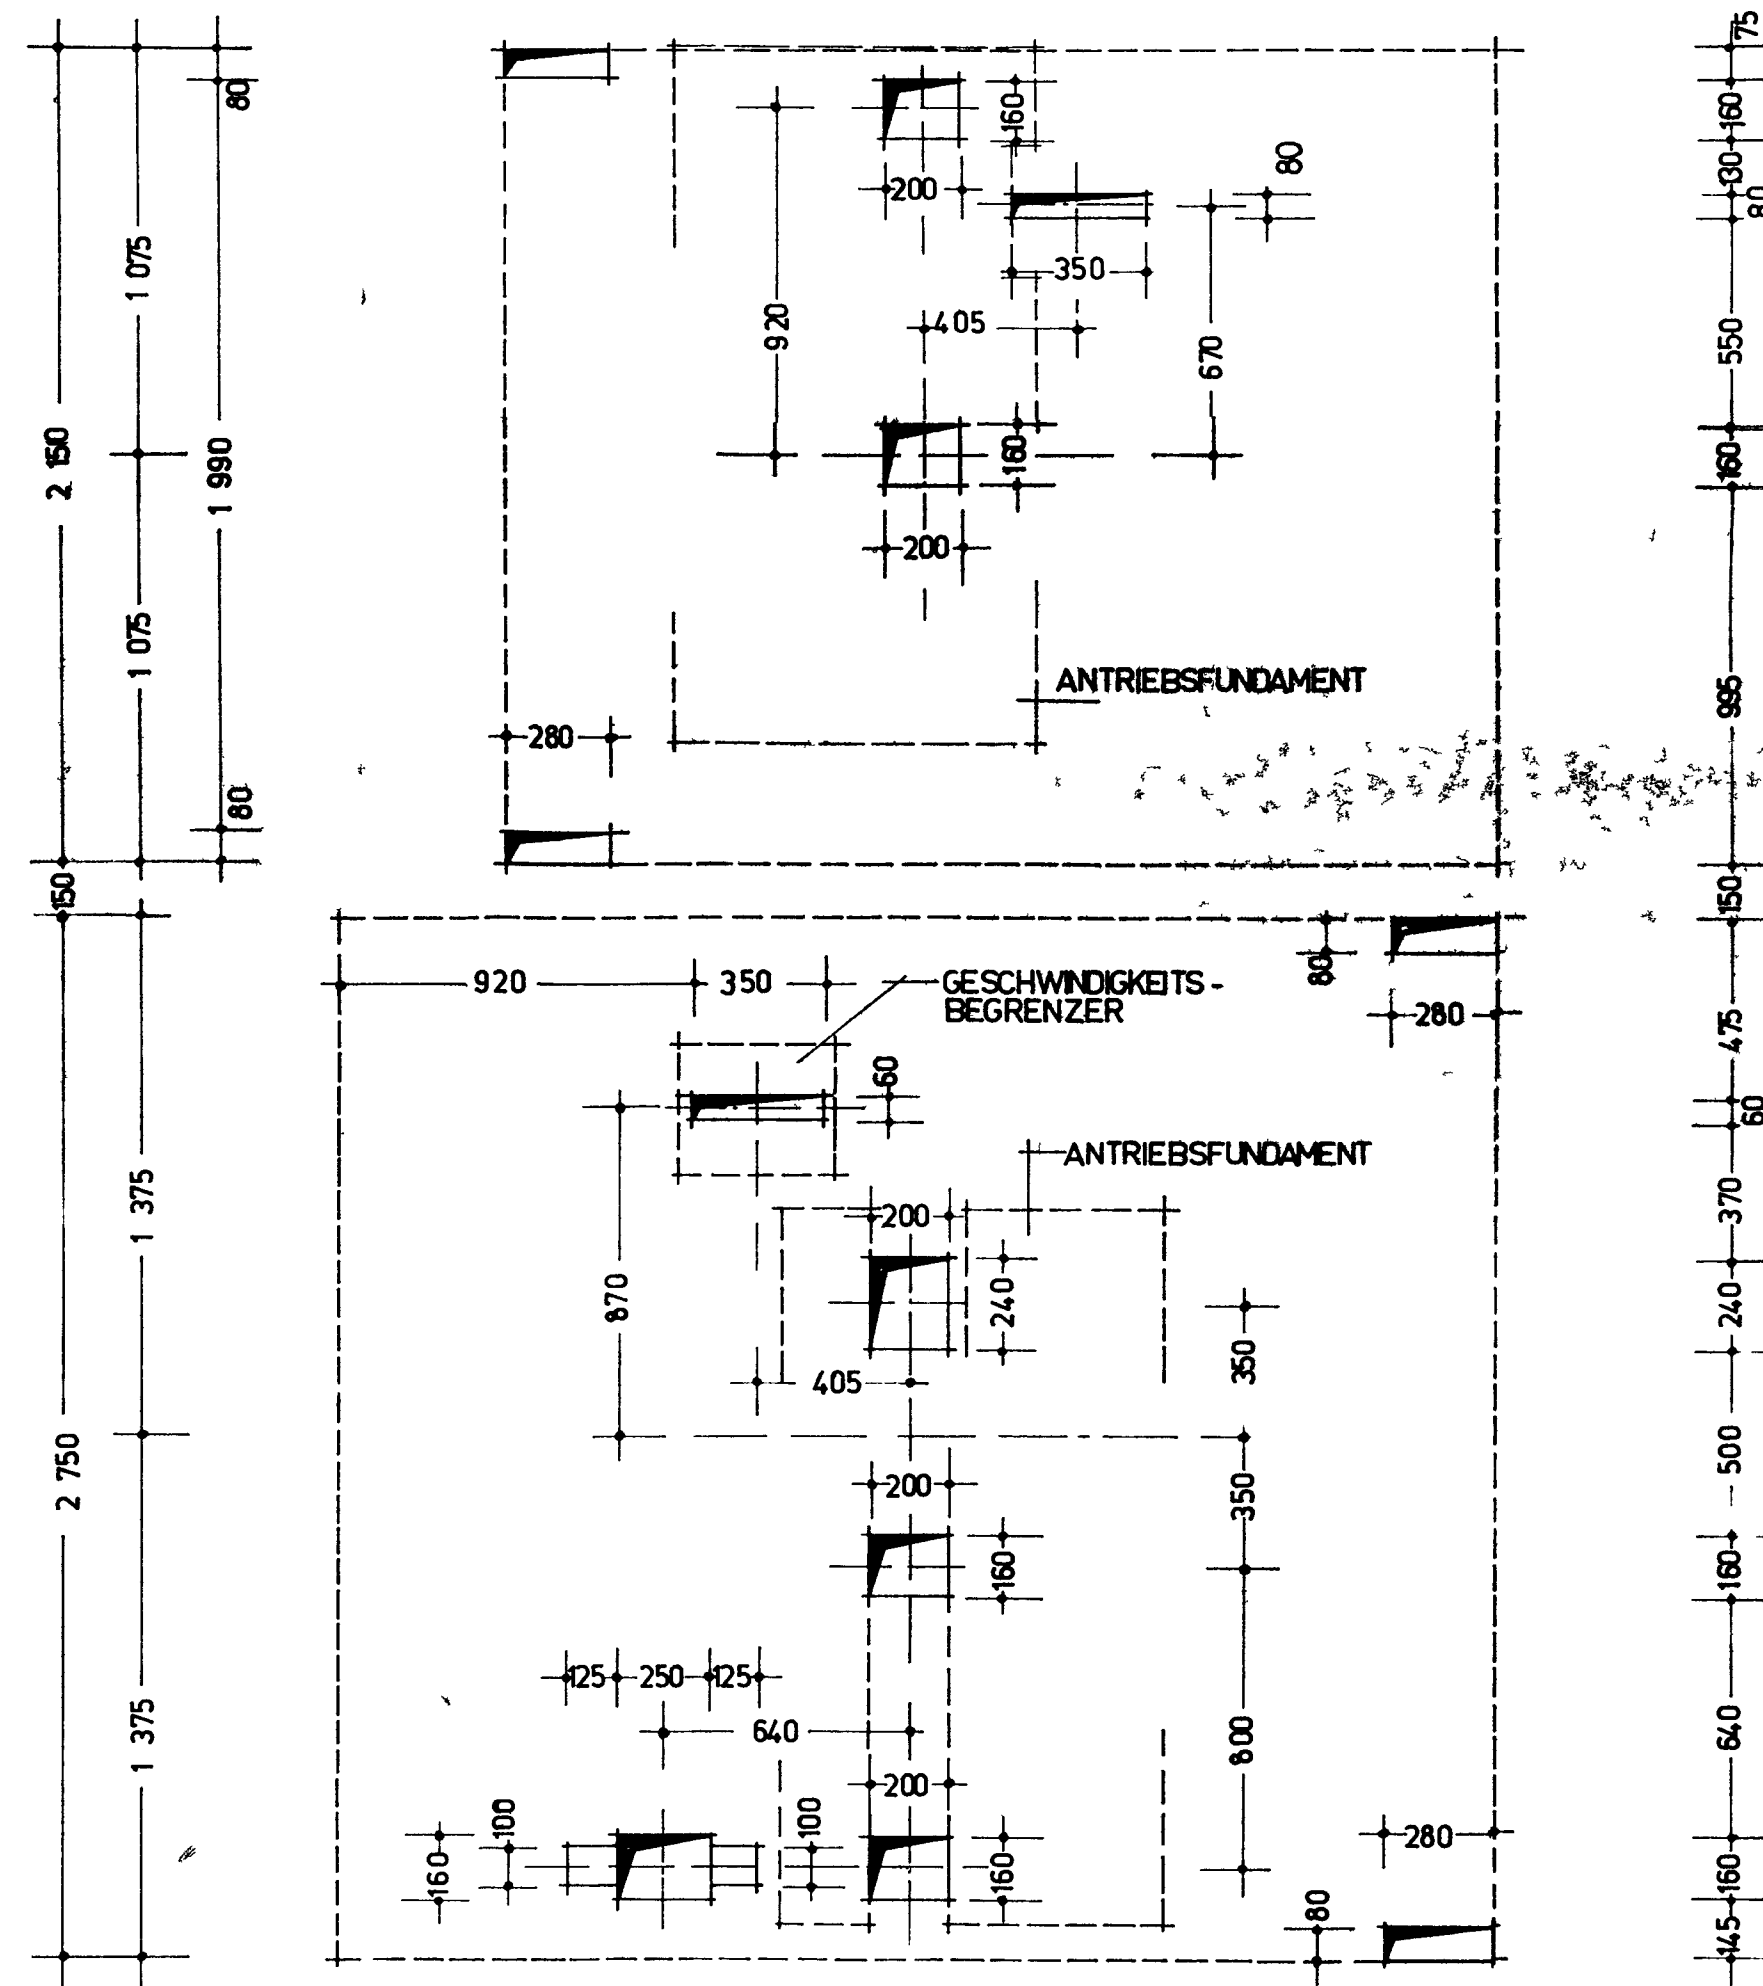


GRUNDRISS SCHACHTDECKE M 1 20



|                                                                                                     |                      |                      |                   |                        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| <b>VEB PROJEKTIERUNG UND TECHNOLOGIE</b>                                                            |                      |                      |                   | <b>STRUKTUREINHEIT</b> | <b>PROJEKTNR</b>   |
| <b>BETRIEB DES VEB WOHNUNGSBAUKOMBINAT HALLE</b>                                                    |                      |                      |                   |                        | 521 2205 07        |
| <b>FEIERABENDHEIM MIT PFLEGESTATION<br/>BETTENHAUS 176 PLATZE</b><br>6 OBERGESCHOSS<br>SCHACHTDECKE |                      |                      |                   | <b>ORIG FORM</b>       | <b>PROJEKTTEIL</b> |
|                                                                                                     |                      |                      |                   | <b>MASSTAB 1 20 50</b> |                    |
|                                                                                                     |                      |                      |                   | <b>RV FORM</b>         | <b>GEAND</b>       |
|                                                                                                     |                      |                      |                   | <b>DATUM 25 9 80</b>   | <b>ERS BL NR</b>   |
|                                                                                                     |                      |                      |                   |                        | <b>22 009</b>      |
| <b>CHEFINGENIEUR</b>                                                                                | <b>BRIGADELEITER</b> | <b>GRUPPENLEITER</b> | <b>BEARBEITER</b> | <b>G KONTROLLE</b>     | <b>BLATT NR</b>    |





DEHNUNGSFUGEN IM GEFALLEBETON  
NACH TGL 22 903 TABELLE 2 ZEILE 11  
ABSTAND DER FUGEN 3 000 x 3 000 mm


|                                                                                |  |                      |  |                                   |  |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <b>VEB PROJEKTIERUNG UND TECHNOLOGIE</b>                                       |  |                      |  | <b>STRUKTUREINHEIT</b>            |  | <b>PROJEKTNR</b><br>521-2205-07 |  |
| <b>BETRIEB DES VEB WOHNUNGSBAUKOMBINAT HALLE</b>                               |  |                      |  |                                   |  |                                 |  |
| <b>FEIERABENDHEIM PFLEGESTATION,<br/>BETTENHAUS 176 PL<br/>DACHGEFÄLLEPLAN</b> |  |                      |  | <b>ORIG FORM</b><br>MASSTAB 1 100 |  | <b>PROJEKTTITEL</b>             |  |
|                                                                                |  |                      |  | <b>RV FORM</b>                    |  | <b>GEZND</b>                    |  |
|                                                                                |  |                      |  | <b>DATUM</b> 6 11 80              |  | <b>ERS BL NR</b>                |  |
| <b>CHEFINGENIEUR</b>                                                           |  | <b>BRIGADELEITER</b> |  | <b>GRUPPENLEITER</b>              |  | <b>BEARBEITER</b>               |  |
|                                                                                |  |                      |  | <b>Q KONTROLLE</b>                |  | <b>BLATT NR. 22 102</b>         |  |



|                                                                                                          |                                                   |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 11. PROCKEN<br>12. ELASCHUBIN AT RALE<br>FEIERABENDHEM/PFLEGESTATION<br>BETTENHAUS 176 PL<br>SCHNITT C-C | 13. 75- 32 31<br>14. 1 50<br>15. 980<br>16. 22 05 | 17. 521-2205-0<br>18. 1 50<br>19. 980<br>20. 22 05 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|



# FEIERABENDNEHEIM MIT PFLEGESTATION

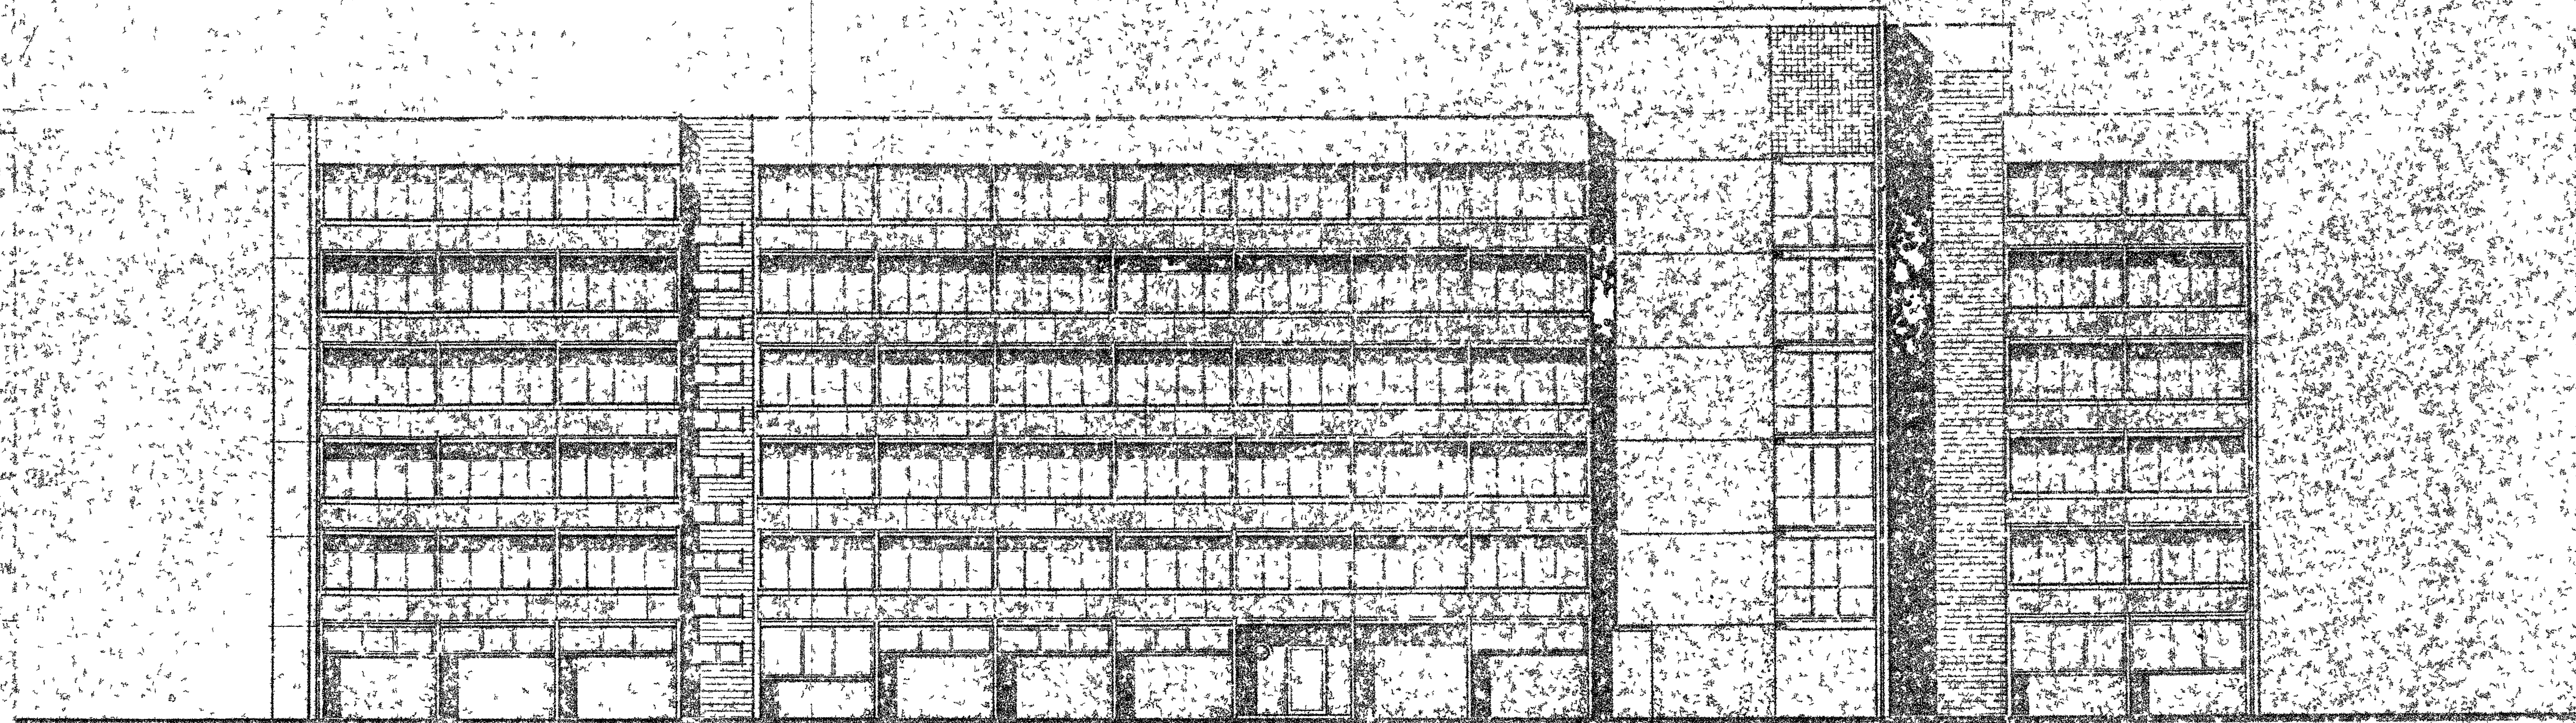

ANSCHLUSS VERBINDER ZUM  
SOZIALTRAKT

FEIERABENDNEHEIM/PFLEGESTATION  
BETTENHAUS 176 PL  
FASSADE


521-2205 07

5.6.60

22.106



# FEIERABENDNEHEIM MIT PFLEGESTATION

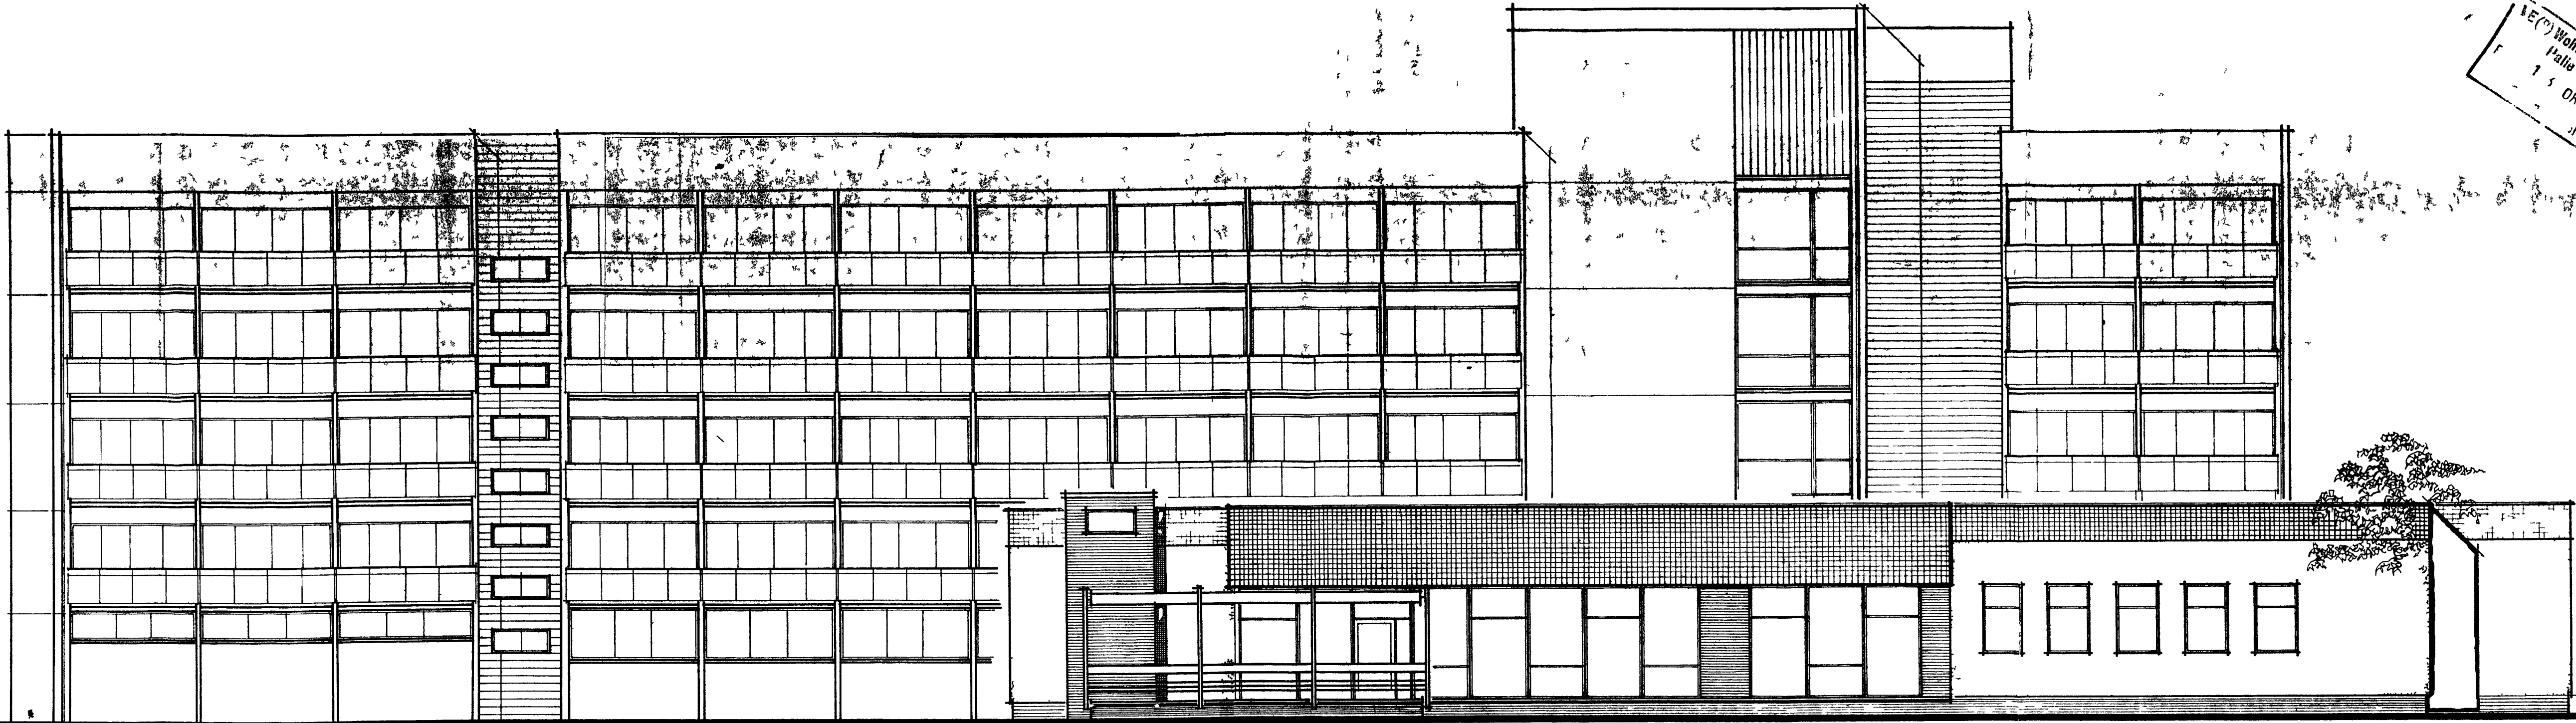


BETTENHAUS  
GEANDERT AUF  
6 GESCHOSSE

VE(2) Wohnungs-  
Palle No. 10  
1 5 OKT 10  
Grundriss

|                                                                    |           |            |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| VEB PROJEKT FÜR SOZIALTRAKT<br>BETRIEB DES VVB WERKUNG B. JACO     |           | 75 - 32 31 | 521-2205-   |
| FEIERABENDNEHEIM mit PFLEGESTATION<br>SOZIALTRAKT 176 PL<br>FASADE |           | 1 100      |             |
| CHEFINGENIEUR                                                      | ARCHITECT | GRUPPE     | BEA. BEITER |




Möbelsysteme

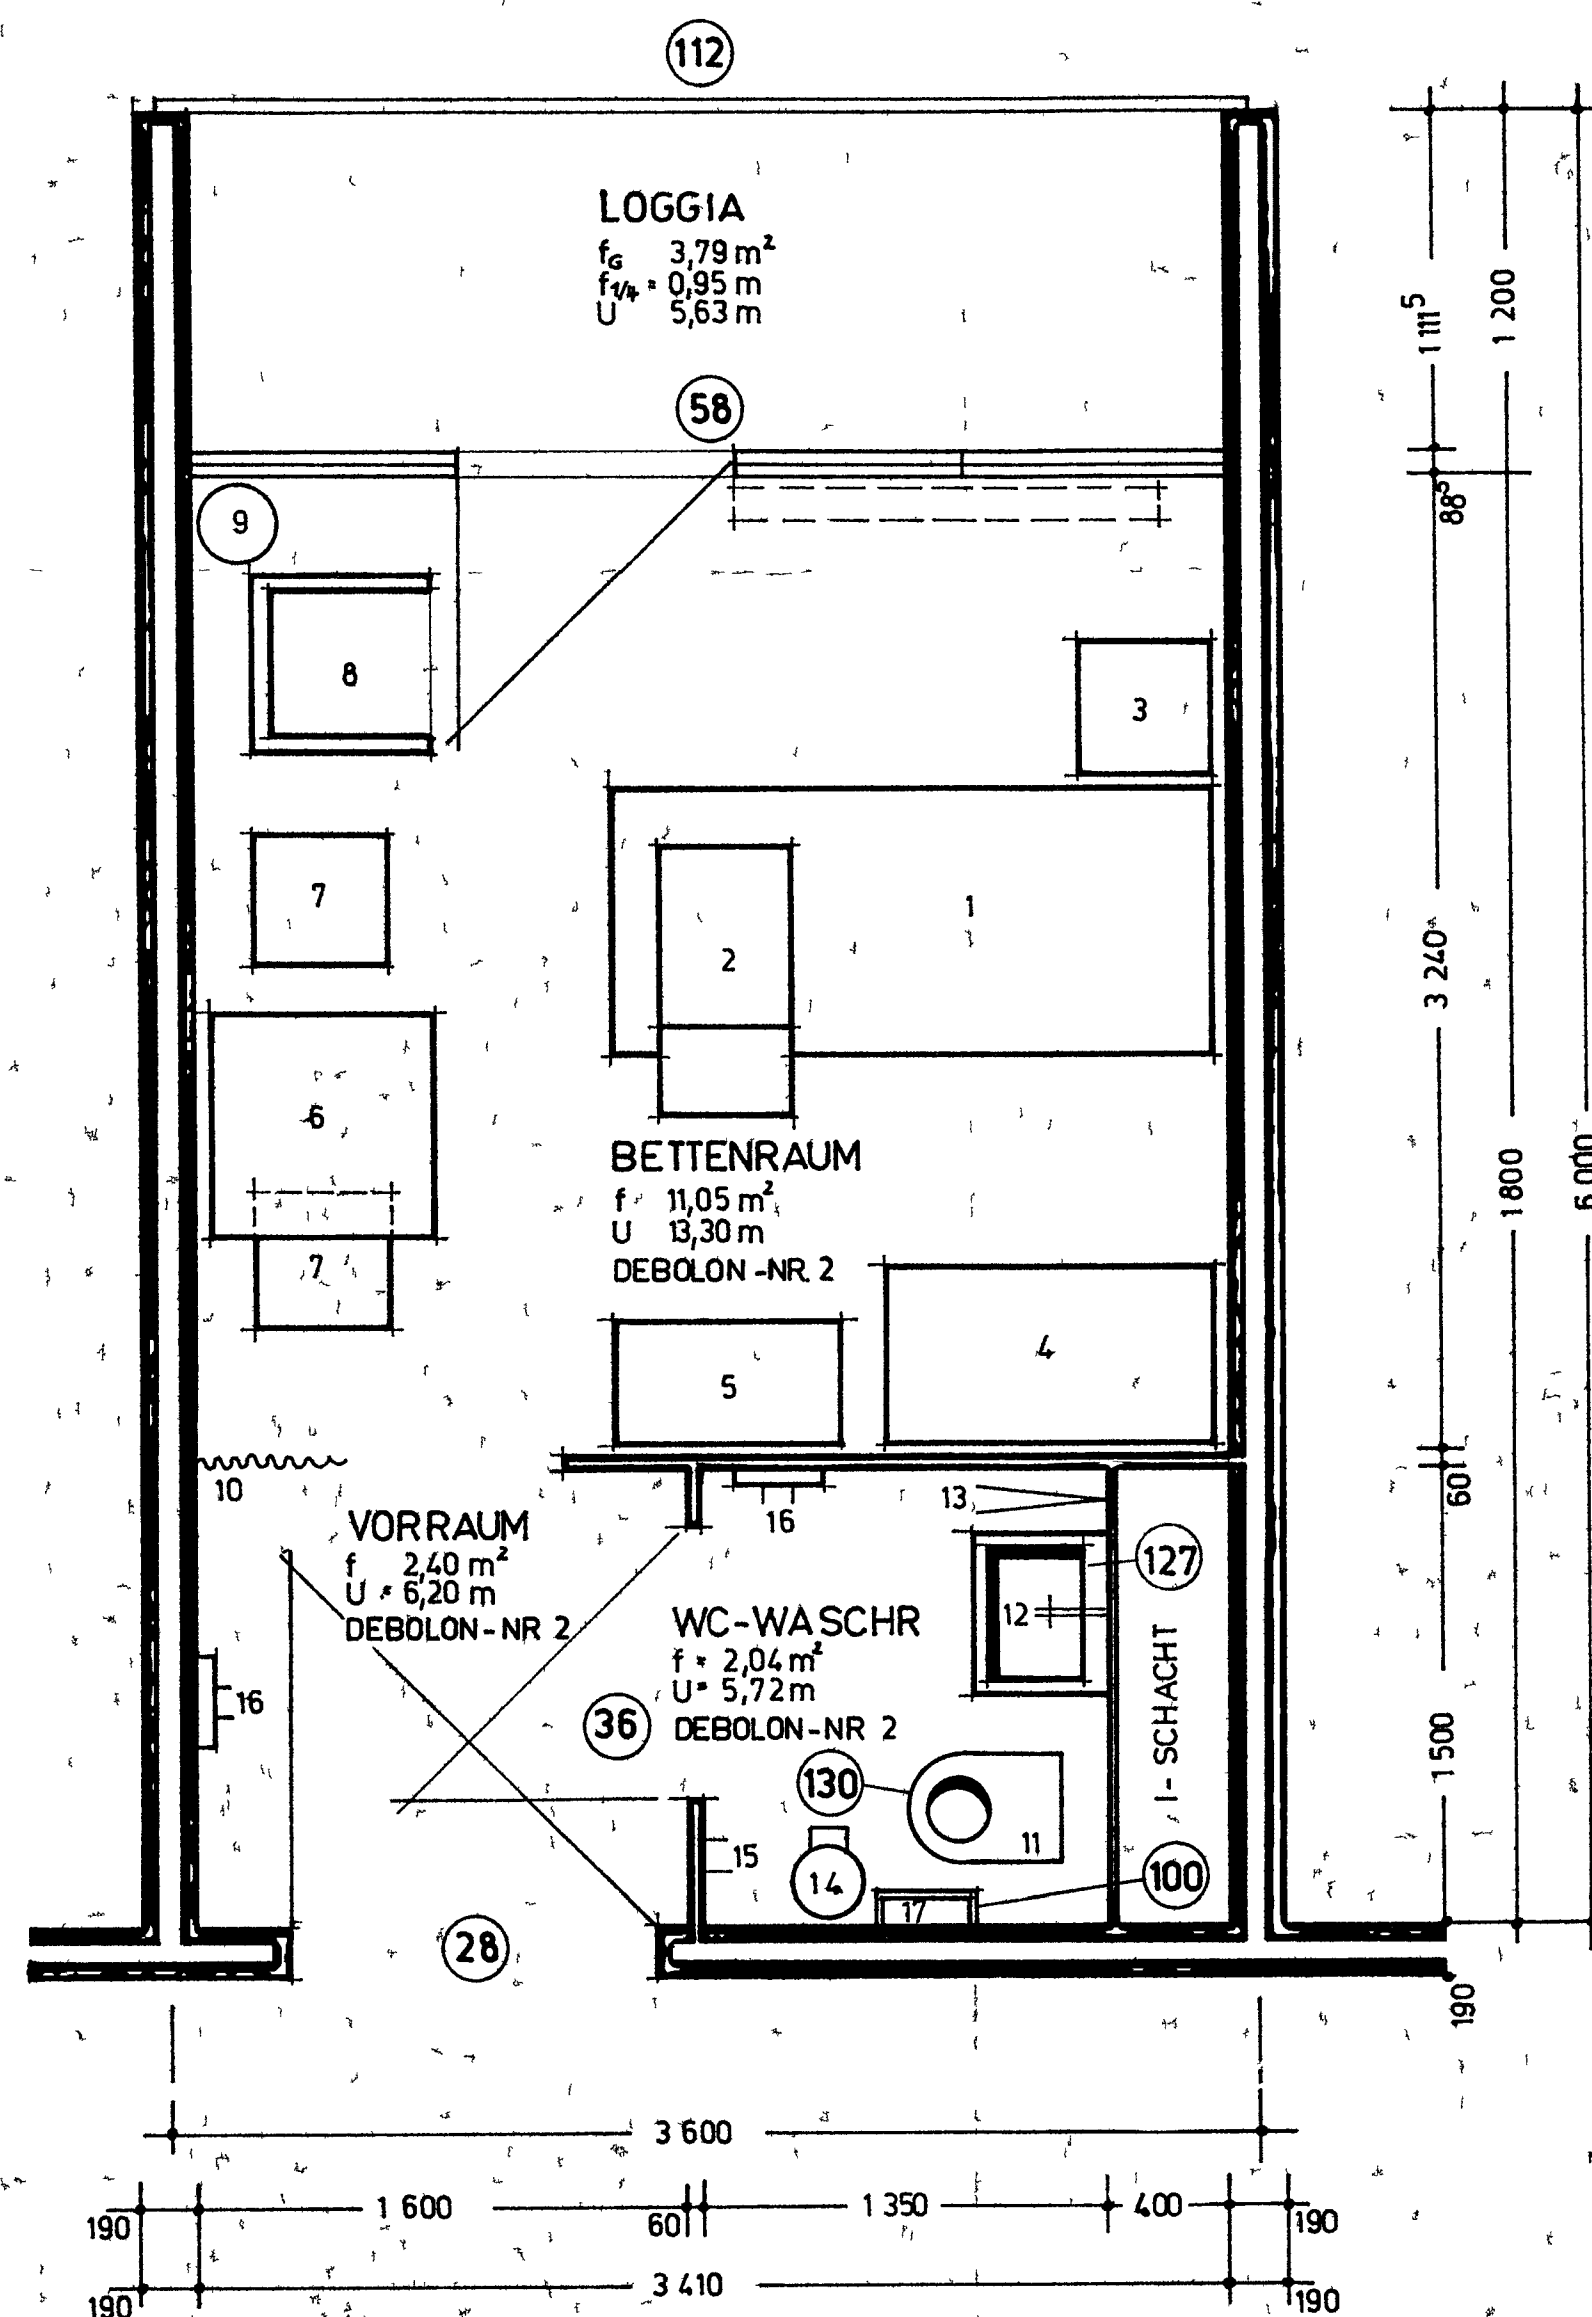

- 1 STATIONS BETT MIT 4 ROLLEN 900 x 2000 mm
- 2 BETT- UND LESETISCH
- 3 NACHTTISCH MIT SCHWENKBAREM OBERTEIL 400 x 450 mm
- 4 KLEIDER- WASCHE SCHRANK 1100/590/1500 mm
- 5 BEISTELLSCHRANK 750/420/730 mm
- 6 TISCH 750/750/730
- 7 PATIENTENSTUHL GEPOLSTERT, ABWASCHBAR
- 8 SESSEL MIT ARM- UND KOPFLEHNE
- 9 PAPIERKORB
- 10 PLASTE VORHANG KOMPLETT MIT WAND- UND DECKEN-  
HALTERUNG UND ZUGSCHIENE OFFNUNG b= 1200 mm
- 11 KLOSETTANLAGE
- 12 WASCHTISCH 560 mm
- 13 HANDTUCHHALTER ZWEIARMIG
- 14 ABFALLEIMER MIT TRETHEBEL
- 15 2 WANDHAKEN
- 16 KLEIDERLEISTE MIT 2 HAKEN
- 17 HALTEGRIFF

BETTENRAUM PFLEGESTATION 1-BETTZIMMER

|                                           |               |                 |             |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| VEB PROJEKTIERUNG UND TECHNOLOGIE         |               | STRUKTUREINHEIT | PROJEKTNR   |
| BETRIEB DES VEB WOHNUNGSBAUKOMBINAT HALLE |               |                 | 521 2205 07 |
| FEIERABENDHEIM MIT PFLEGESTATION          |               | ORIG FORM       | PROJEKTEIL  |
| BETTENHAUS 176 PLATZE                     |               | MASSSTAB 1:25   |             |
| MOBLIERUNGSPLAN                           |               | RV, FORM        | GEAND       |
|                                           |               | DATUM 30.9.80   | ERS BL NR   |
| CHEFINGENIEUR                             | BRIGADELEITER | GRUPPENLEITER   | BEARBEITER  |
|                                           |               | Q KONTROLLE     | 22 201      |
|                                           |               |                 | BLATT NR    |

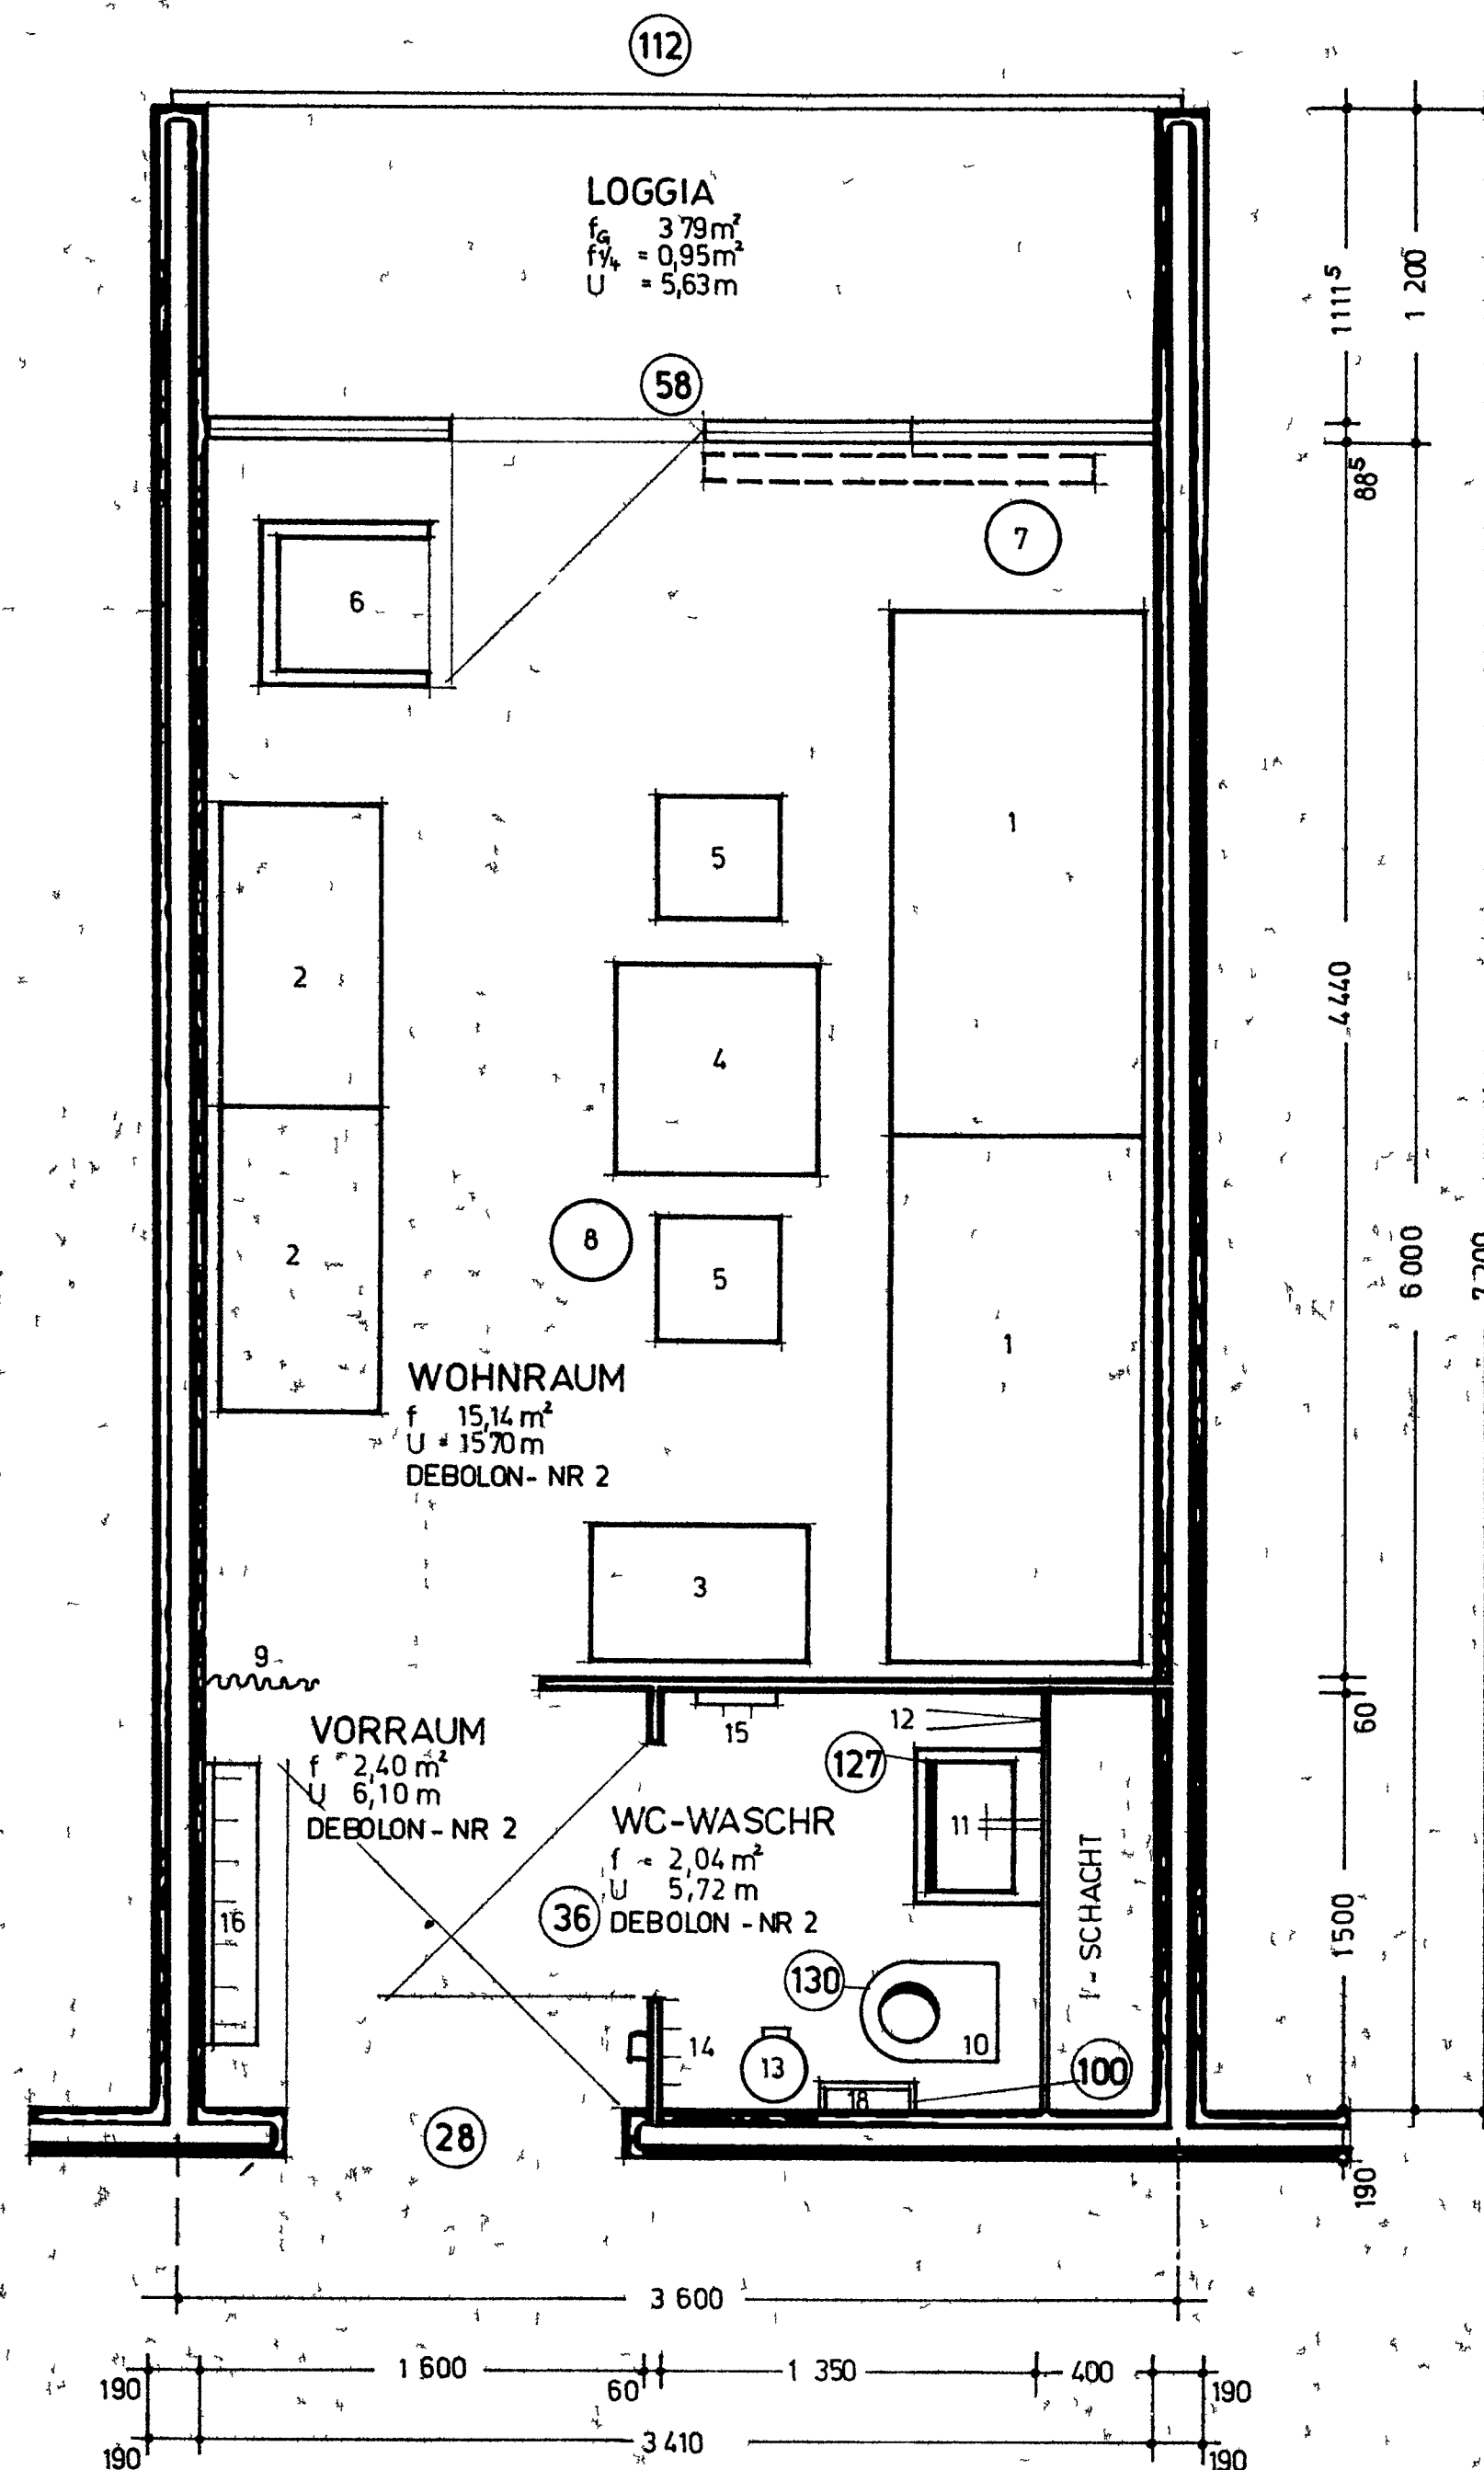


- 1 BETTÜGE MIT BETTKASTEN ca 900/1900 mm
- 2 WOHNZIMMER - MEHRZWECKSCHRANK 1100/590/1500 mm  
KOMBINIERT MIT REGALTEIL MIT VERSTELLBAREN  
EINLEGEBOGEN UND TÜREN SOWIE WASCHE- UND  
GARDEROBENTEIL
- 3 SCHRANK MIT SCHIEBEKASTEN ca 800/500/750 mm
- 4 TISCH 750/750/730 mm
- 5 STUHL SITZ UND RÜCKENLEHNE GEPOLESTERT
- 6 SESSEL MIT ARM- UND KOPFLEHNE
- 7 PAPIERKORB
- 8 STEHLAMPE
- 9 PLASTEVORHANG KOMPLETT MIT WAND- UND DECKEN-  
HALTERUNG UND ZUGSCHIENE OFFNUNG b = 1200 mm
- 10 KLOSETTANLAGE
- 11 WASCHTISCH 560 mm
- 12 HANDTUCHHALTER ZWEIARMIG
- 13 ABFALLEIMER MIT TRETHÜBEL
- 14 4 WANDHAKEN
- 15 KLEIDERLEISTE MIT 2 HAKEN
- 16 GARDEROBENABLAGE MIT HUTTEL MIT 5+6 HAKEN
- 17 GARDEROBENABLAGE MIT HUTTEL MIT 3 HAKEN
- 18 HALTEGRIFF

## WOHNRAUM FEIERABENDSTATION 2- BETTZIMMER

|                                           |               |                 |                    |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| <b>VEB PROJEKTIERUNG UND TECHNOLOGIE</b>  |               | STRUKTUREINHEIT | PROJEKTNR          |
| BETRIEB DES VEB WOHNUNGSBAUKOMBINAT HÄLLE |               |                 | 521 2205-07        |
| FEIERABENDHEIM MIT PFLEGESTATION          |               | ORIG FORM       | PROJEKTEIL         |
| BETTENHAUS 176 PLATZE                     |               | MASSTAB 1:25    |                    |
| MOBLIERUNGSPLAN                           |               | RV FORM         | GERND              |
|                                           |               | DATUM 26.9.80   | ERS BL NR          |
| CHEFINGENIEUR                             | BRIGADELEITER | GRUPPENLEITER   | BEARBEITER         |
|                                           |               | Q KONTROLLE     | 22 205<br>BLATT NR |




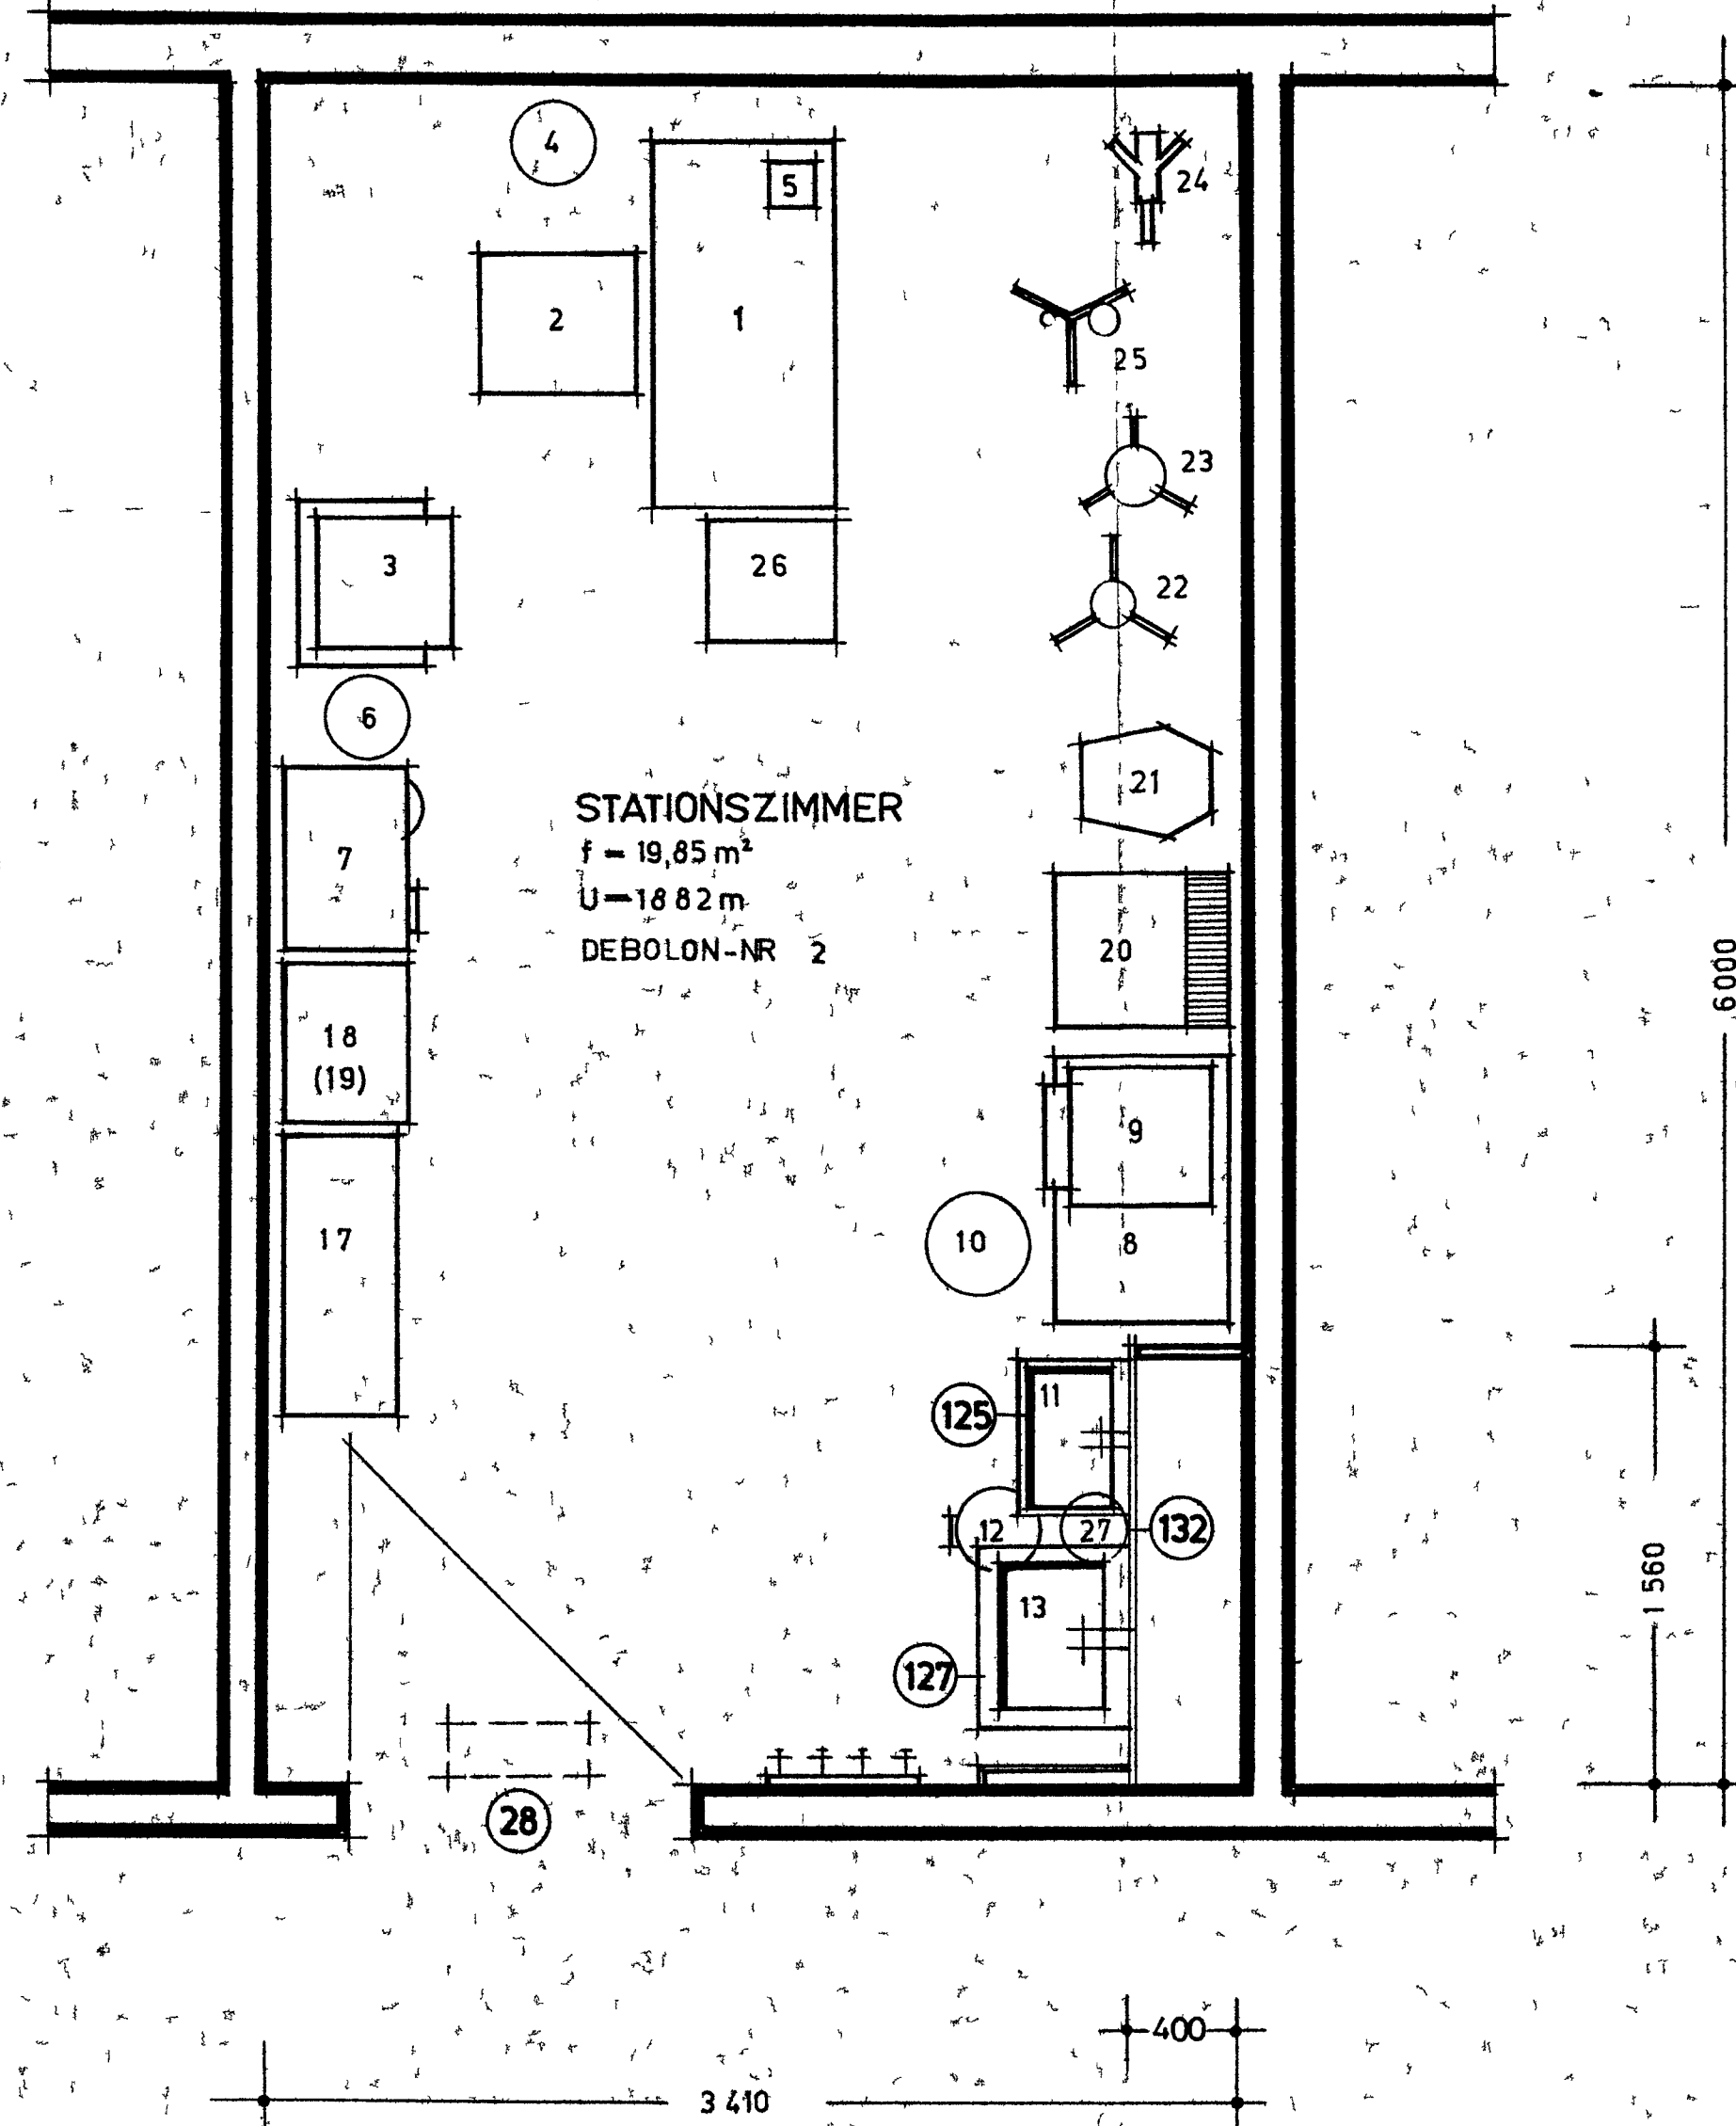

- 1 SCHWESTERNSCHREIBTISCH
- 2 DREHSEL
- 3 PATIENTENSTUHL MIT ARMLEHNE
- 4 PAPIERKORB
- 5 TELEFON
- 6 VERBANDSTOFFEIMER MIT DECKEL
- 7 INSTRUMENTENTISCH FAHRBAR 450 / 600 / 880 mm
- 8 ANSATZTISCH MIT SPRELACARTPLATTE MIT SCHIEBEKASTEN UND SITZNISCHE
- 9 HEISSLUFTSTERILISATOR 724 B
- 10 DREHHÖCKER OHNE LEHNE
- 11 SPÜHLAUSGUSSBECKEN
- 12 ABFALLEIMER MIT TRETHEBEL
- 13 WASCHTISCH 560 mm
- 14 HANDTUCHHALTER
- 15 KLEIDERLEISTE MIT 4 HAKEN
- 16 SCHWESTERN-LICHTRUFANLAGE (LAMPE MIT SUMMER)
- 17 MEDIKAMENTEN UND VERBANDSTOFFSCHRANK
- 18 SCHRANK 9301 MIT GLASTÜR MIT 4 EINLEGEBODEN 600×450×1500 mm
- 19 UNTERGESTELL FÜR SCHRANK
- 20 KÜHLSCHRANK H 130
- 21 LAUFGEWICHTSPERSONENWAAGE
- 22 IRRIGATORSTANDER
- 23 SCHALENSTANDER MIT 1 SCHALE
- 24 FUSSBEHANDLUNGSSTANDER
- 25 INFUSIONSSTANDER
- 26 STUHL
- 27 KOCHENDWASSERBEREITER (5 LITER)

STATIONSZIMMER IN DER PFLEGESTATION

|                                           |               |                 |             |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| VEB PROJEKTIERUNG UND TECHNOLOGIE         |               | STRUKTUREINHEIT | PROJEKTNR   |
| BETRIEB DES VEB WOHNUNGSBAUKOMBINAT HALLE |               |                 | 521 2205 07 |
| FEIERABENDHEIM MIT PFLEGESTATION          |               | ORG FORM        | PROJEKTEIL  |
| BETTENHAUS 176 PLATZE                     |               | MASSTAB 1:25    |             |
| MOBLIERUNGSPLAN                           |               | RV FORM         | GEAND       |
|                                           |               | DATUM 25.9.80   | ERS BL NR   |
| CHEFINGENIEUR                             | BRIGADELEITER | GRUPPENLEITER   | BEARBEITER  |
|                                           |               | Q KONTROLLE     | 22 207      |
|                                           |               |                 | BLATT NR    |

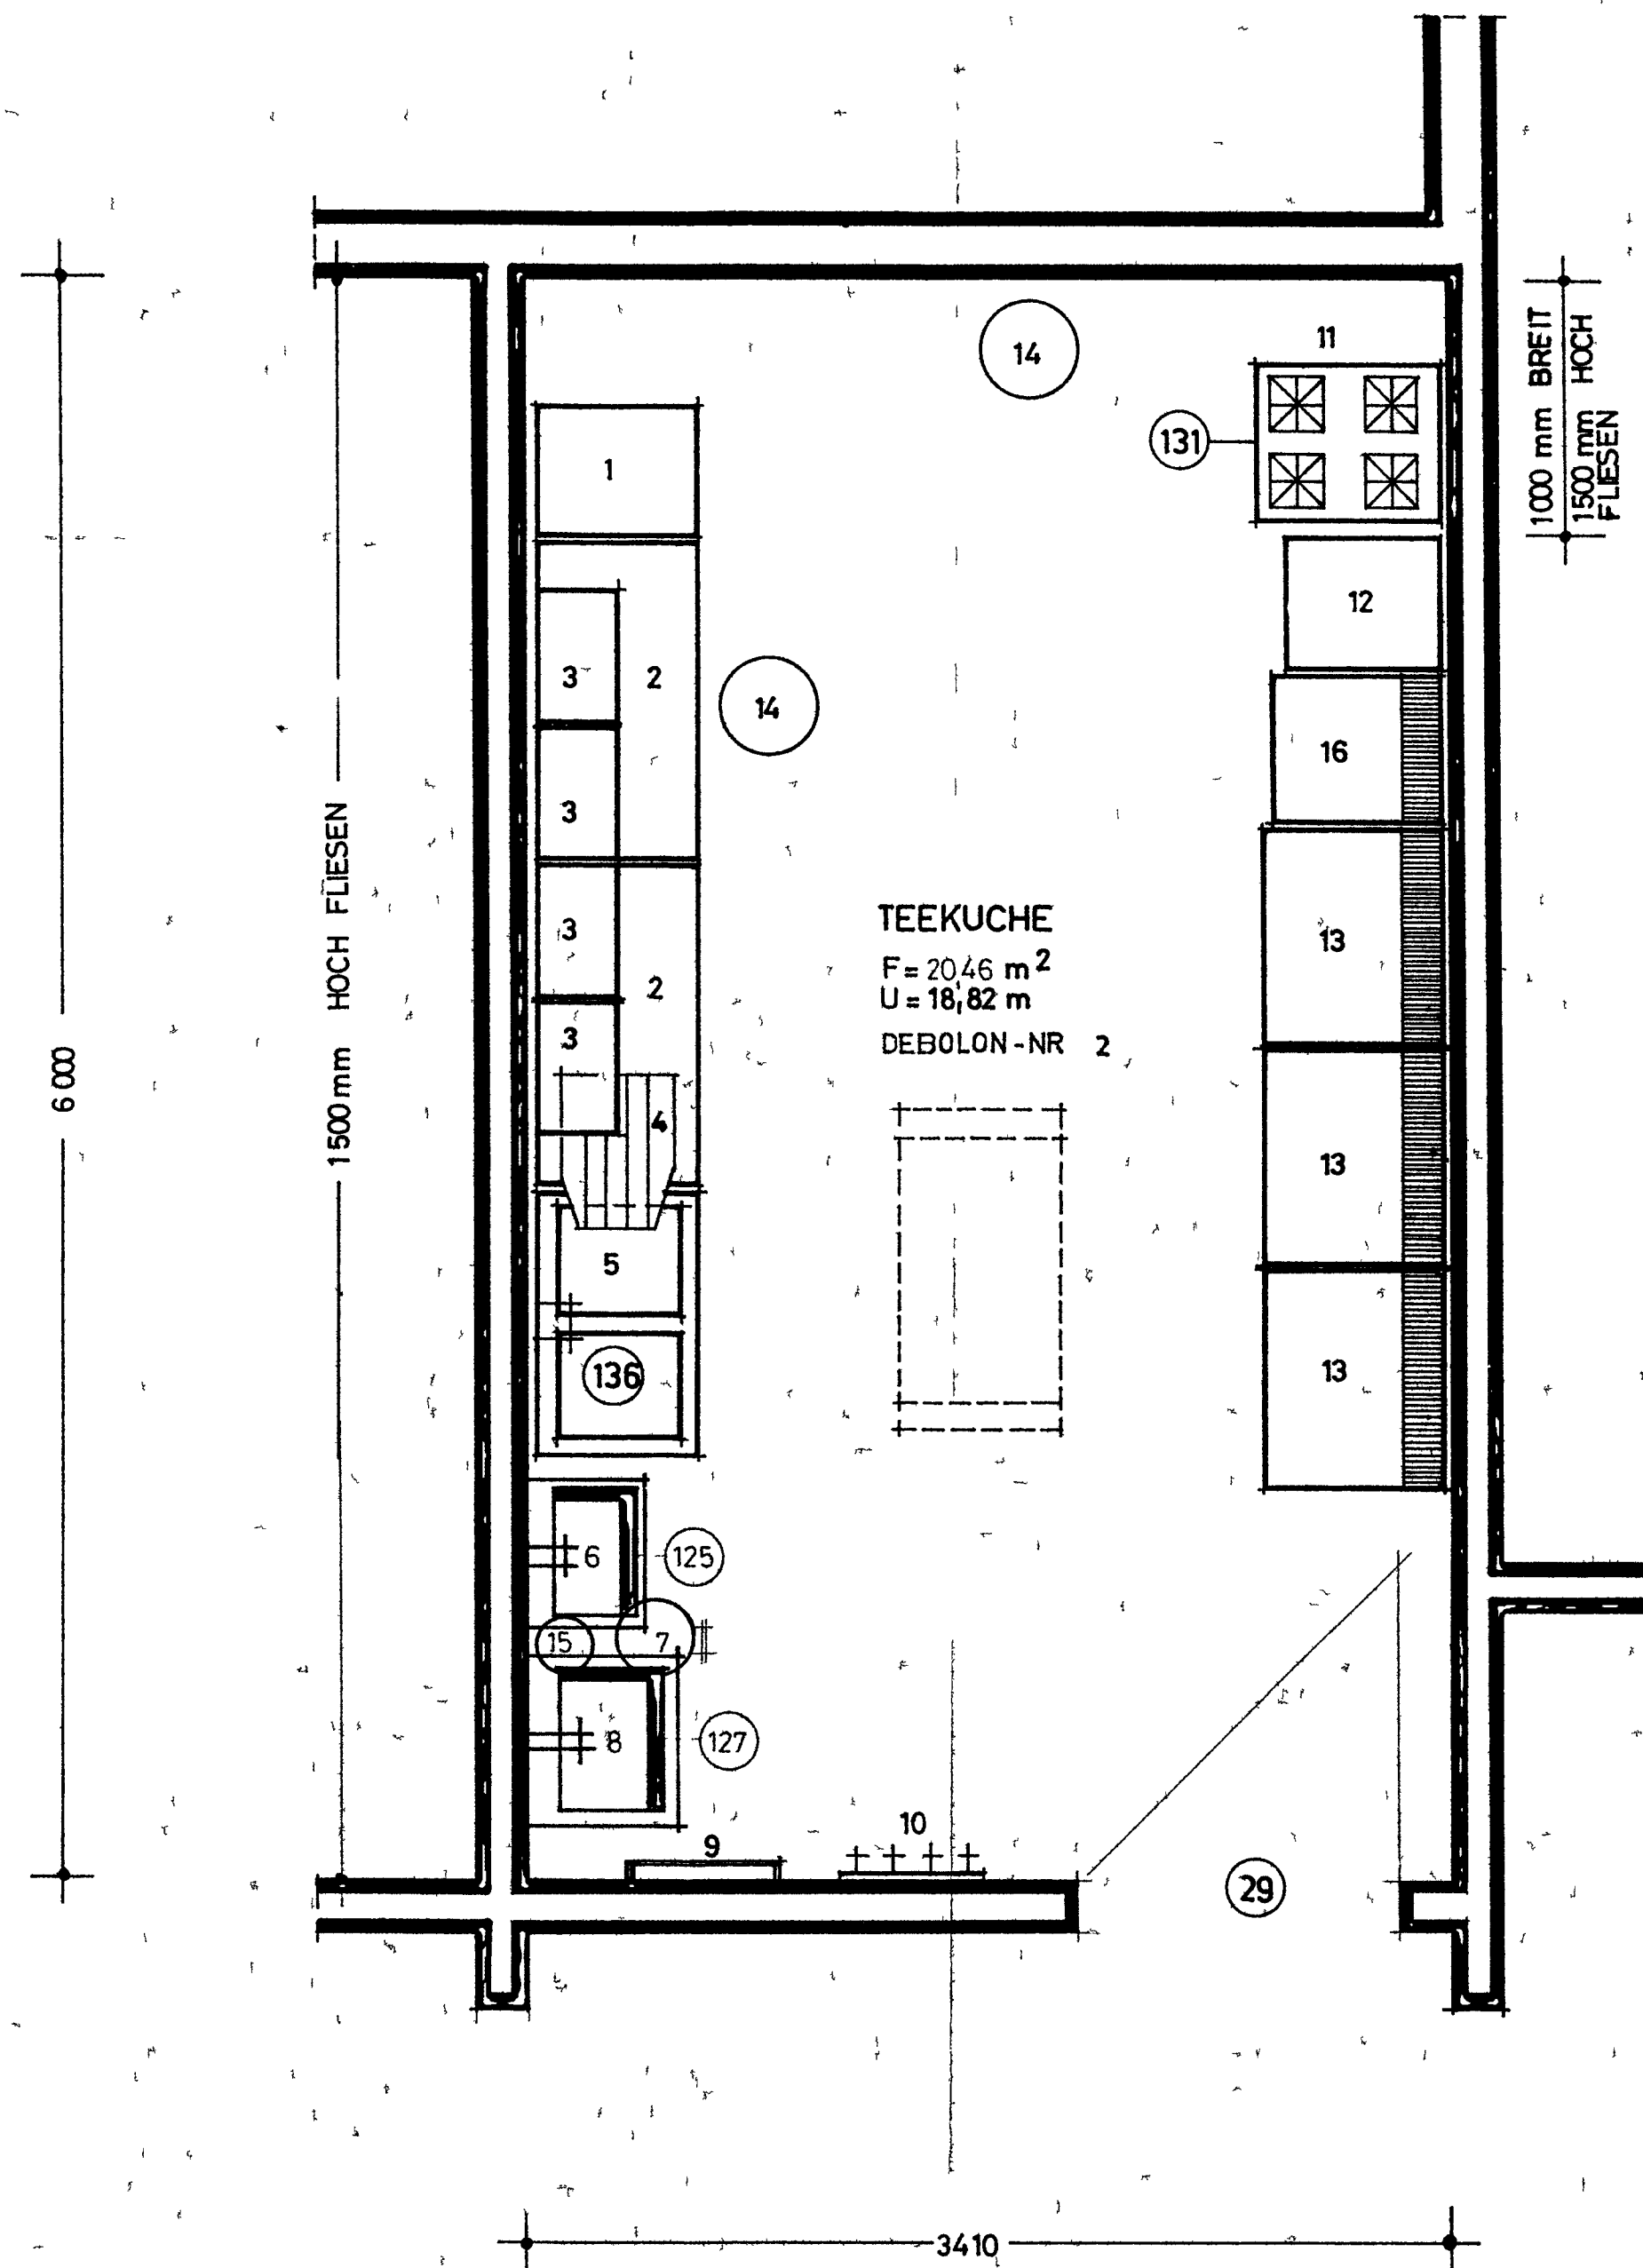


- 1 UNTERSCHRANK 500 / 590 / 850  
(BROTSCHEIDESCHRANK)
- 2 UNTERSCHRANK 1200 / 590 / 850  
(TOPFSCHRANK)
- 3 OBERSCHRANK 500 / 313 / 550  
(GESCHIRRSCHRANK)
- 4 ABTROPFBRETT 410 / 585
- 5 UNTERSCHRANK 1000 / 590 / 850  
(OFFENE SPULE)
- 6 SPULAUSGUSSBECKEN
- 7 ABFALLEIMER MIT TRETHEBEL
- 8 WASCHTISCH 560 mm
- 9 HANDTUCHHALTER
- 10 KLEIDERLEISTE MIT 4 HAKEN
- 11 ELEKTROHERD VIERFLAMMIG 7,5 KW
- 12 UNTERSCHRANK 500 / 590 / 850  
(KASTENSCHRANK)
- 13 SCHLIESSFACH KUHLSCHRANK G 601 S  
800 / 665 / 1900
- 14 DREHHOCKER OHNE LEHNE
- 15 KOCHENDWASSERBEREITER 5 LITER
- 16 HAUSHALT KUHLSCHRANK H 130  
550 / 631 / 850

KOCHSTELLE IN DER PFLEGESTATION

|                                           |               |               |            |                 |                    |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------------|--------------------|
| VEB PROJEKTIERUNG UND TECHNOLOGIE         |               |               |            | STRUKTUREINHEIT | PROJEKTNR          |
| BETRIEB DES VEB WOHNUNGSBAUKOMBINAT HALLE |               |               |            |                 | 521 2205 07        |
| FEIERABENDHEIM MIT PFLEGESTATION          |               |               |            | ORIG FORM       | PROJEKTTIL         |
| BETTENHAUS 176 PLATZE                     |               |               |            | MASSTAB 1:25    |                    |
| MOBLIERUNGSPLAN                           |               |               |            | RV FORM         | GEAND              |
|                                           |               |               |            | DATUM 29.9.80   | ERS BL NR          |
| CHEFINGENIEUR                             | BRIGADELEITER | GRUPPENLEITER | BEARBEITER | Q KONTROLLE     | 22 208<br>BLATT NR |



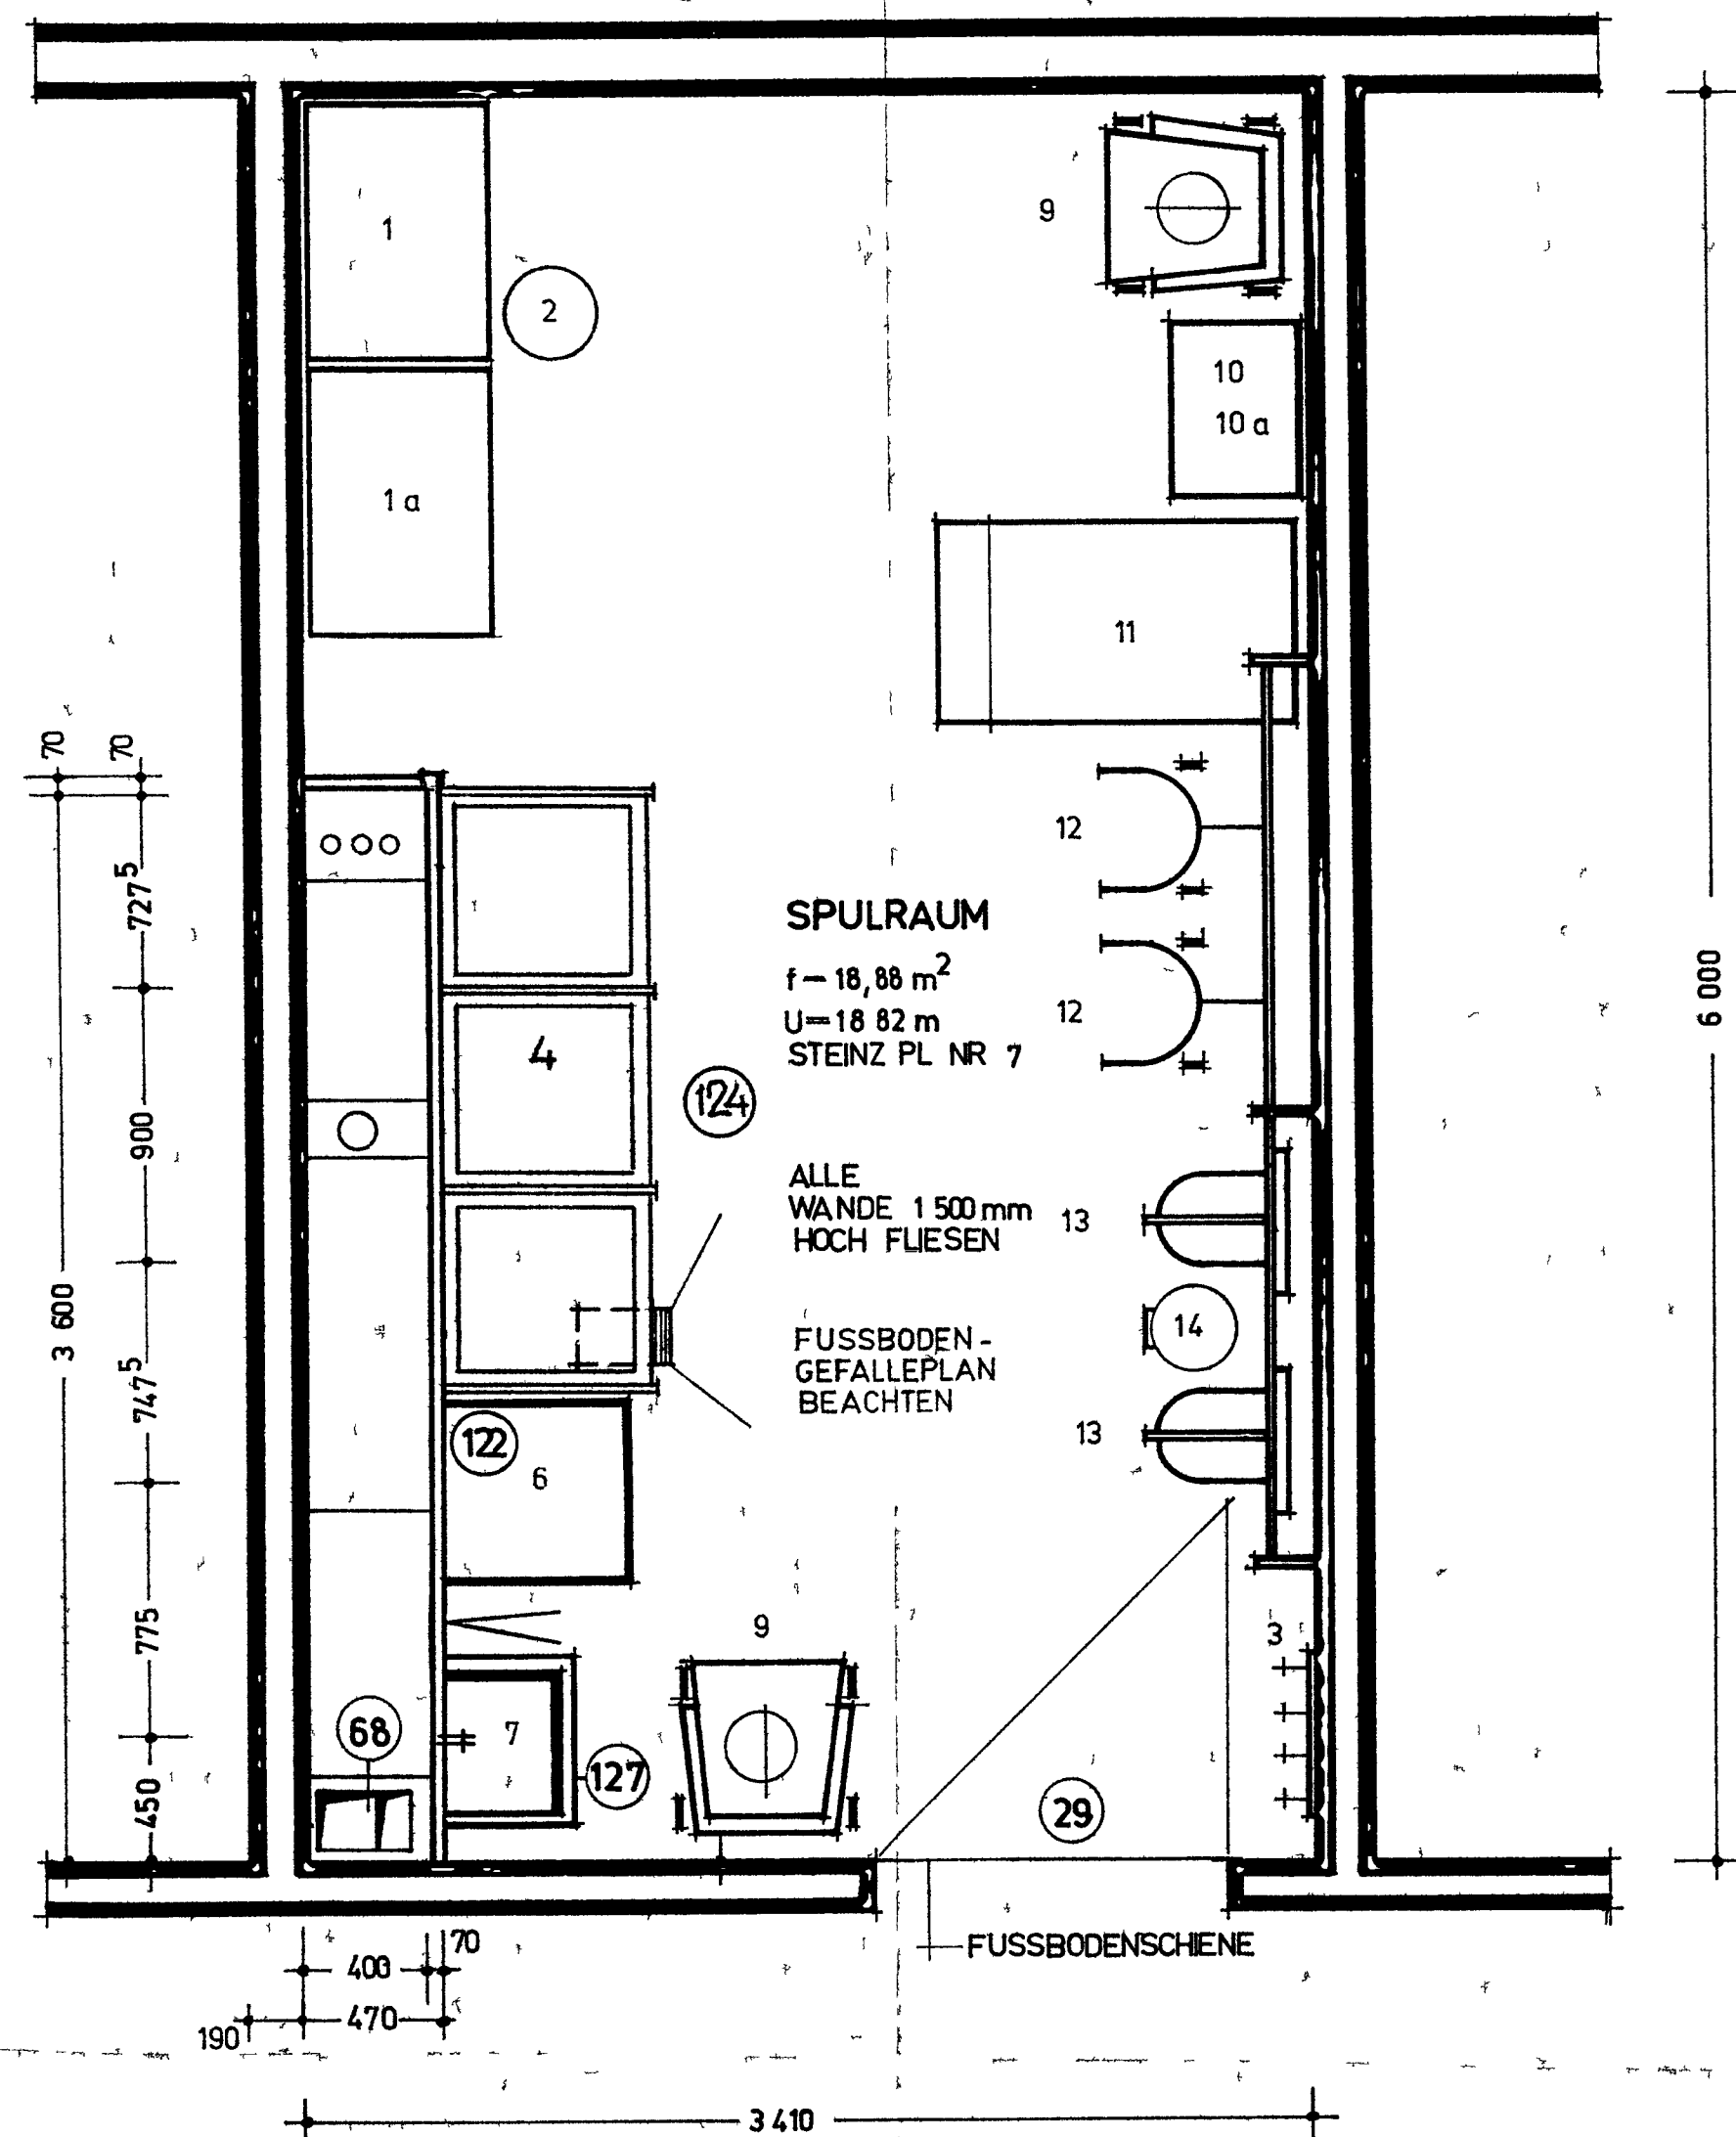


- 1 ANSETZTISCH MIT SCHIEBEKASTEN  
930 / 620 / 900
- 1 a ANSETZTISCH MIT SCHIEBEKASTEN UND  
ROLLTUREN PVC PLATTEN  
930 / 620 / 900
- 2 DREHHOCKER OHNE LEHNE
- 3 KLEIDERLEISTE MIT 4 HAKEN
- 4 DREITEILIGE HOTELSPÜLE
- 5 STECKBECKENSPULER AUTOMATISCH  
TYP MATOLA
- 6 FAKALIENAUSGUSS MIT DRUCKSPULER
- 7 WASCHTISCH 560 mm
- 8 HANDTUCHHALTER
- 9 KLOSETTSTUHL MIT EIMER  
FAHRBAR
- 10 SCHRANK 9301 MIT BLECHTUR  
UND 4 EINLEGBODEN 600/450/1500
- 10 a UNTERGESTELL FÜR SCHRANK
- 11 TRANSPORTWAGEN F 1041  
700/1200
- 12 STECKBECKENSTANDER 600/480
- 13 WASCHESACKTRANSPORTWAGEN
- 14 ABFALLEIMER MIT TRETHEBEL

SPULRAUM IN DER FEIERABEND-UND PFLEGESTATION

SPÜLE GEÄNDERT  
HALLE DEN 13.04.84


|                                                                                |               |                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|
| VEB PROJEKTIERUNG UND TECHNOLOGIE<br>BETRIEB DES VEB WOHNUNGSBAUKOMBINAT HALLE |               | STRUKTUREINHEIT            | PROJEKTNR<br>521-2205 07 |
| FEIERABENDHEIM MIT PFLEGESTATION<br>BETTENHAUS 176 PLATZE<br>MOBLIERUNGSPLAN   |               | ORIG FORM<br>MASSSTAB 1:25 | PROJEKTEIL               |
|                                                                                |               | RV FORM                    | GEÄND                    |
|                                                                                |               | DATUM 2.10.80              | ERS BL NR                |
| CHEFINGENIEUR                                                                  | BRIGADELEITER | GRUPPENLEITER              | BEARBEITER               |
|                                                                                |               | Q KONTROLLE                | 22 212<br>BLATT NR       |

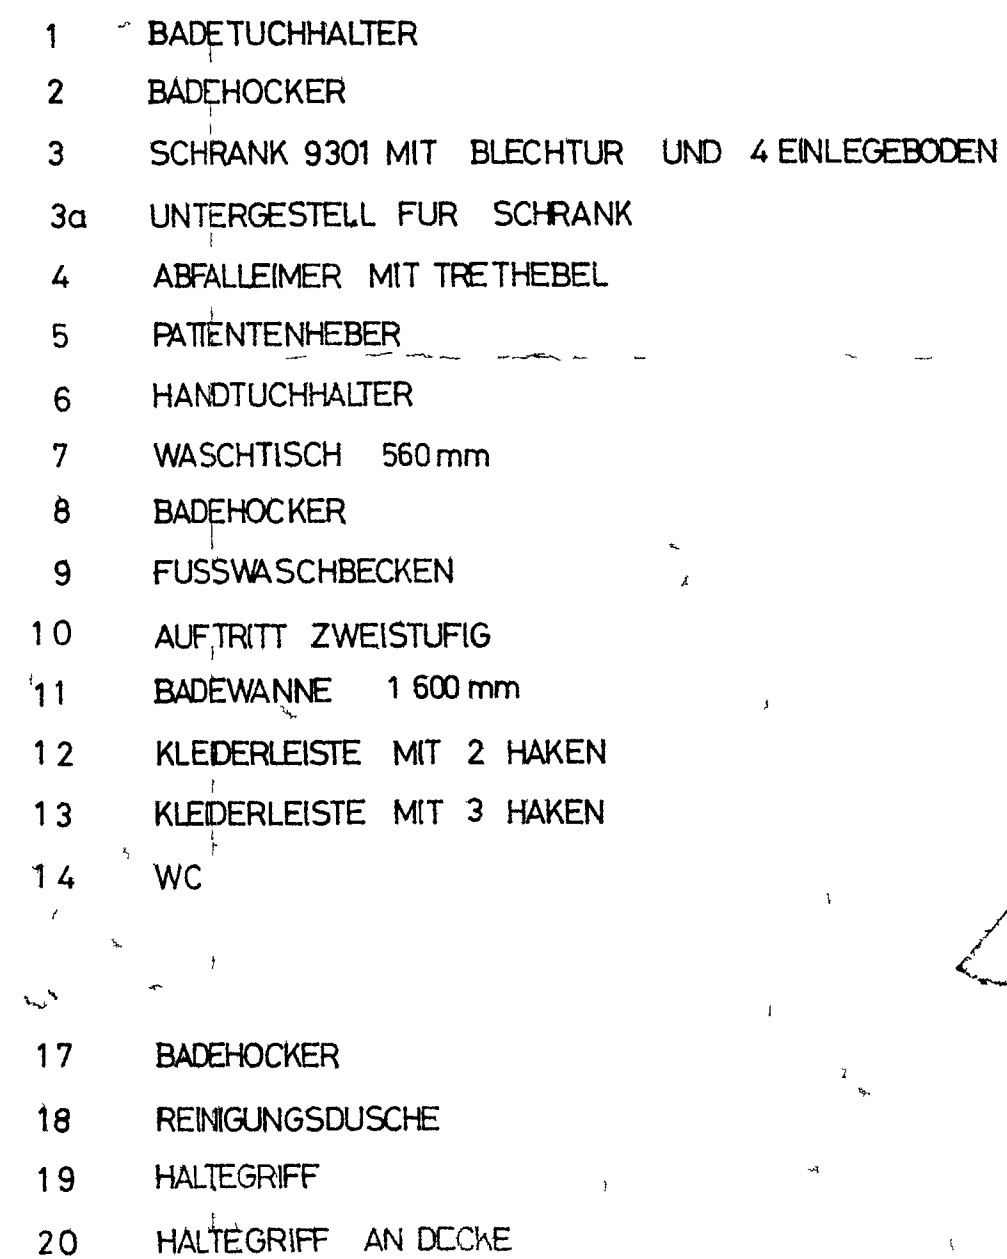


DETAIL BRAUSEZELLE BEACHTEN  
BLATT NR.

GROSSER BADERAUM IN DER FEIERABEND-  
STATION UND PFLEGESTATION

|                                                                                                  |                        |                                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>VEB PROJEKTIERUNG UND TECHNOLOGIE</b><br>BETRIEB DES VEB WO NUNCSB/NKOMB NAT HALLÉ            |                        | TRUPPENFÜHRT<br><b>75-32 31</b>          | POLYMER<br><b>521-2205 07</b> |
| <b>FEIERABENDHEIM MIT PFLEGESTATION</b><br><b>BETTENHAUS 176 PL</b><br><b>MOBILISIERUNGSPLAN</b> |                        | CRIEPA<br>MA 125<br>P. 1044<br>D 2 10 80 | POLYMER<br>CRIEPA<br>L 11     |
| 1. HEBUNG<br>1. HEBUNG                                                                           | 2. HEBUNG<br>2. HEBUNG | 3. HEBUNG<br>3. HEBUNG                   | 4. HEBUNG<br>4. HEBUNG        |

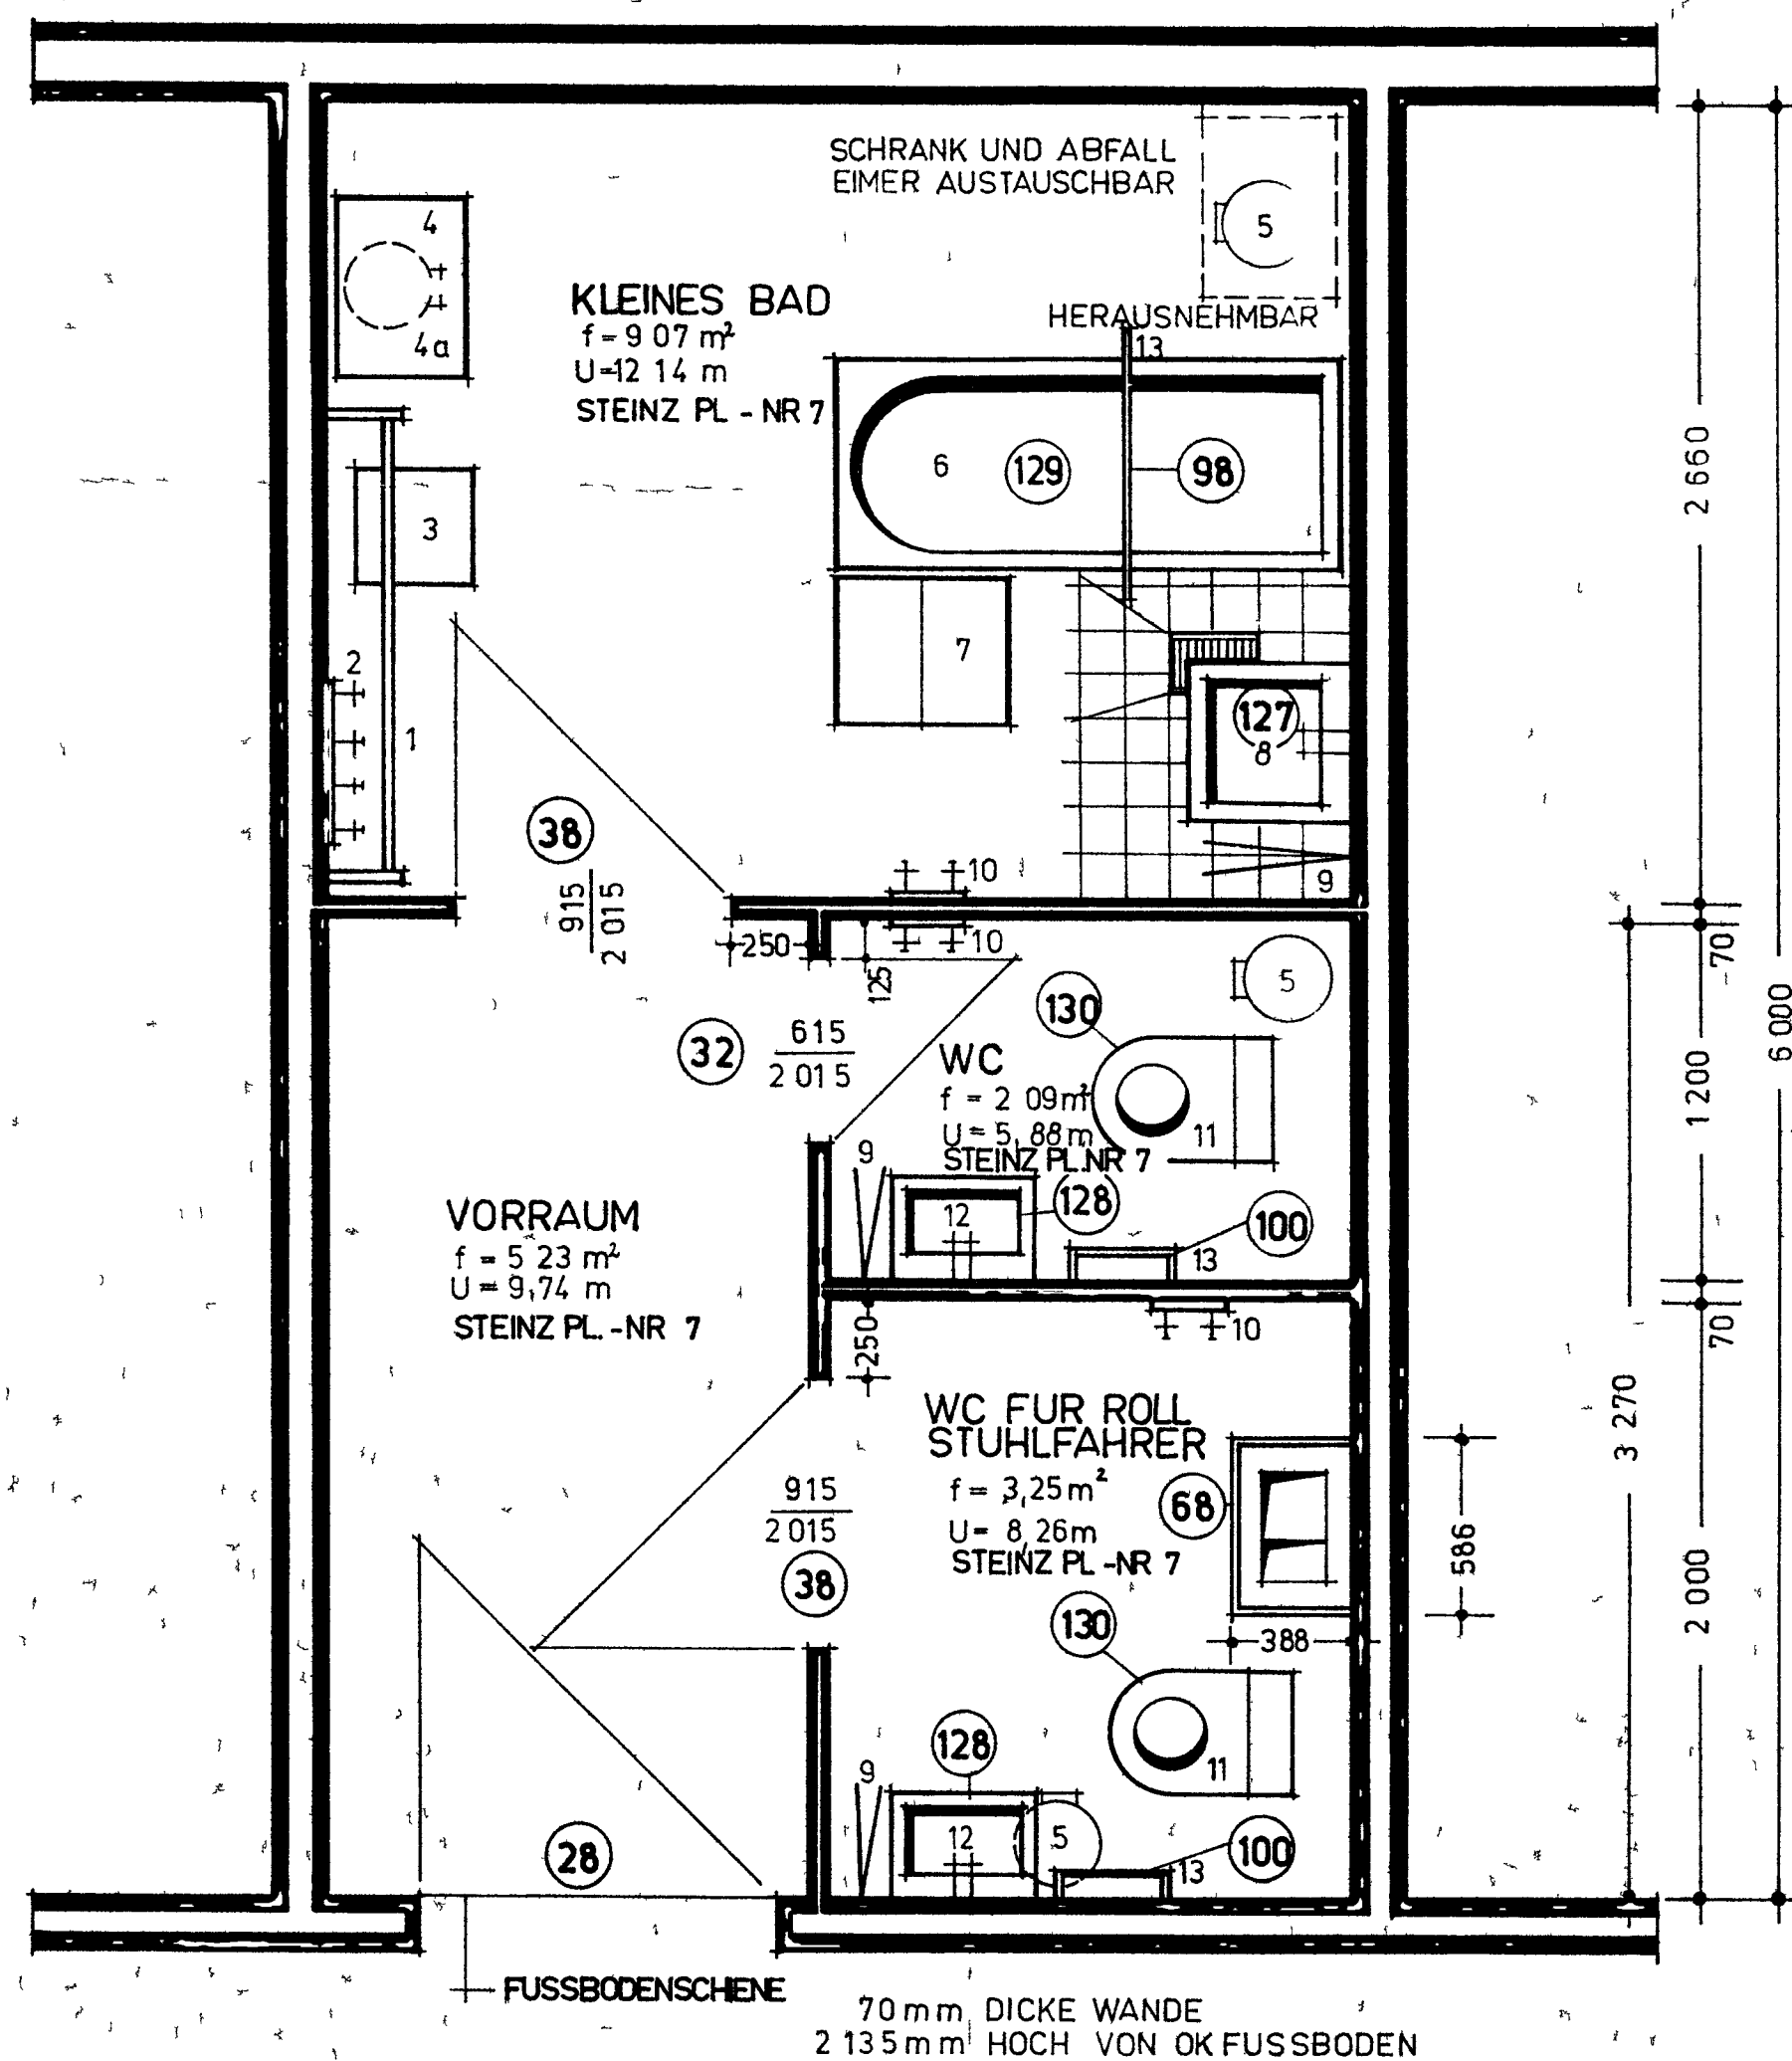

- 1 BADETUCHHALTER
- 2 KLEIDERLEISTE MIT 4 HAKEN
- 3 BADEHÖCKER
- 4 SCHRANK 9 301 MIT BLECHTUR UND 4 EINLEGEBODEN
- 4a UNTERGESELL FÜR SCHRANK
- 5 ABFALLEIMER MIT TRETHEBEL
- 6 BADEWANNE 1 600 mm
- 7 AUFTRITT ZWEISTUFIG
- 8 WASCHTISCH 560 mm
- 9 HANDTUCHHALTER
- 10 KLEIDERLEISTE MIT 2 HAKEN
- 11 WC
- 12 WASCHTISCH 510 mm
- 13 HALTEGRIFFE

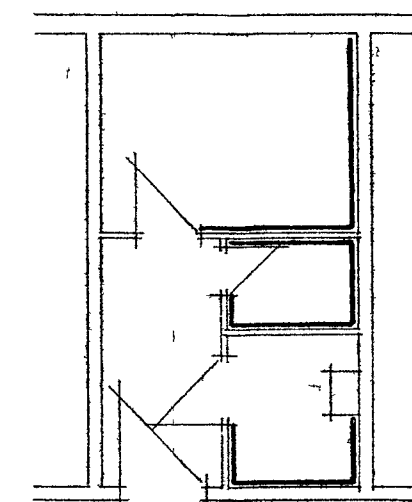


ANGERANDETE  
WANDFLACHEN SIND  
1500 mm HOCH ZU FLIESEN

KLEINER BADERAUM IN DER FEIERABEND-  
UND PFLEGESTATION


| VEB PROJEKTIERUNG UND TECHNOLOGIE         |               | STRUKTUREINHEIT | PROJEKTNR   |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| BETRIEB DES VEB WOHNUNGSBAUKOMBINAT HALLE |               |                 | 521 2205 07 |
| FEIERABENDHEIM MIT PFLEGESTATION          |               | ORIG FORM       | PROJEKTEIL  |
| BETTENHAUS 176 PLATZE                     |               | MASSTAB 1:25    |             |
| MOBLIERUNGSPLAN                           |               | RV FORM         | GEAND       |
|                                           |               | DATUM 24.9.80   | ERS BL NR   |
| CHEFINGENIEUR                             | BRIGADELEITER | GRUPPENLEITER   | BEARBEITER  |
|                                           |               | Q KONTROLLE     | 22 214      |
|                                           |               |                 | BLATT NR    |



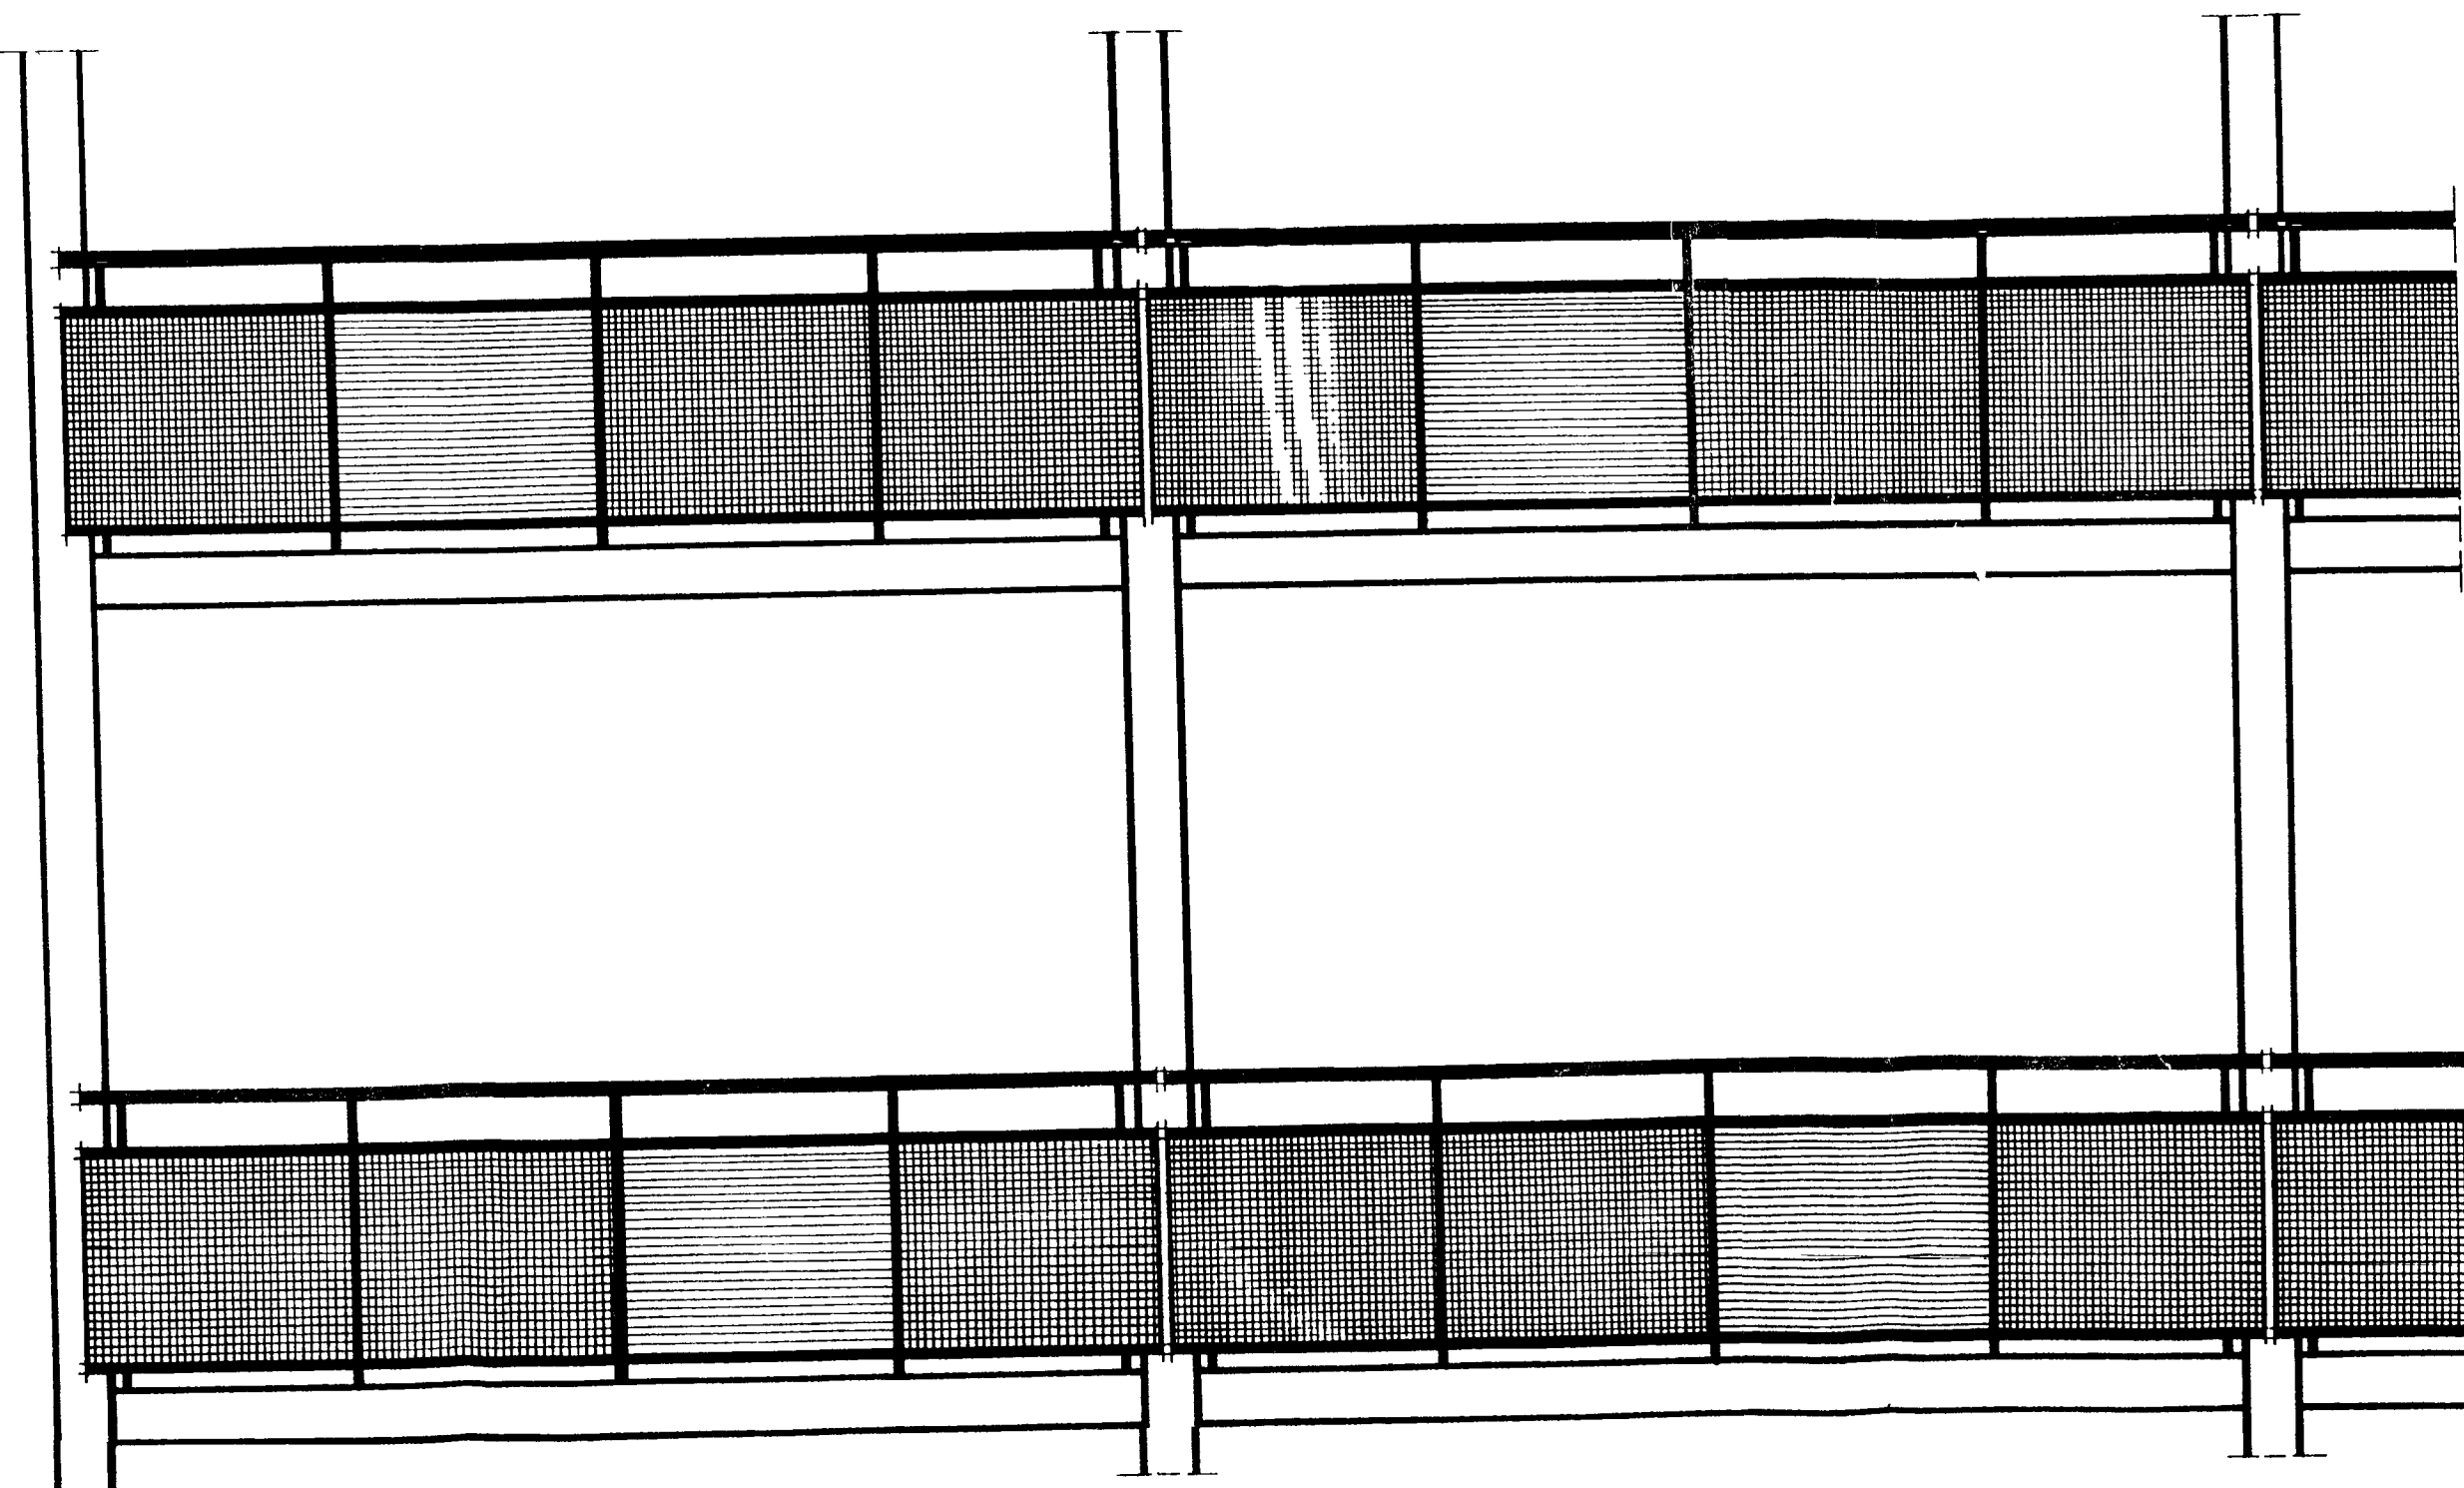


ANSICHT M 1 25



GRUNDRISS M 1 10

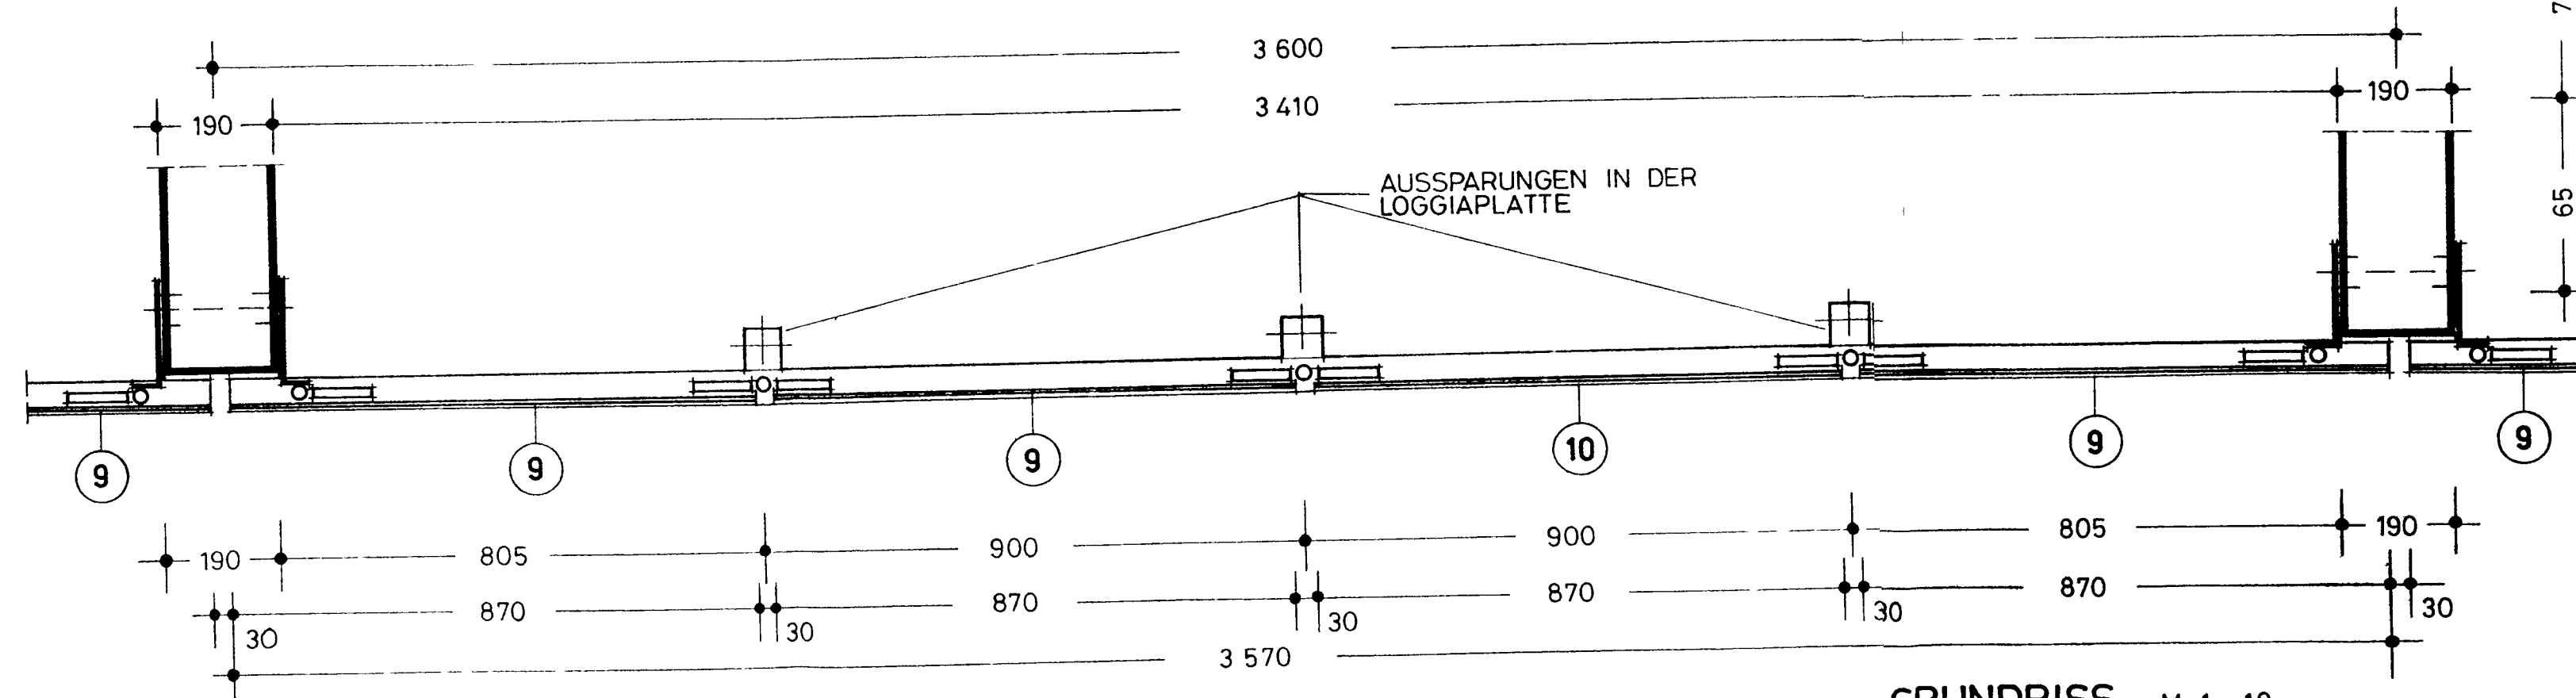


GRUNDRISS M 1 10  
VERKURZTE LOGGIENBRUSTUNG  
BEDARF PRO BETTENHAUS 5 STÜCK

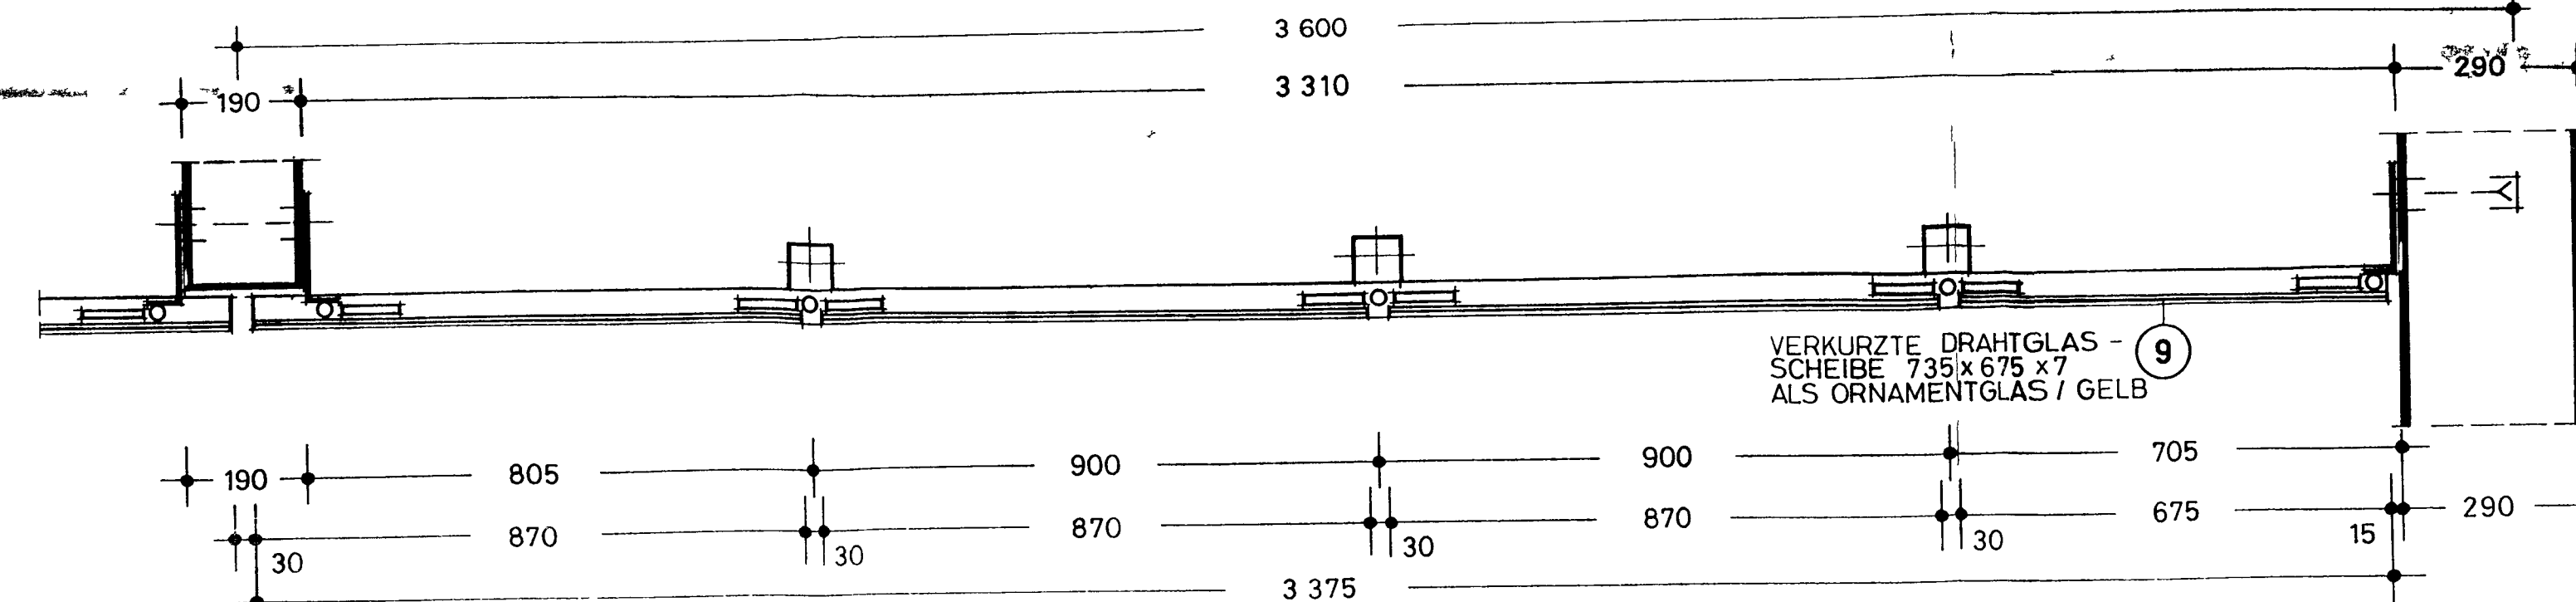

VERKURZTE DRAHTGLAS -  
SCHEIBE 735x675 x7  
ALS ORNAMENTGLAS / GELB

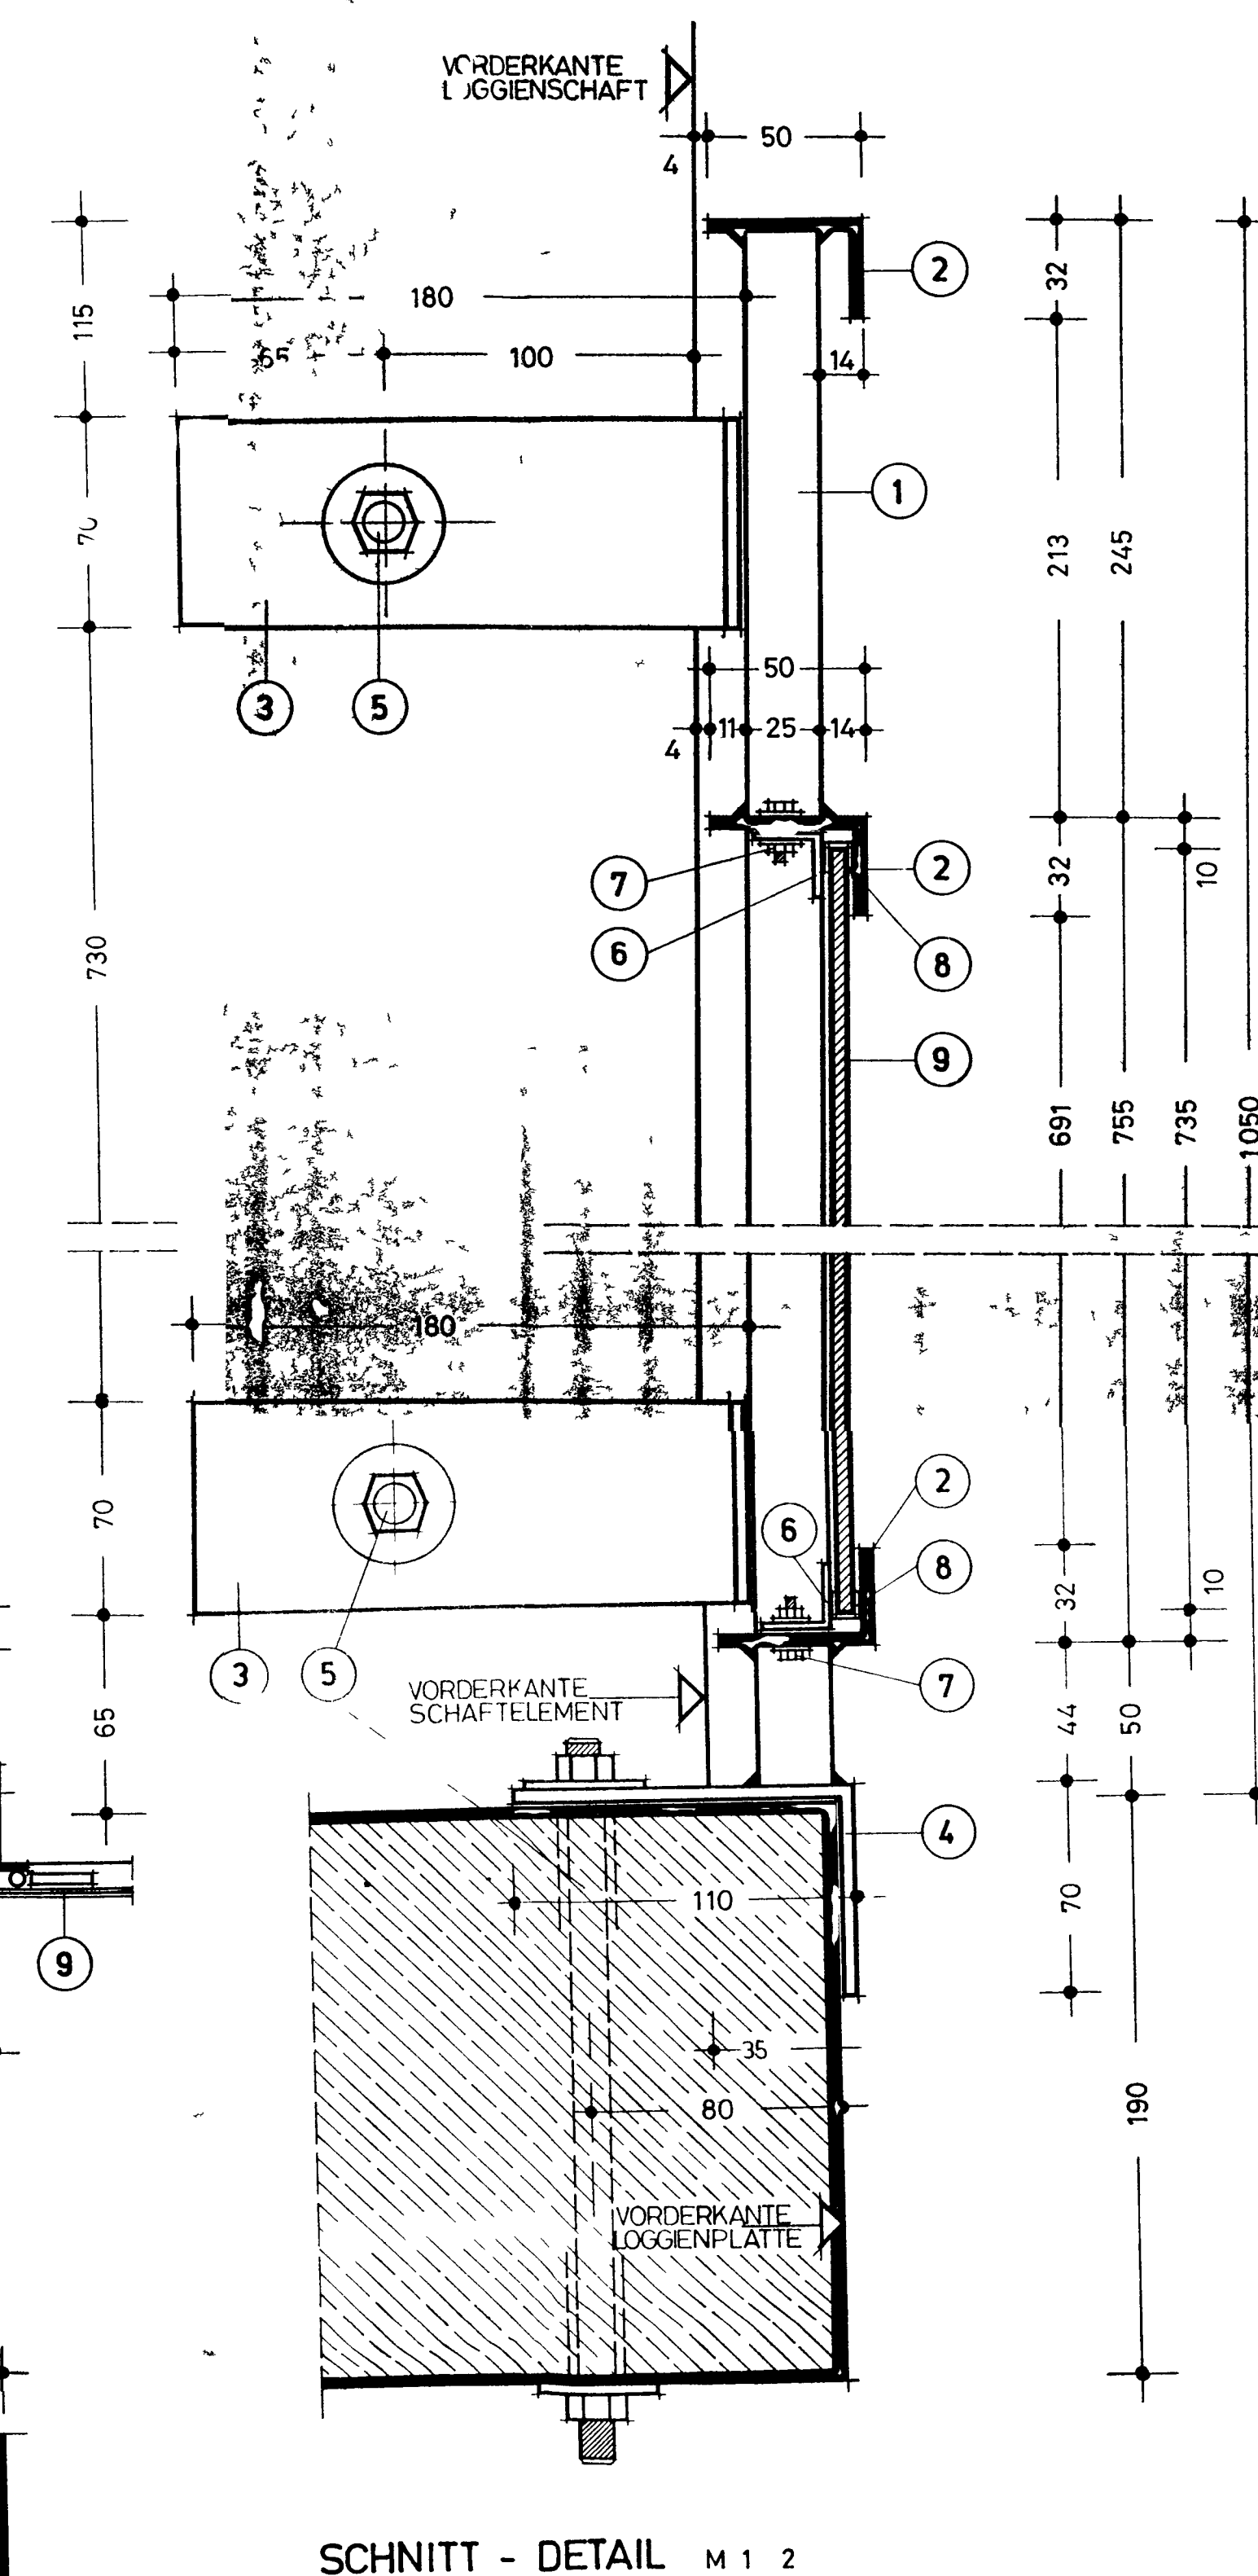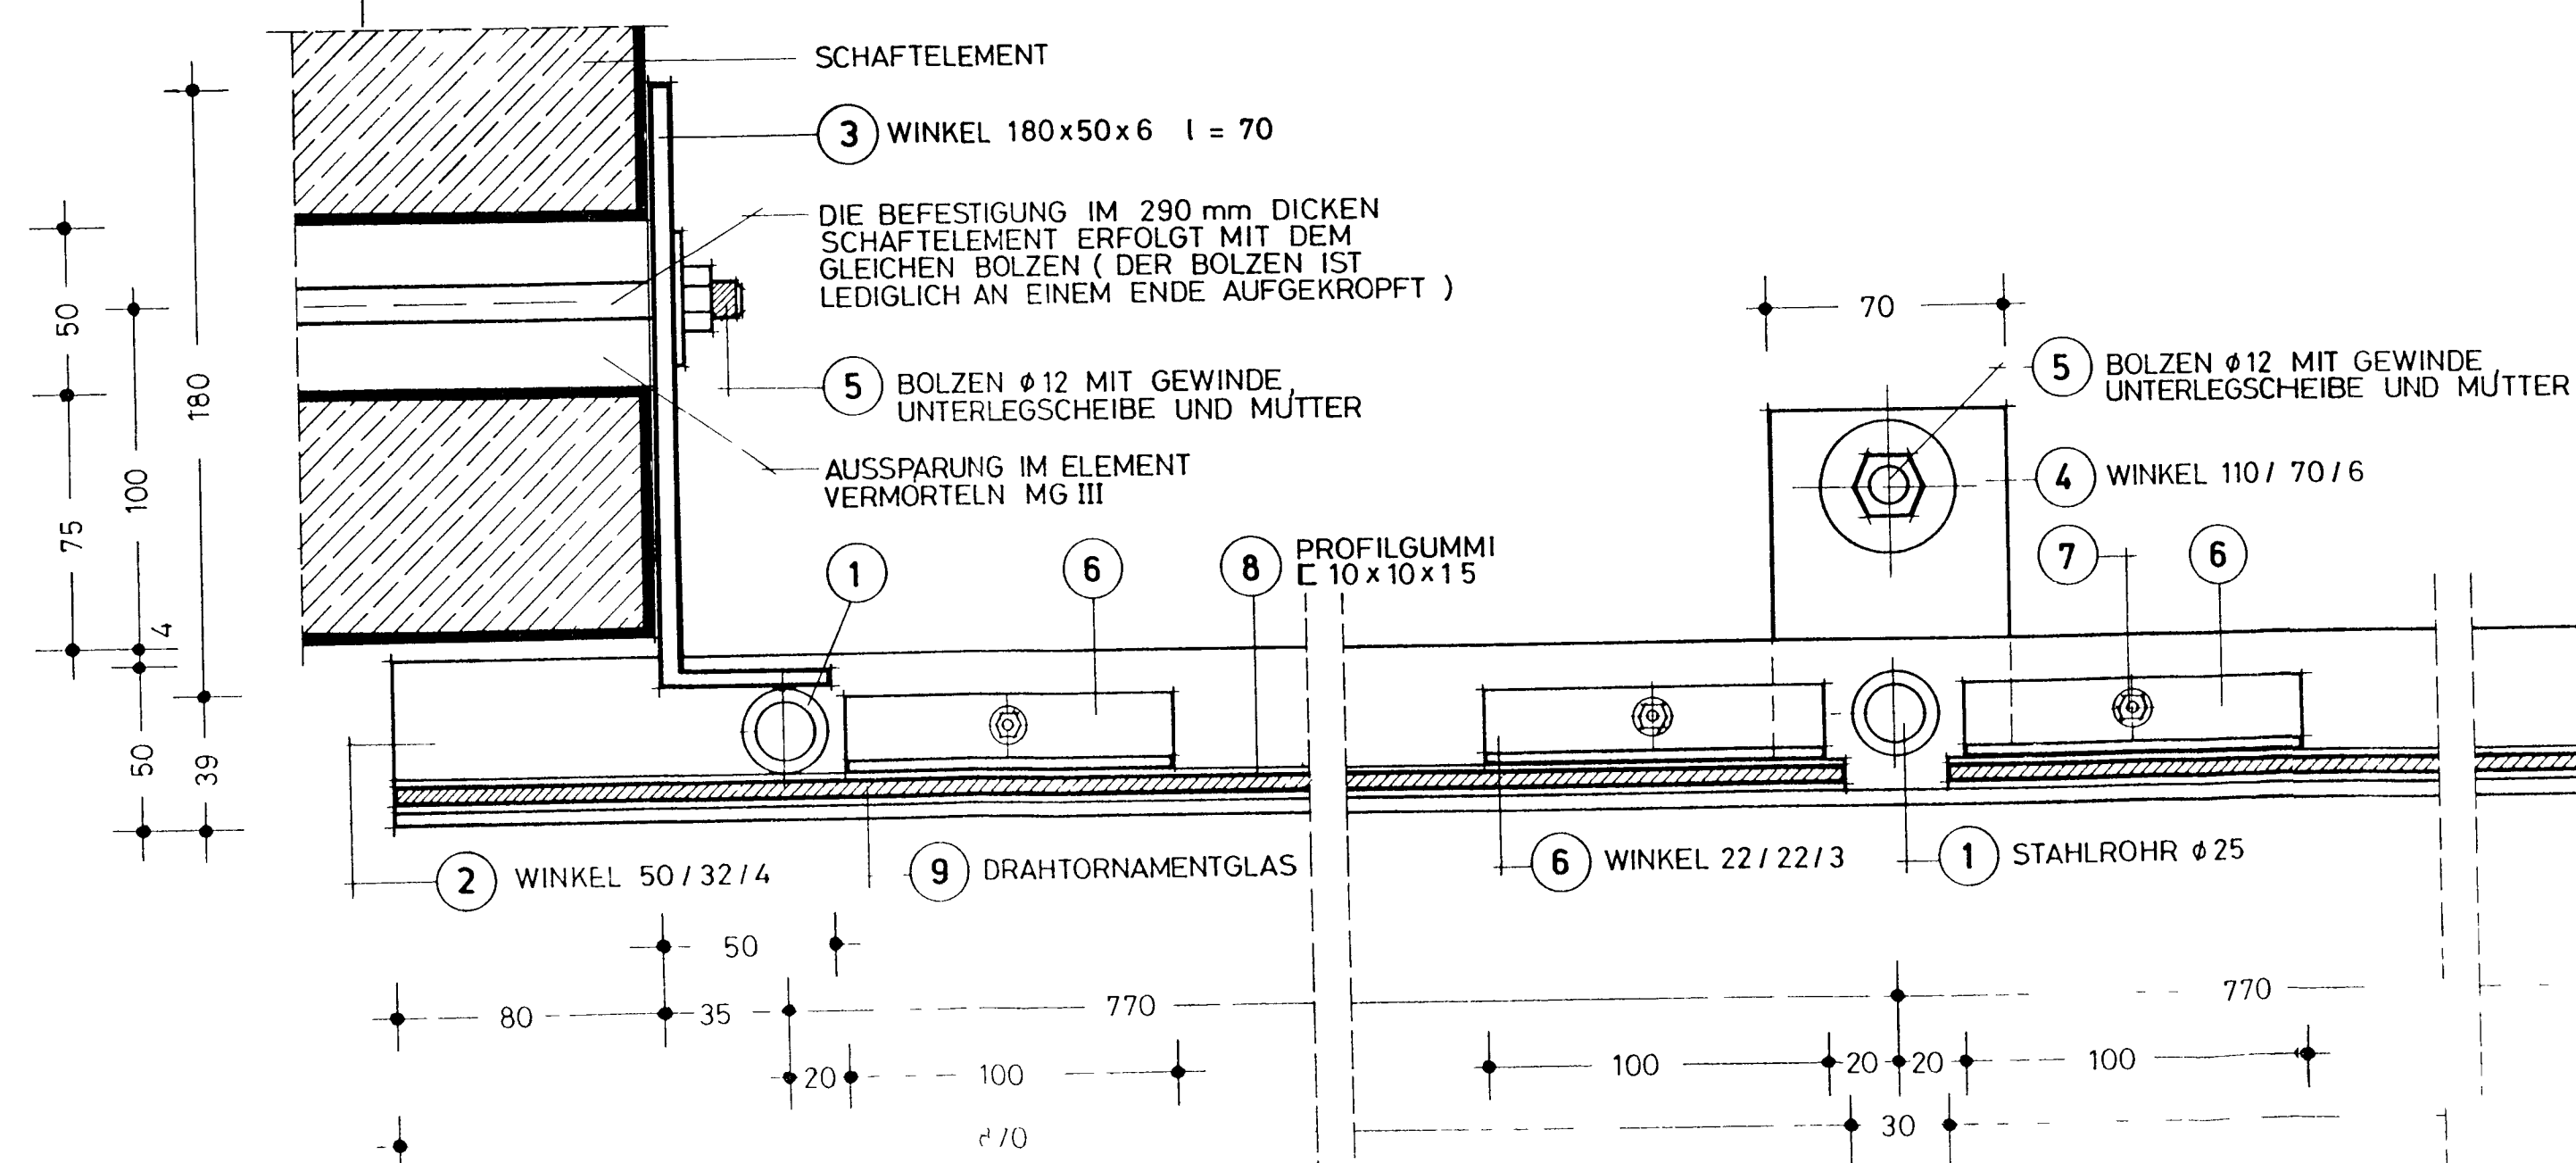

SCHNITT - DETAIL M 1 2

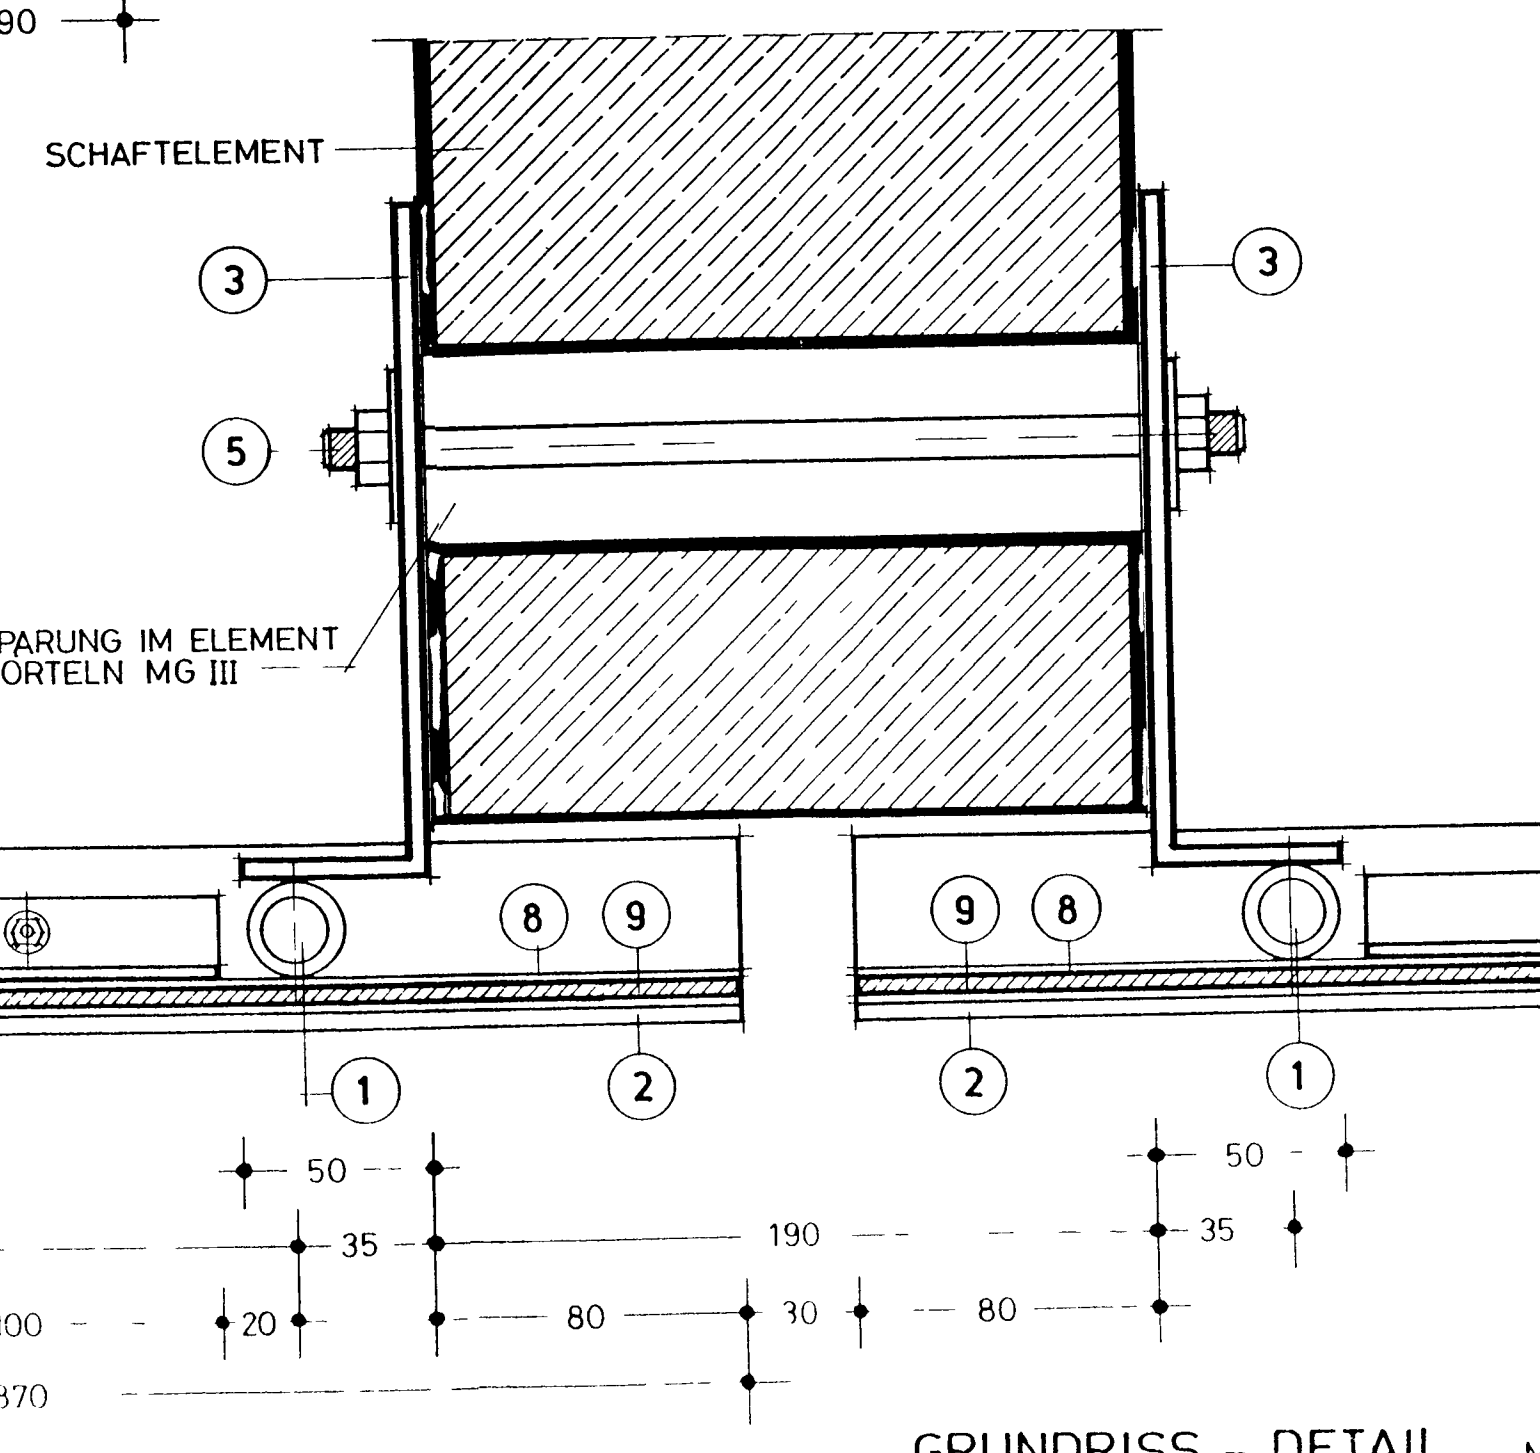

GRUNDRISS - DETAIL M 1 2

| STUCKLISTE FÜR EINE LOGGIENUNTERKONSTRUKT |                                                       |            |       |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|
| POS                                       | BEZEICHNUNG                                           | LÄNGE (mm) | STÜCK | GEWICHT (kg) |
| 1                                         | STAHLROHR $\phi$ 25 mm, MIT 2,5 mm WANDDICKE TGL 9012 | 1040       | 5     | 6 88         |
| 2                                         | UNGLEICHSCHENKLIGER WINKEL STAHL 50/32/4 TGL 9554     | 3570       | 3     | 26 67        |
| 3                                         | WINKELSTAHL 180/50/6                                  | 70         | 4     | 3 04         |
| 4                                         | WINKELSTAHL 110/70/6                                  | 70         | 3     | 1 75         |
| 5                                         | BOLZEN $\phi$ 12 MIT GEWINDE UNTERLEGSCHIBE + MUTTER  | 240        | 5     |              |
| STUCKLISTE FÜR EINE LOGGIENVERKLEIDUNG    |                                                       |            |       |              |
| 6                                         | WINKELSTAHL 22/22/3                                   | 100        | 16    | 1 57         |
| 7                                         | SCHRAUBEN M 3/2                                       | 20         | 32    | ~1 00        |
| 8                                         | PROFILGUMMI C 10/10/1,5                               | 870        | 8     |              |
| 9                                         | DRAHTORNAMENTGLAS GELB                                | 735/870/7  | 3     | 1 92         |
| 10                                        | DRAHTGLAS WEISS                                       | 735/870/7  | 1     | 0 64         |

ALLE STAHLTEILE SIND VOR DEM EINBAU GEGEN KORROSION NACH TGL 18 718, 18 730 UND 18 738 ZU SCHÜTZEN

BEDARF AN LOGGIENBRUSTUNGEN  
PRO BETTENHAUS = 100 STÜCK

VERKURZTE LOGGIENBRUSTUNG 5 STÜCK

| VEB PROJEKTIERUNG UND TECHNOLOGIE               |               |               |            | STRUKTUREINHEIT | KATALOG       |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---------------|
| BETRIEB DES VEB WOHNUNGSBAUKOMBINAT HALLE       |               |               |            | ORG FORM        | KATALOG/UNTER |
| FEIERABENDHEIM/ PFLEGESTATION BETTENHAUS 176 PL |               |               |            | MASSSTAB: 1/10  | LAGE          |
| LUGER/EL/TH/NS                                  |               |               |            | RV FORM         | CLAND         |
|                                                 |               |               |            | DATUM 7/11/80   | ERS BL NR     |
|                                                 |               |               |            | 22 422          | BLATT NR      |
| CHEFINGENIEUR                                   | BRIGADELEITER | GRUPPENLEITER | BEARBEITER | Q. KONTROLLE    |               |



# SNITT A-A M 15

LOGGIADCKENELEMENT

SPREIZDUBEL 8 x 10 x 50  
SENKHOLZSCHRAUBE 8 x 90 VERZINKT

DICHTUNGSANSTRICH

ANSCHLAGELEISTE 46/46  
STIRNSEITE SCHRAG AN-  
SCHNEIDEN UND MIT  
PLASTOSIT ABDICHTEN

ALU-KAPPELEISTE IN DEN  
FENSTERRAHMEN EINDICHTEN

MIT PLASTOSIT ODER THIOPLAST  
AUSPRESSEN

KUNSTSTEINSOHLBANK MIT  
WASSERNASE IN MG II  
NACH DETAIL BL NR 22 447

ZWISCHENACHSE 15 u 16  
BRÜSTUNGMAUERWERK  
IN MG II, HLZ MAUERN  
240mm DICK

IM MAUERWERK  
SPERRUNG NACH  
TGL 10689

SOCKELPUTZ ALS  
SPERRPUTZ  
MIN 300mm

## GRUNDRISS M 15

BRÜSTUNGSELEMENT

IM TROCKENRAUM UND WASCHRAUM  
ANORDNUNG VON EINFACHFENSTERN  
MIT EINBAU EINES FENSTERLÜFTERS

FENSTERREIHUNG NACH ANGEBOTSKATALOG

STOPFDICHTUNG MINERALWOLLE

THERMOFENSTER  
1200mm BREIT

THERMOFENSTER  
900mm BREIT

STOPFDICHTUNG  
THERMOFENSTER  
1200mm BREIT

SCHAFTELEMENT

SENKHOLZSCHRAUBE  
5 x 60

46x46

ANSCHLAGELEISTE 46 x 46,  
STIRNSEITE SCHRAG AN-  
SCHNEIDEN UND VOR DEM  
EINBAU MIT PLASTOSIT EIN-  
STREICHEN UND ABDICHTEN

AUSPRESSEN MIT PLASTOSIT  
ODER THIOPLAST

DICHTUNGSANSTRICH

SENKHOLZSCHRAUBE 8x90  
VERZINKT MIT SPREIZ-  
DUBEL 8 x 10 x 50

46x46

## DETAIL FENSTEREINBAU

PLASTOSIT ODER  
THIOPLAST

SPREIZDUBEL  
6x8x40


HALTEWINKEL

STOPFDICHTUNG

FUSSBODENAUFBAU IN DEN  
EINZELNEN RÄUMEN  
SIEHE BESCHREIBUNG

ALLE STAHLTEILE SIND KORROSIONSGE-  
SCHÜTZT EINZUBAUEN


## ÜBERSICHT DER FENSTERBEFESTIGUNGSSTELLEN

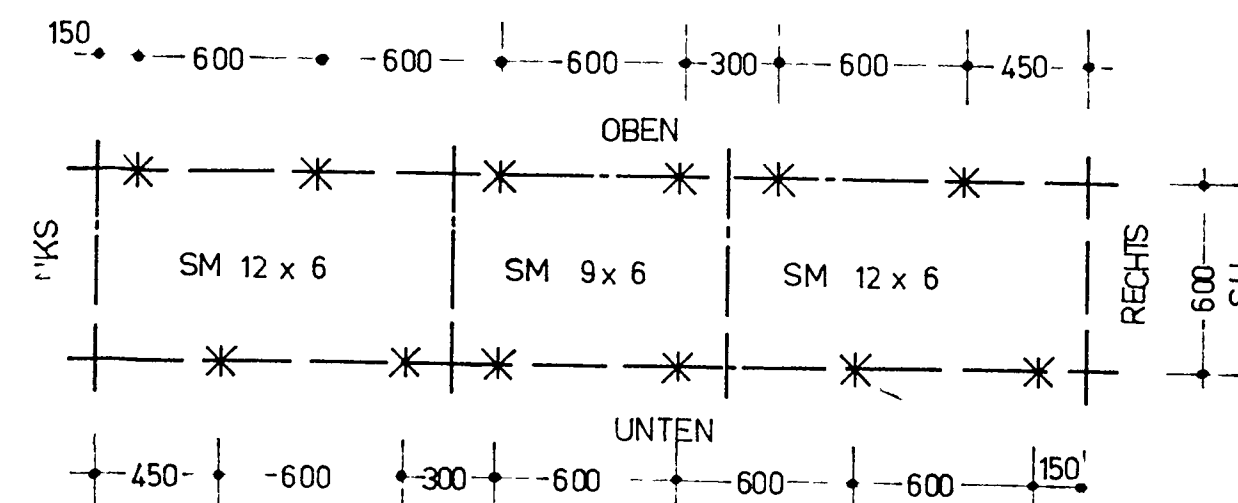

BEI DER FESTLEGUNG DER FENSTERBEFESTIGUNGSABSTÄNDE  
SIND DIE SYSTEMMASSE ZUGRUNDE GELEGT  
NACH TGL 22883

BEFESTIGUNG DER FENSTER OBEN UND SEITLICH AN DER  
ANSCHLAGELEISTE MITTELS SENKHOLZSCHRAUBEN 5x60  
ABSTÄNDE DER BEFESTIGUNGSPUNKTE SIEHE ÜBERSICHTS-  
SKIZZE  
UNTERE BEFESTIGUNG NACH KATALOG H 7415 PEF  
MIT HALTEWINKEL, SPREIZDUBEL 6x8x40 IN DER  
SOHLBANK UND HALBRUNDSCHRAUBE 6x60 TGL 0-96  
MIT UNTERLEGSCHEIBE

## ÜBERSICHT ÜBER LAGE DER BEFESTIGUNGSPUNKTE

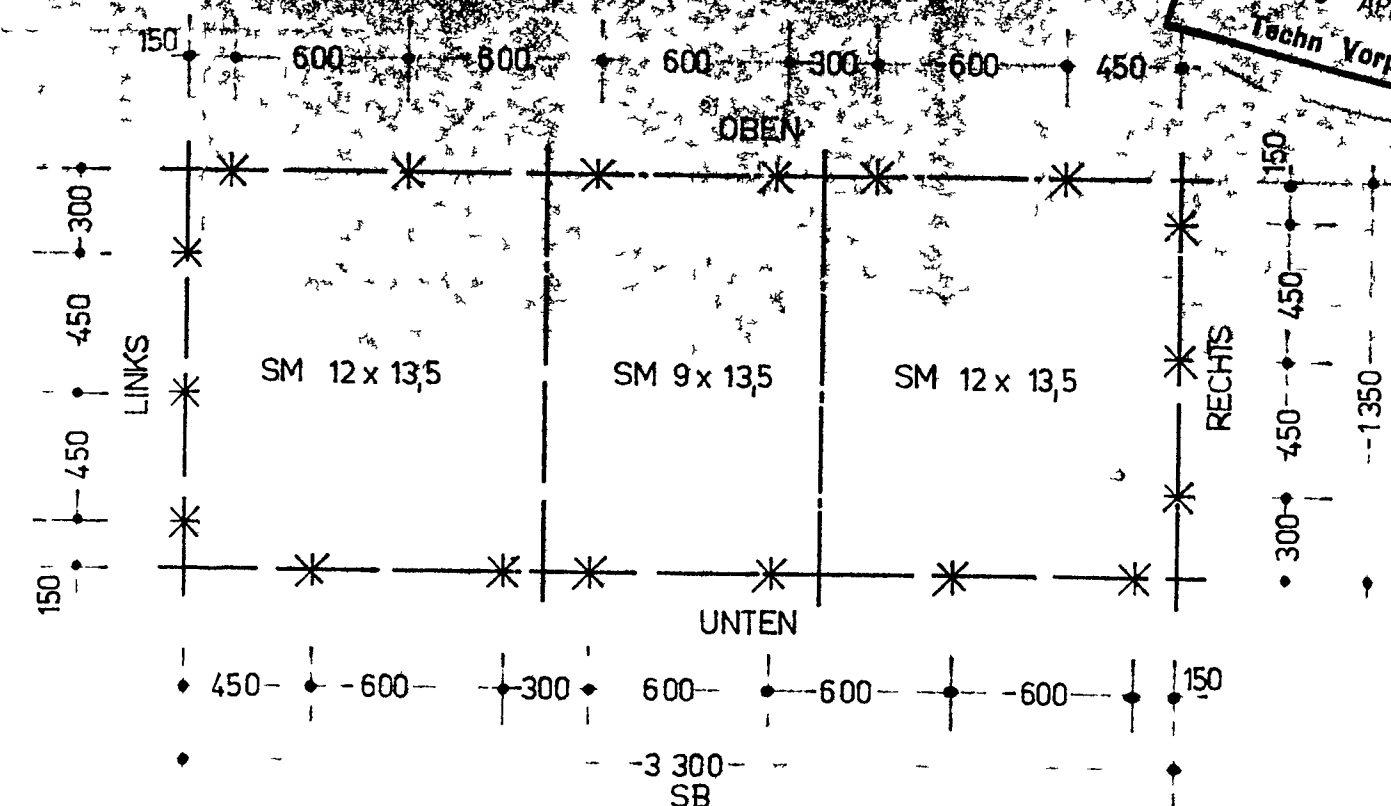


EINBAU DER HOLZFENSTER MIT ZWEI GLASEBENEN ALS THERMOSCHEIBE  
NACH KATALOG H 7415 PEF  
FENSTERANSCHLAG BILDET DER UMLAUFEHDE HOLZRAHMEN  
76x50 ANSCHRAUBT ABSTAND DER BEFESTIGUNGSPUNKTE 500mm  
LAGE DER SPREIZDUBEL IN DER SOHLBANK FÜR DIE UNTERE  
FENSTERBEFESTIGUNG NACH EINBAUVORSCHRIFT,  
SIEHE GESONDERTES DETAIL DER SOHLBANK


| VEB PROJEKTIERUNG UND TECHNOLOGIE         |               |               |            | STRUKTUREINHEIT | PROJEKTNR   |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------------|-------------|
| BETRIEB DES VEB WOHNUNGSBAUKOMBINAT HALLE |               |               |            | ORIG FORM       | 521-2205-07 |
| FEIERABENDHEIM PFLEGESTATION              |               |               |            | MASSTAB 1:25, 5 | PROJEKTTEIL |
| BETTENHAUS 176 PL                         |               |               |            | RV FORM         | GERND       |
| FENSTERBAND UNTERGESCHOSS                 |               |               |            | DATUM 14.11.80  | ERS BL NR   |
| CHEFINGENIEUR                             | BRIGADELEITER | GRUPPENLEITER | BEARBEITER | Q KONTROLLE     | 22.437      |
|                                           |               |               |            |                 | BLATT NR    |



LOGGIENENTWASSERUNG IM ERD UND  
NORMALGESCHOSS M15

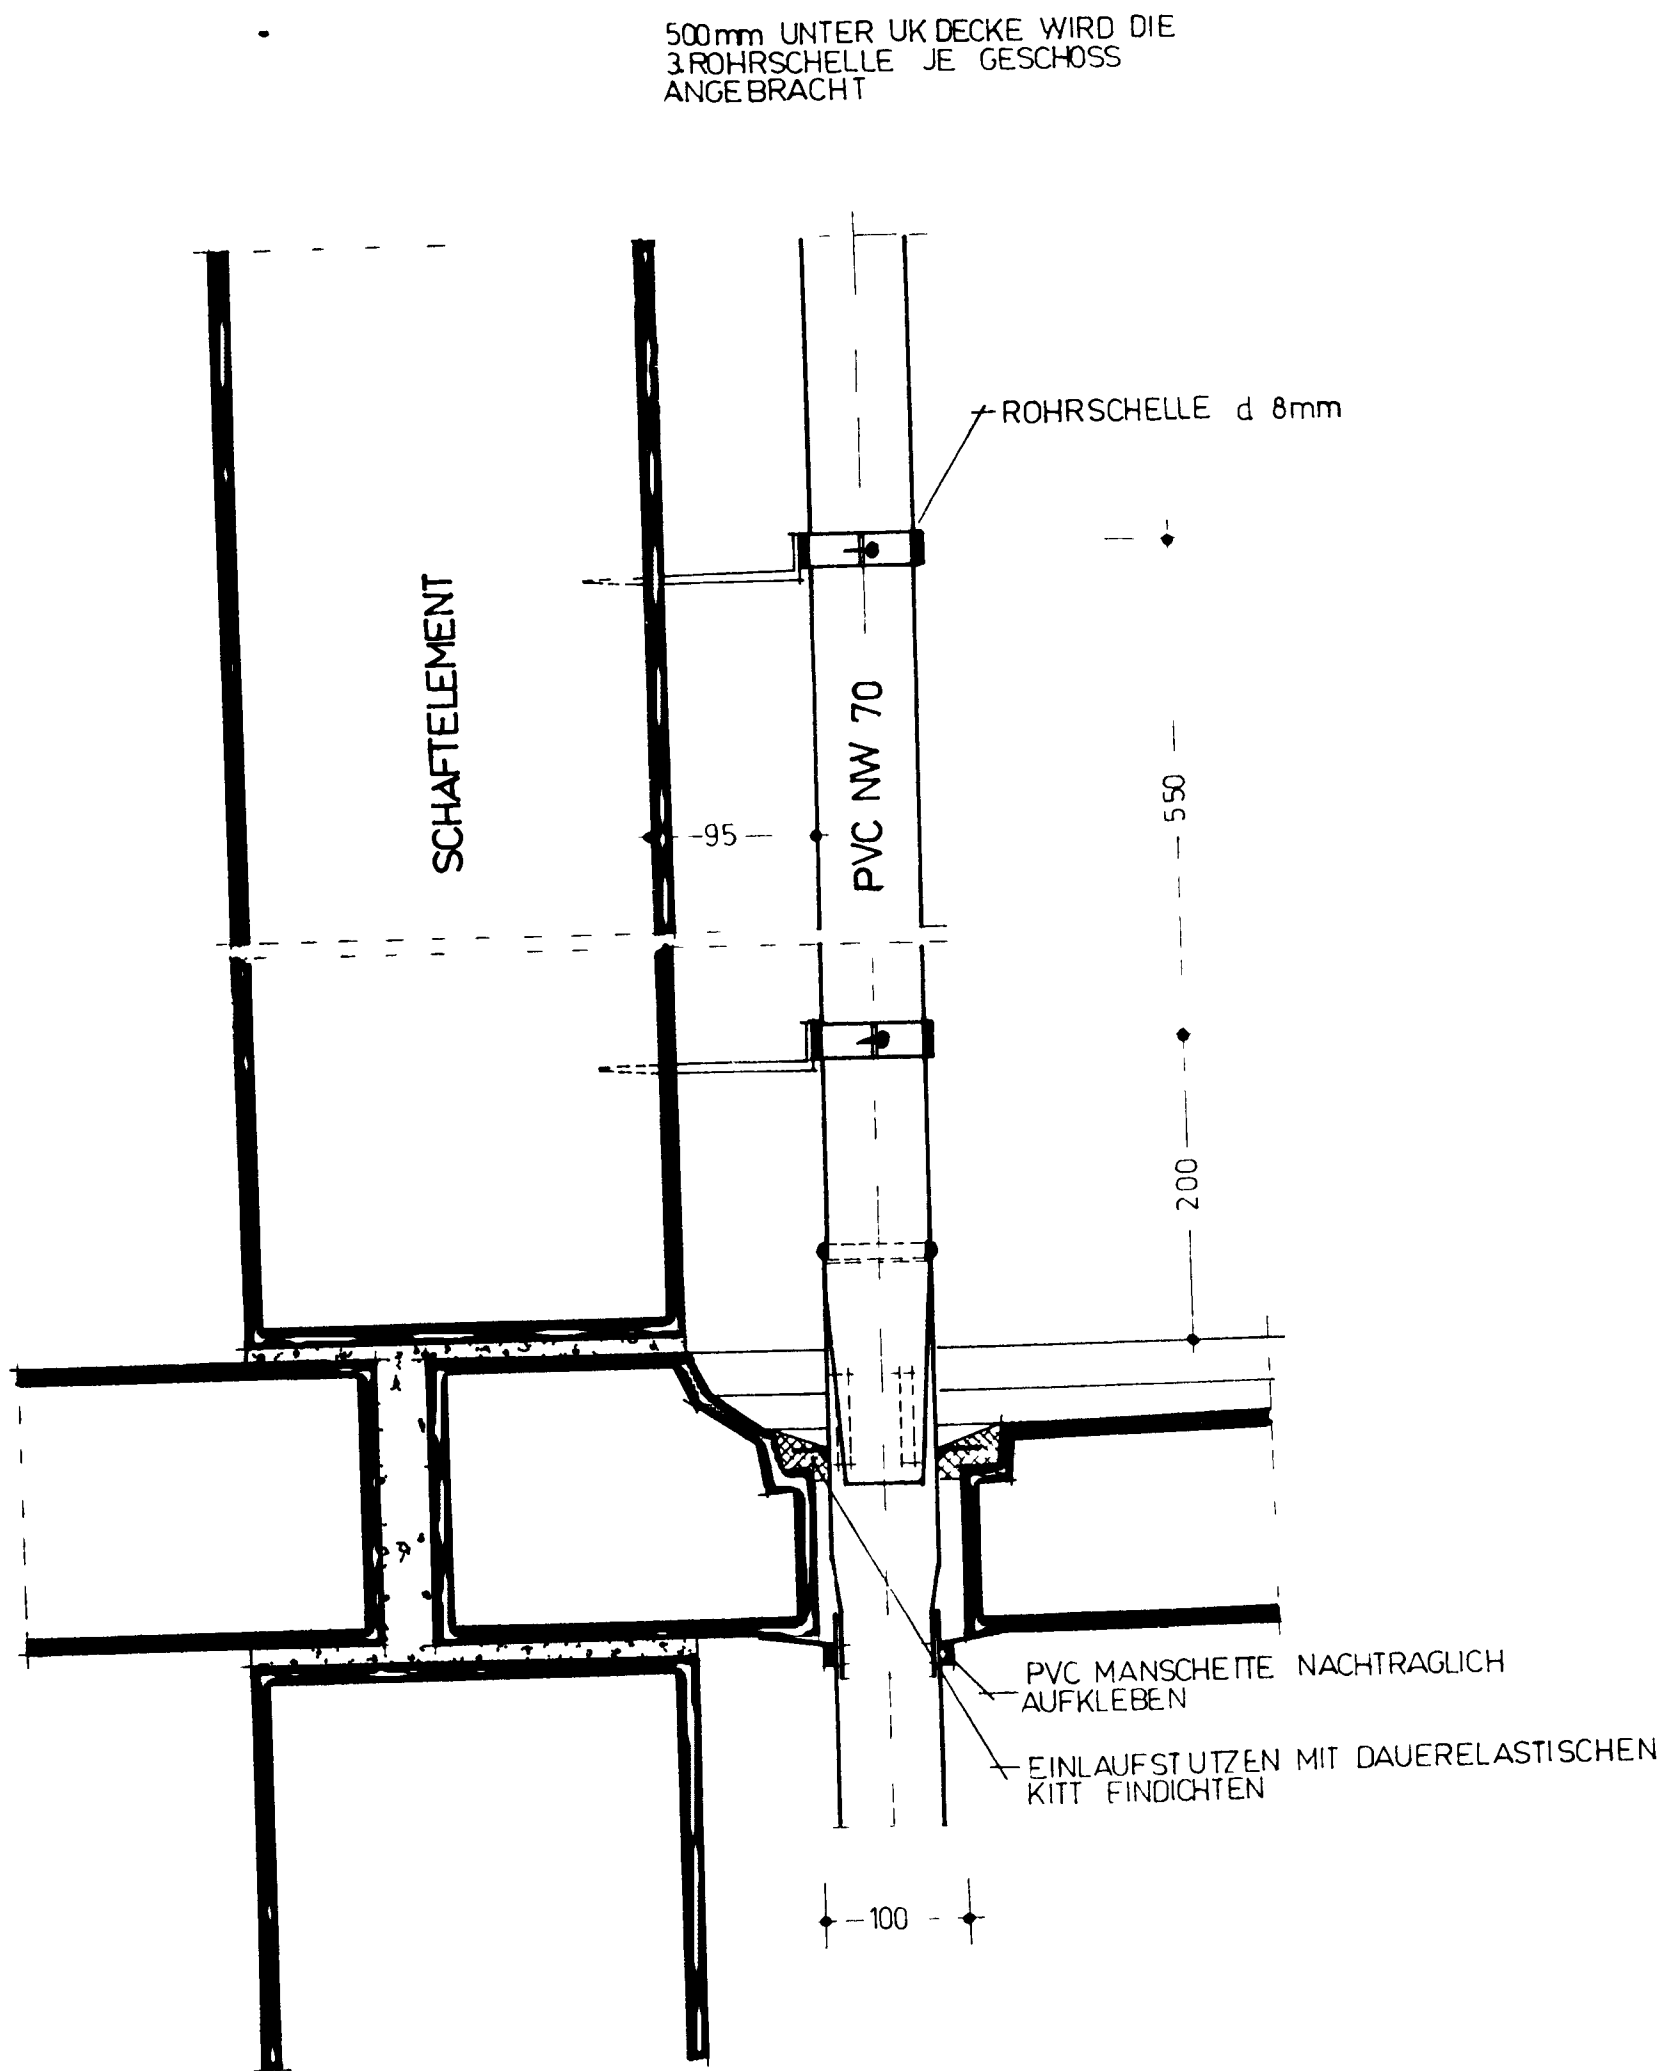


DETAIL  
EINLAUFDICHTUNG

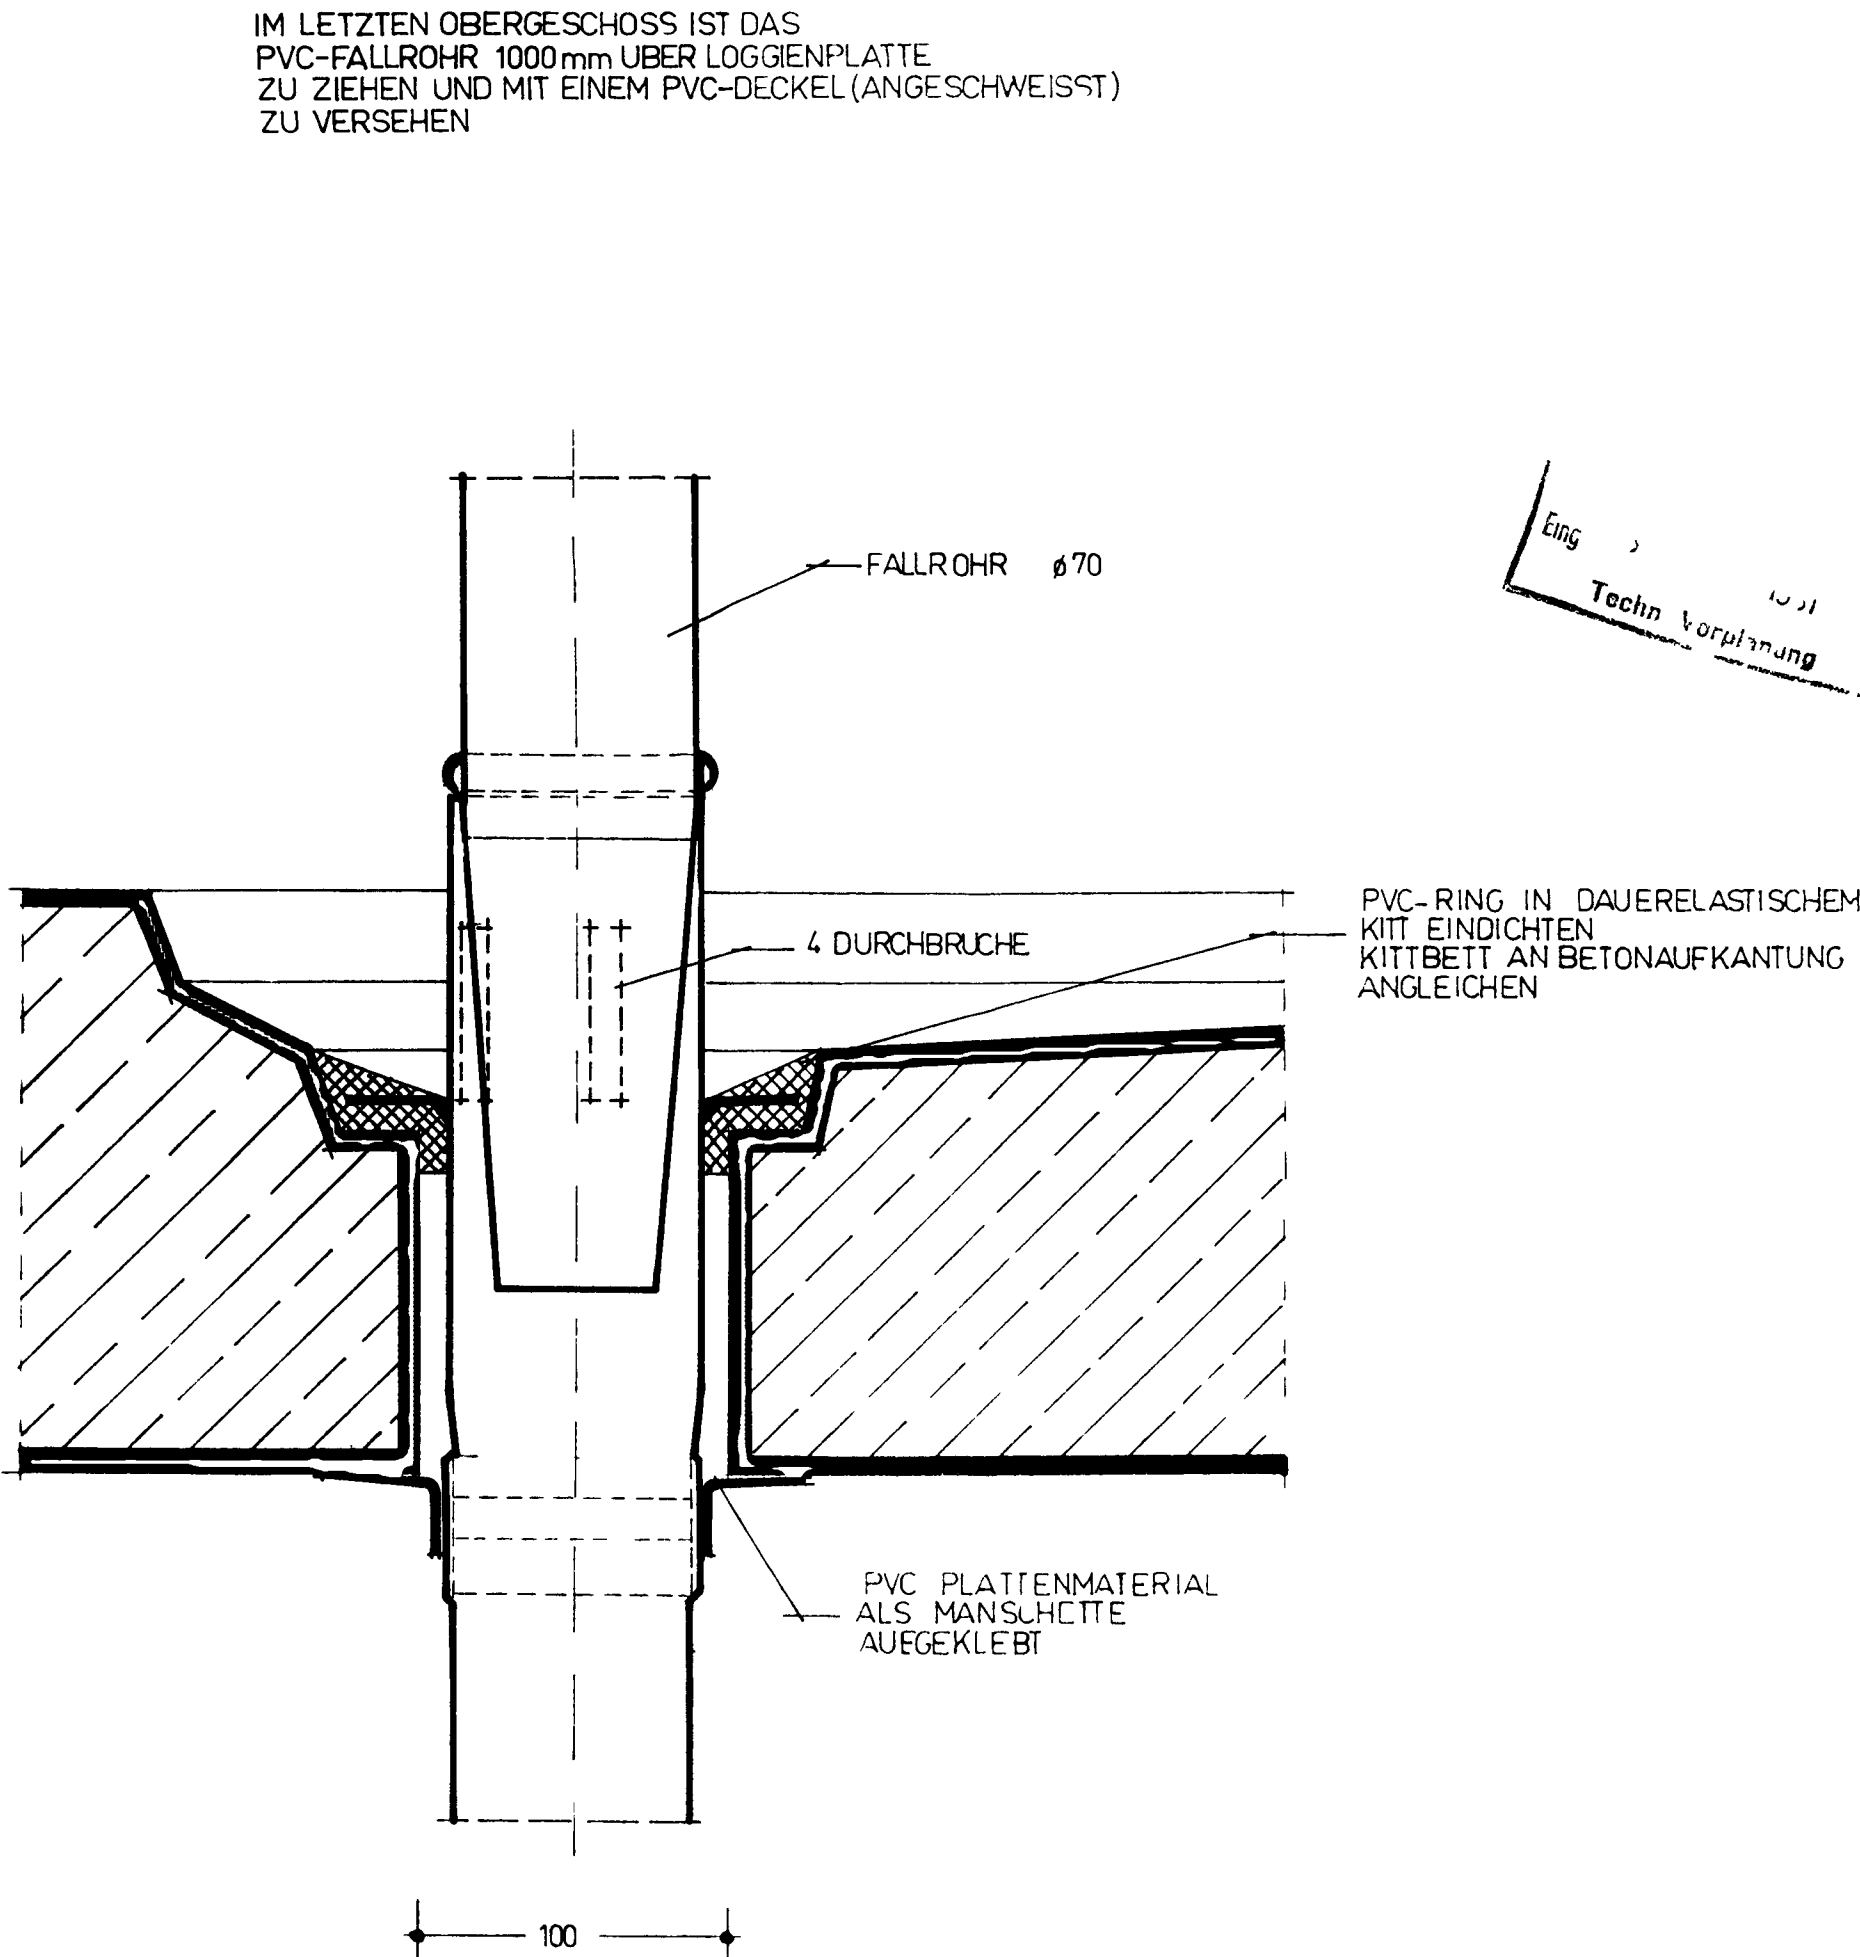

Eing  
Techn. Vorplanung

| VEB PROJEKTIERUNG UND TECHNOLOGIE                                          |              |               |            | STRUKTUREINHEIT | PROJEKTNR      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|----------------|
| BETRIEB DES VEB WOHNUNGSBAUKOMBINAT HALLE                                  |              |               |            | 75 - 32 31      | 521 - 2205 07  |
| FRIERABENDHEIM / PFLECESTATION<br>BLTTENHAUS 176 PL<br>LOGGIENENTWASSERUNG |              |               |            | ORIG FORM       | PROJEKTEIL     |
|                                                                            |              |               |            | MASSTAB 1:5,125 |                |
|                                                                            |              |               |            | RV FORM         | GEAND          |
|                                                                            |              |               |            | DATUM 17.10.80  | ERS BL NR      |
| CH. ENGENIER                                                               | BRICADLEITER | GRUPPENLEITER | BEARBEITER | Q KONTROLLE     | BLATT NR 22/51 |

22 45 2

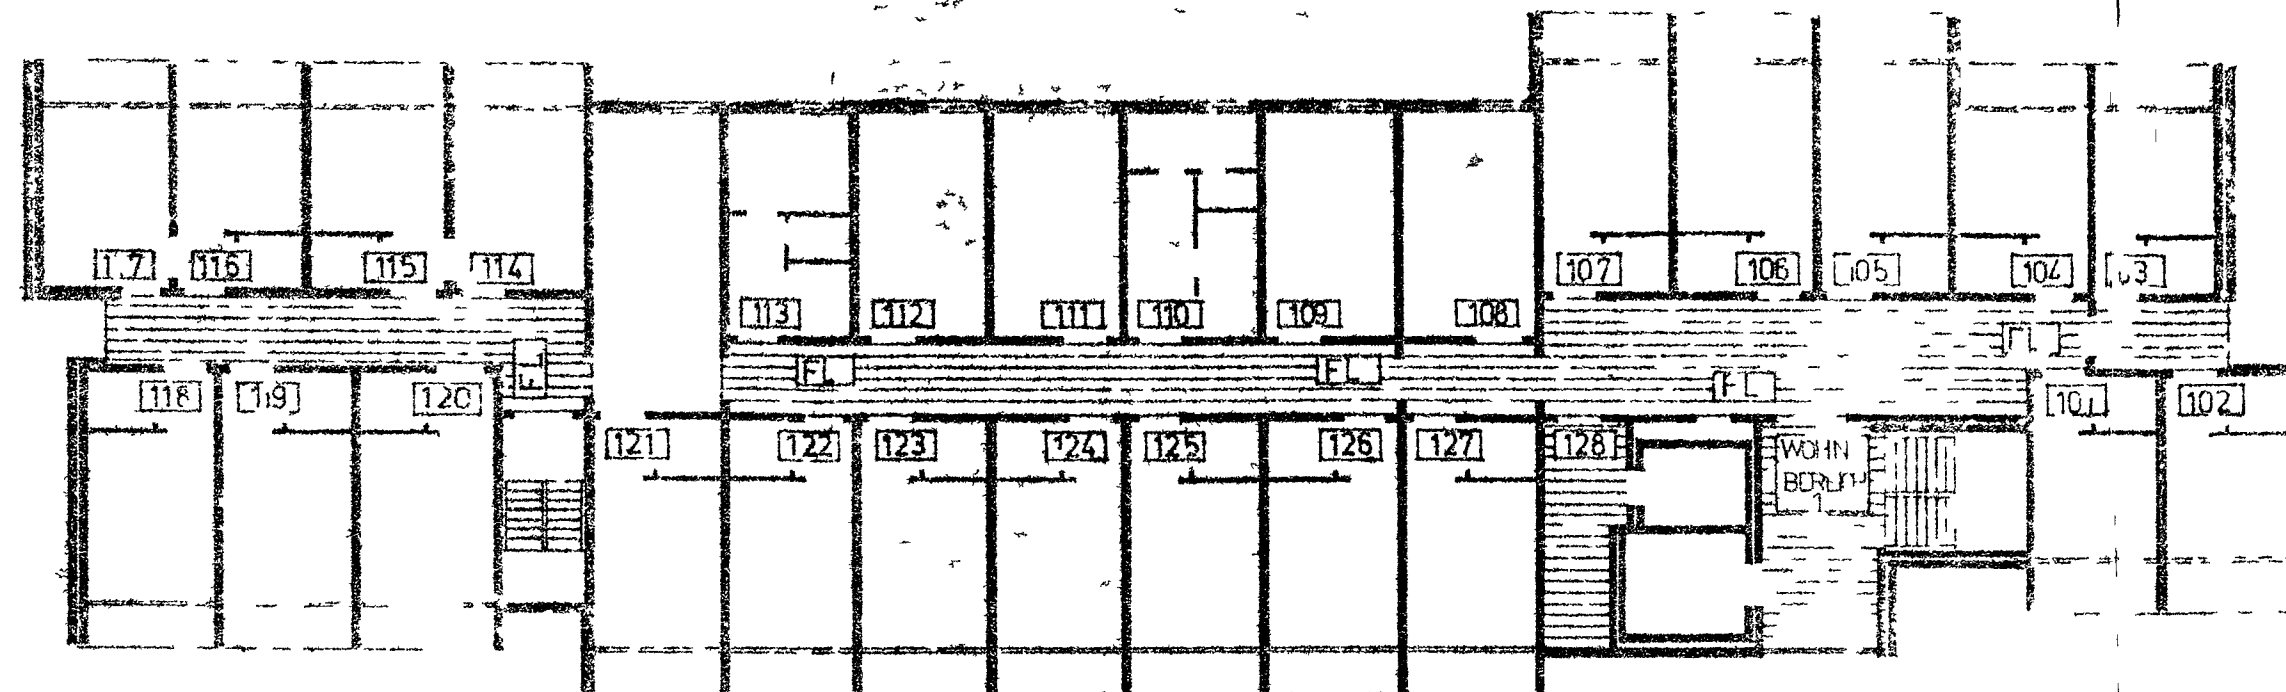


1. OBERGESCHOSS

LIEFERUNG UND MONTAGE  
DER SCHILDER

KNUT MÜLLER  
402 HALLE/S  
BERNBURGERSTP 30

SCHILDERAUFSCRIFTEN  
SIEHE TEXTTEIL  
SCHILDERPROJEKT

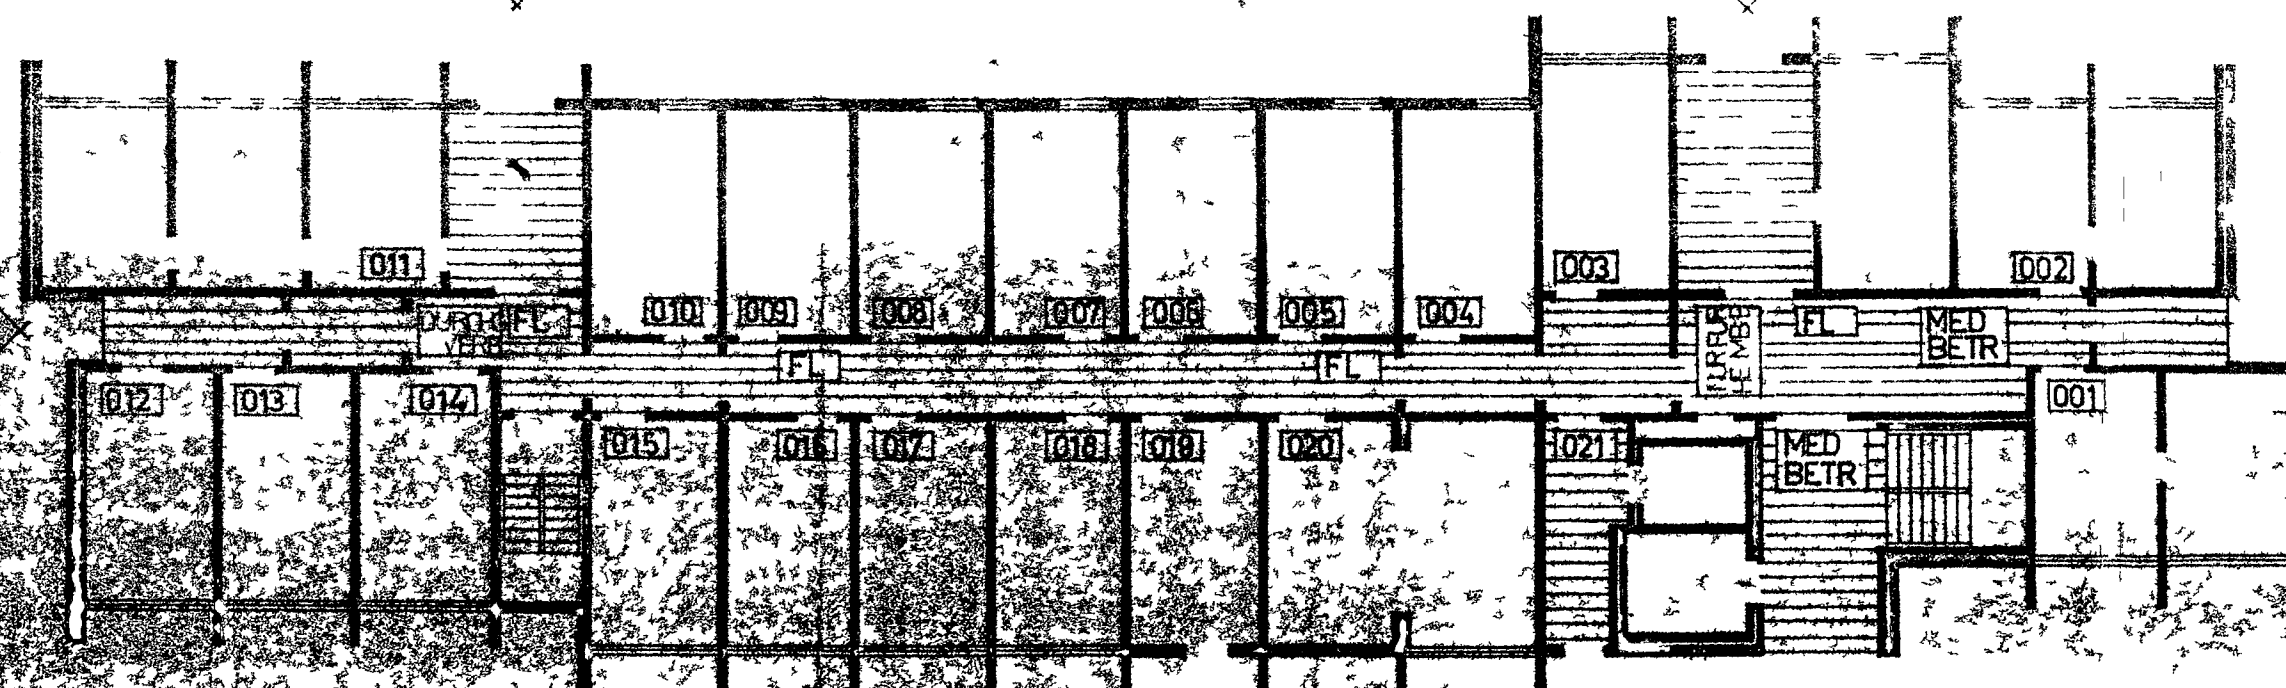

UNTERGESCHOSS

FEIERABENDHEIM MIT PFLEGESTATION  
BETTENHAUS 176 PL.  
SCHILDERPROJEKT  
1. OBERGESCHOSS + UNTERGESCHOSS


75-32-31

521-205-07


1:200

22.504

212.81

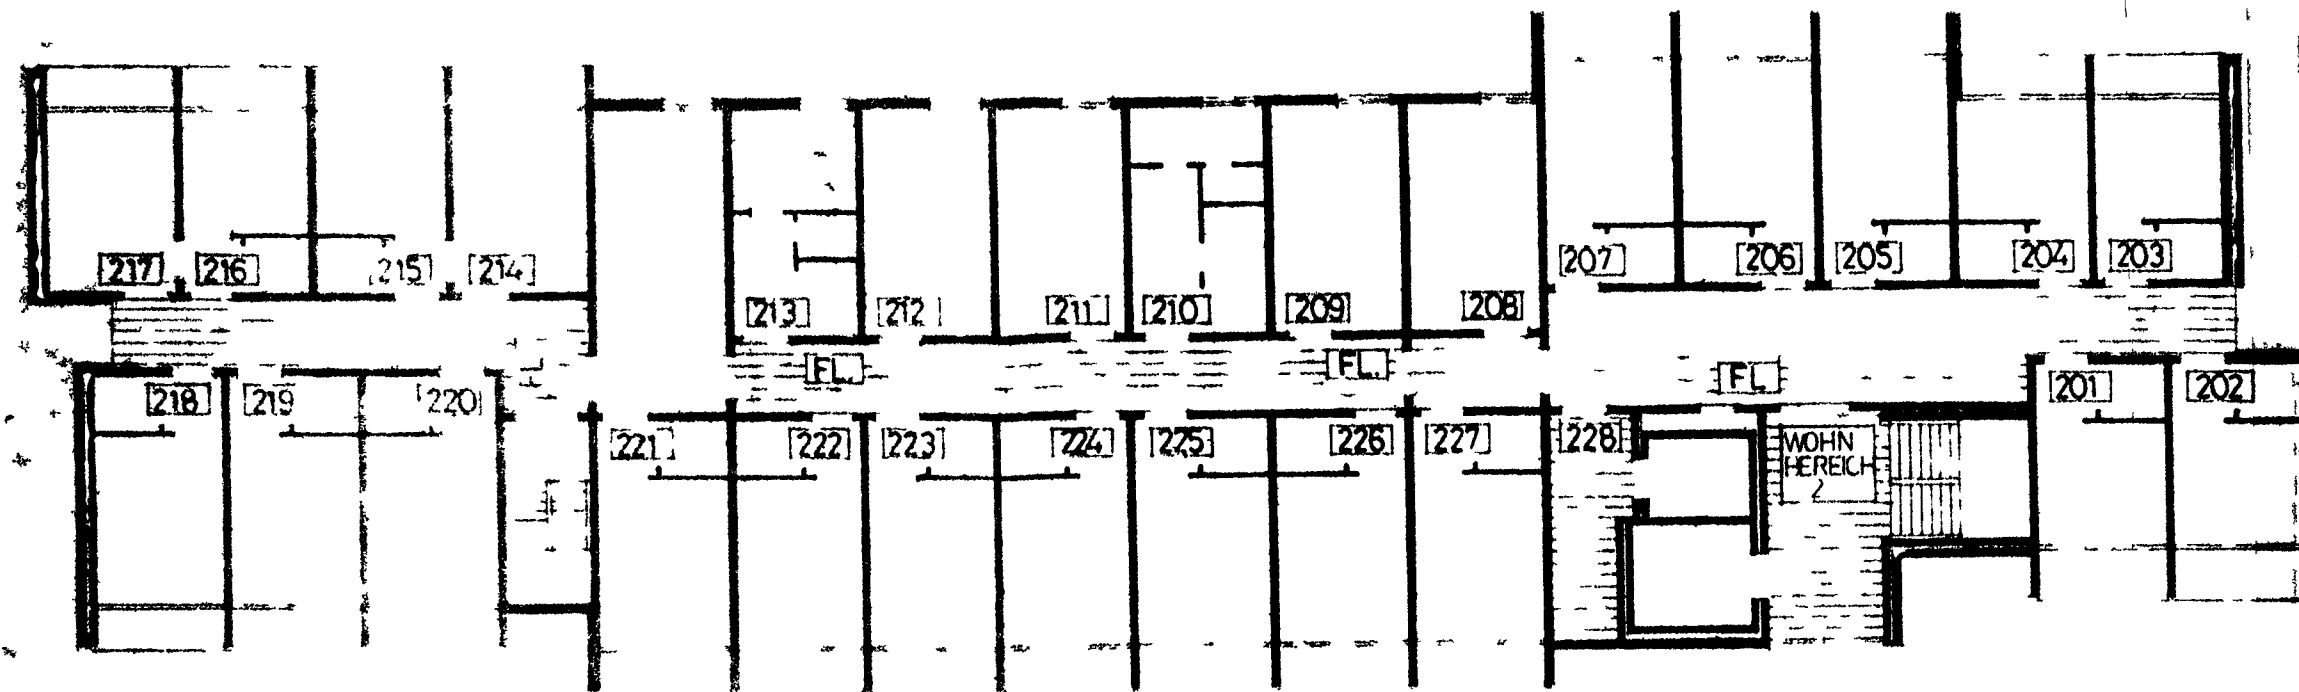

2 OBERGESCHOSS

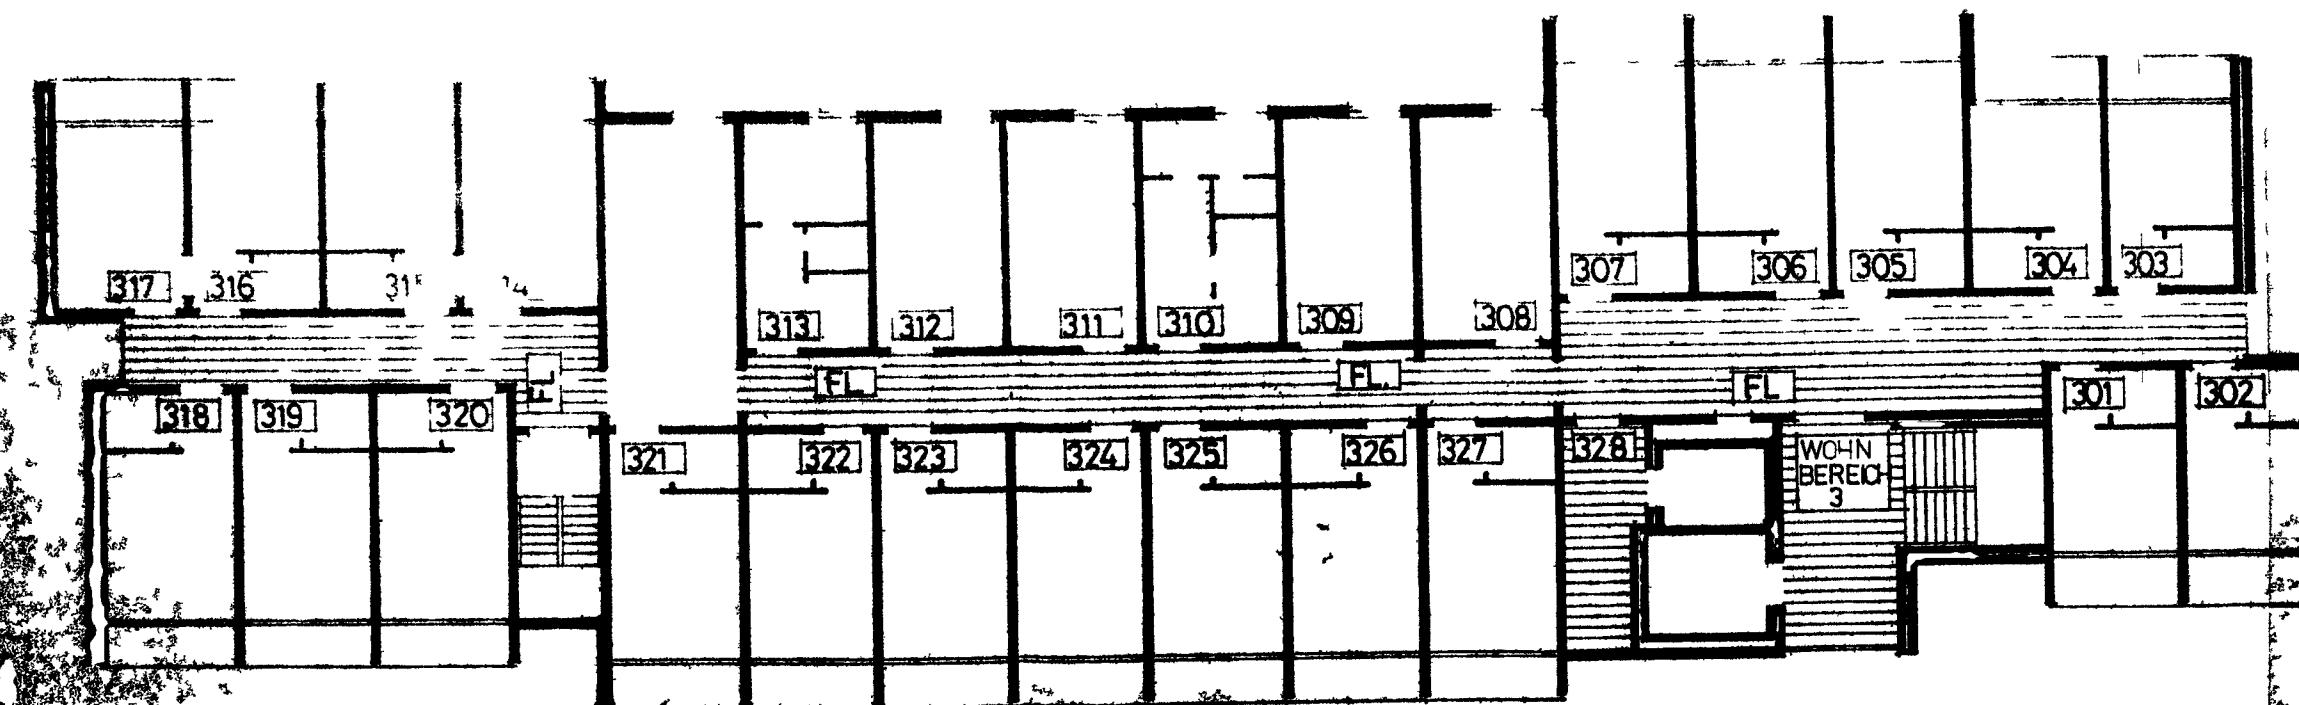

3 OBERGESCHOSS

2 NOV 1981  
 LIEFERUNG UND MONTAGE  
 DER SCHILDER  
 KNUT MÜLLER  
 402 HALLE / S  
 BERNBURGERSTR 30  
 SCHILDERAUFCHRIFTEN  
 SIEHE TEXTTEIL  
 SCHILDERPROJEKT

FEIERABENDHEIM MIT PFLEGESTATION  
 BETTENHAUS 176 PL  
 SCHILDERPROJEKT  
 2. u. 3. OBERGESCHOSS


75-32 31 521-2205-07

1 200

191 81

22.505



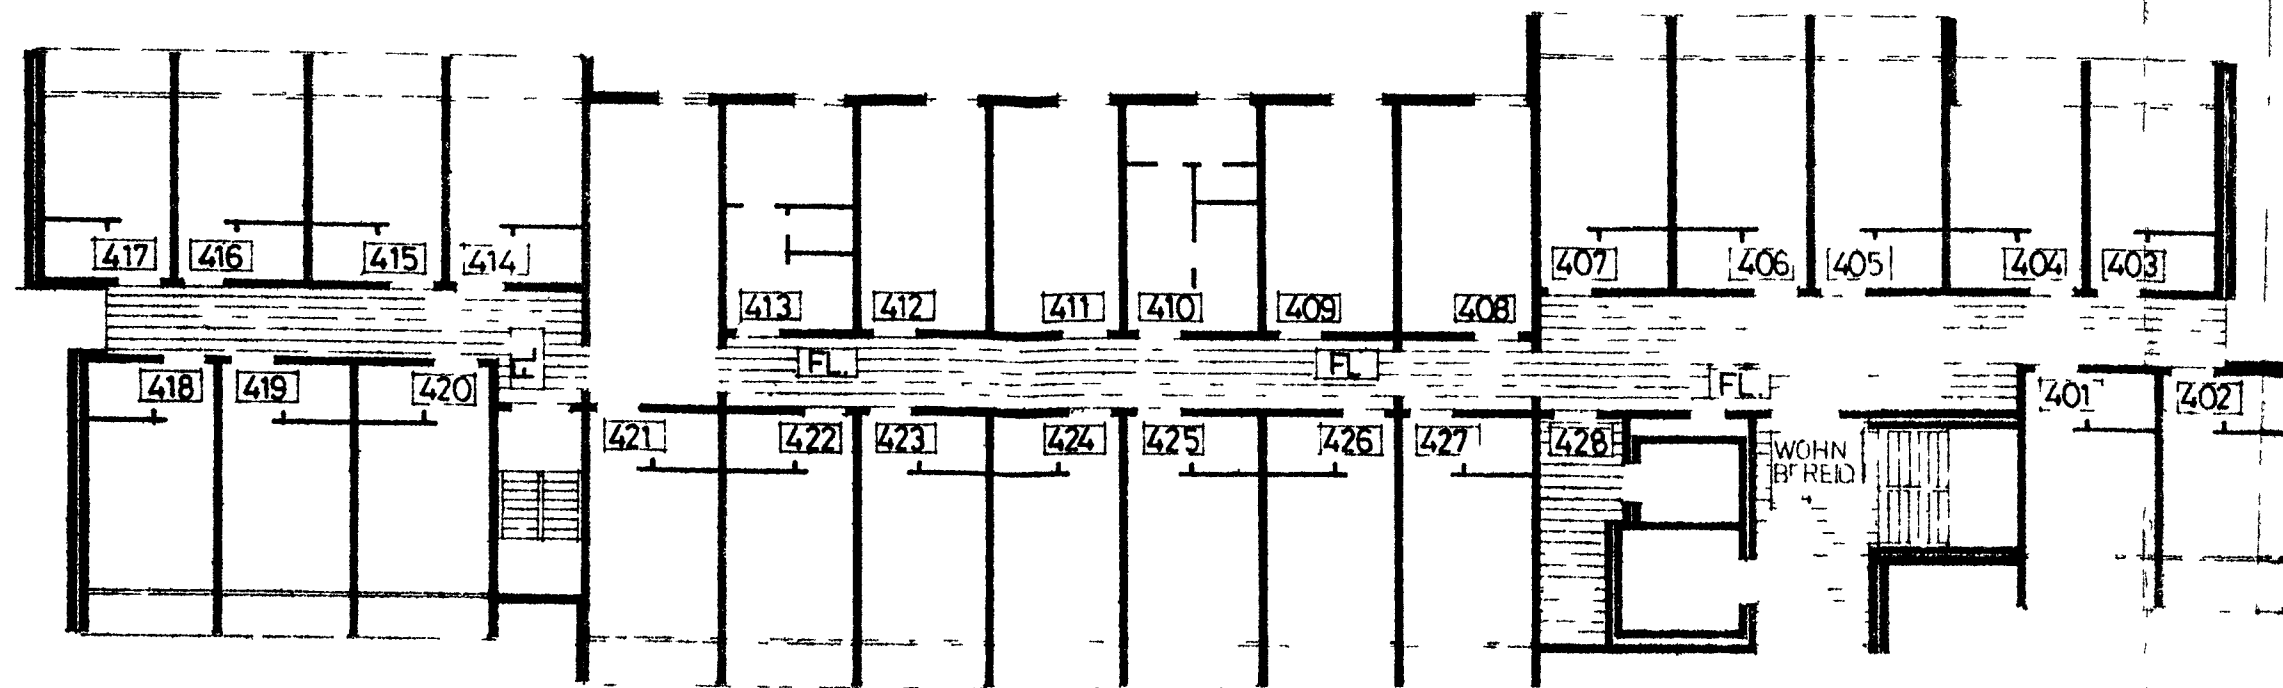


4. OBERGESCHOSS

VL.  
Eing. 2 NOV 1981  
Tsch. 1.10.1981

LIEFERUNG UND MONTAGE  
DER SCHILDER

KNUT MÜLLER  
402 HALLE/S  
BERNBURGERSTR 30

SCHILDERAUF SCHRIFTEN  
SIEHE TEXTTEIL  
SCHILDERPROJEKT

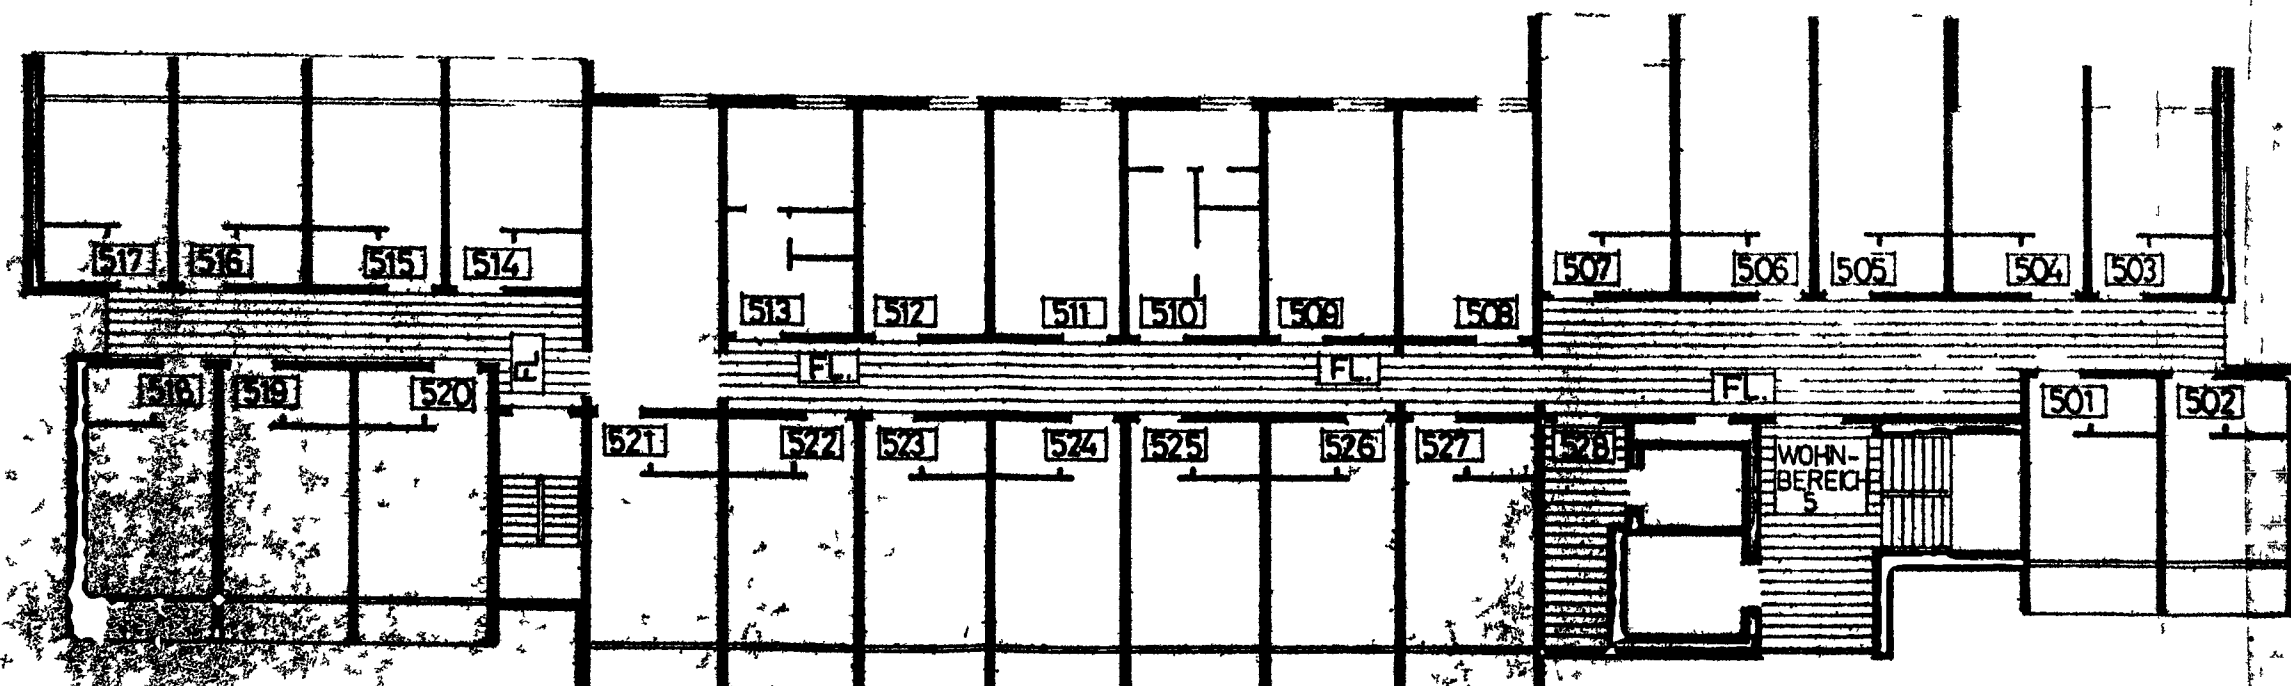

5. OBERGESCHOSS

FEIERABENDHEIM MIT PFLEGESTATION  
BETTENHAUS 176 PL.  
SCHILDERPROJEKT  
4+5 OBERGESCHOSS

75-32-31 521-2205-07  
1:200  
22.1.81
